



Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list č.		č.	
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY		ZL č.1B-78	
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum:	08. 05. 2014
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.59 - Dosazovací nádrže	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny:			
Popis změny:			
Jvedený změnový list řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.			
Součástí oznámení změny je:			
1) Rekapitulace kalkulace 2) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny – celková bilance 3) Zápis v deníku více / méně prací a stavebním deníku			
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – - Kanalizace a ČOV“ Datum: Pobřežní 667/78 08. 05. 2014 186 00 Praha 8		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí TEAQUA VZPROCON Dukelských hrdinů 12 170 00 Praha 7, ČR DIČ: CZ46954371 Datum: 08. 05. 2014	
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV Datum: 8.5.2014		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí TEPVOS TEPVOS, spol. s r.o. Třebovská 287 452 00 Ústí nad Orlicí Datum: 8.5.2014	

Rekapitulace

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.59 - Dosazovací nádrže	Celková bilance	-77 287,83 Kč	360 600,67 Kč	283 312,84 Kč
CELKEM		-77 287,83 Kč	360 600,67 Kč	283 312,84 Kč

Kód položky		Objekt	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
1.	2.	3.	5.	6.	11.	12.	13.
		SO 1.59	SO 1.59 DOSAZOVACÍ NÁDRŽE				6 218 121,51
		SO 1.59	Betonové konstrukce				4 712 252,63
1.59 - 35101		SO 1.59	Beton železový vodostavební C 30/37 XA2 XF3	m3	302,498	11 833,80	3 579 701,42
1.59 - 35101	vp	SO 1.59	Beton železový vodostavební C 30/37 XA2 XF3	m3	24,142	11 833,80	285 691,60
1.59 - 35107		SO 1.59	Zkouška vodotěsnosti nádrže	m3	4 932,249	86,20	425 159,84
1.59 - 35113		SO 1.59	Vodotěsná spára - stýk nový a stávající beton	m	170,720	676,70	115 526,22
1.59 - 35113	vp	SO 1.59	Vodotěsná spára - stýk nový a stávající beton	m	79,360	676,70	53 702,91
1.59 - 35118		SO 1.59	Úprava betonového povrchu-strojně gletovaný povrch	m2	1 003,407	185,80	186 432,95
1.59 - 35118	mp	SO 1.59	Úprava betonového povrchu-strojně gletovaný povrch	m2	-130,427	185,80	-24 233,34
1.59 - 35119		SO 1.59	Dílatace betonového dna od stěn-např. polystyrén	m	150,720	53,10	8 003,23
1.59 - 35120		SO 1.59	Smršťovací a dilatační spáry,včetně zapravení-dobetonávka dna	sada	1,000	44 583,80	44 583,80
1.59 - 35121		SO 1.59	Kotvení nerez odtok žlabu (pomocí chemických kotev)	kus	2,000	18 842,00	37 684,00
		SO 1.59	Sanace				805 054,10
1.59 - 36113		SO 1.59	Sanace pro SO 1.59	sada	1,000	805 054,10	805 054,10
		SO 1.59	Kompletní konstrukce				89 168,00
1.59 - 38103		SO 1.59	Úprava vztlakových ventilů,včetně odvedení podzemní vody do středu nádrže	kus	16,000	5 573,00	89 168,00
		SO 1.59	Potrubí				150 470,40
1.59 - 81127		SO 1.59	Prostupy a otvory pro SO 1.59	sada	1,000	135 609,20	135 609,20
1.59 - 81128		SO 1.59	Opískovaná spojka DN 500	kus	2,000	7 430,60	14 861,20
		SO 1.59	Bourání a demolice konstrukcí				240 422,73
1.59 - 96101		SO 1.59	Vybourání železobetonových konstrukcí	m3	0,504	4 410,60	2 222,94
1.59 - 96101	vp	SO 1.59	Vybourání železobetonových konstrukcí	m3	0,156	4 410,60	688,05
1.59 - 96102		SO 1.59	Řezání železobetonu,včetně úpravy otvoru	m2	3,560	1 353,40	4 818,10
1.59 - 96102	mp	SO 1.59	Řezání železobetonu,včetně úpravy otvoru	m2	-0,620	1 353,40	-839,11
1.59 - 96103		SO 1.59	Bourání železobetonových konstrukcí bez poškození výztuže	m3	43,588	4 410,60	192 249,05
1.59 - 96103	vp	SO 1.59	Bourání železobetonových konstrukcí bez poškození výztuže	m3	4,652	4 410,60	20 518,11
1.59 - 96104		SO 1.59	Bourání betonových konstrukcí	m3	0,198	3 863,90	765,05
1.59 - 96121		SO 1.59	Vybourání ocel.ploen ze stěn-komplet	kus	96,000	491,00	47 136,00
1.59 - 96121	mp	SO 1.59	Vybourání ocel.ploen ze stěn-komplet	kus	-96,000	491,00	-47 136,00
1.59 - 96122		SO 1.59	Odstranění asfalt.nátěru stěn u dna nádrže	m2	75,360	265,40	20 000,54
		SO 1.59	Kovové stavební konstrukce				220 753,65
1.59 - 76706		SO 1.59	Nerez poklop,včetně rámu	m2	5,440	17 515,10	95 282,14
1.59 - 76706	mp	SO 1.59	Nerez poklop,včetně rámu	m2	-0,290	17 515,10	-5 079,38
1.59 - 76716		SO 1.59	Nerez rošt,včetně rámu	m2	5,760	11 676,70	67 257,79
1.59 - 76748		SO 1.59	Demontáž ocelových prvků pro SO 1.59	sada	1,000	63 293,10	63 293,10

Objekt	1.59 DOSAŽOVACÍ NÁDEŽE
Položka č.	35101
DN1 - STĚNA $\pi(12,3^2 - 12^2) \times 1,6 = 36,64 \text{ m}^3$	
DN1 - ZHROVÍ $\pi(12,55^2 - 12^2) \times 0,3 = 12,73 \text{ m}^3$	
NA BETONÁVKA SLOUPŮ DN1 + DN2	
$0,4 \times 0,4 \times (1,44 \times 0,37) \times 2 = 0,58 \times 2 = 1,16 \text{ m}^3$	
STŘEDNÍ KOLEC DN1 + DN2	
$\pi(1,4^2 - 1^2) \times 0,5 \times 2 = 3,02 \text{ m}^3$	
ODTOKOVÁ VÍTKA DN1 + DN2	
$2,2 \times 0,2 \times 0,4 + 1,2 \times 0,2 \times 0,4 \times 2 = 0,57 \times 2 = 0,74 \text{ m}^3$	
VÍTKA PROVOZICH A SO/SJOI DN1 + DN2	
$1,5 \times 0,2 \times 0,4 + 1,7 \times 0,1 \times 0,4 \times 2 = 0,59 \times 2 = 0,78 \text{ m}^3$	
DN2 DN1 + DN2	
$\pi(12^2 - 2,25^2) \times 0,12 \times 2 + 16,92 + 19,79 = 211,2 \text{ m}^3$	
CELKOVÉ PROVEDENÉ MNOŽSTVÍ ZA PO/BT <u>266,27 m³</u>	
 „ZSS“ / $\pi(12^2 - 2,25^2) \times 0,12 \times 2$ - více práce	
$\Sigma = 266,27 + 49,37 + 4,148 + 6,854 = 326,642 \text{ m}^3$	

Objekt	SO 159 DOKAZOVACÍ MĚŘENÍ
Položka č.	159 - 35 101
NA BETONÁŘSKÉ STĚNĚ $\pi (12,3^2 - 12^2) \times 1,6 = 36,64 \text{ m}^3$ NA BETONÁŘSKÉ ZHLAVĚ $\pi (12,55^2 - 12^2) \times 0,3 = 12,73 \text{ m}^3$ CELKOVÉ MNOŽSTVÍ PROVEDENÉ ZA 7/2012 <u>49,37 m³</u> 	

Objekt	30 159 DN2 + DN1
Položka č.	Příč 35101- Beton železobeton' C30/37
Příčky ke sloupům	
$323,40 - 321,59 = 1,81m$	
$1,81 \times 0,4 \times 0,25$	$\oplus = 0,18154 m^3$
$- \frac{1}{2} 0,37 \times 0,25 \times 0,4$	$E = 0,01875 m^3$
$- \frac{1}{2} 2 \cdot 0,2 \cdot 0,2 \cdot 0,25$	$E = 0,034 m^3$
	$0,5145 m^3$
	$\times 4 \text{ příčky}$
	$= 2,074 m^3$
	$\times 2 \text{ (2. úroveň)}$
	<u>$4,148 m^3$</u>

Objekt	SO 1.59
Položka č.	35101 Beton železob.
Pobehtování křídla do přírodního křídlového tvaru $2 \text{ křídla} \times \left[2 \times \frac{1}{2} \times 0,25 \times 0,7 \times 1,44 \right] = 6,254 \text{ m}^3$	

Objekt	1.59 DOSAŽOVACÍ NÁDRŽE
Položka č.	1.59 - 35 113

STĚNA DU 2

$$2\pi \times 12,15 = 76,34 \text{ m}^2$$

ZHLAVÍ DU 2


$$2\pi \times 12,15 = 76,34 \text{ m}^2$$

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ PROVEDENÉ ZA ROK 102,68 m²

CELKOVÉ NÁROKOVANÉ MNOŽSTVÍ UZMANÉ 76,34 m²

1 "ZSS" neodmáhá se
- více práce -

7/11/12

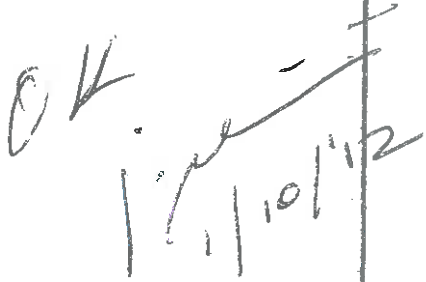Objekt	SO 159 DĚSABOLACI NAŘŘE
Položka č.	1 59 - 35 113
STĚNA DU1 $2\pi \times 12,15 = 76,34 \text{ m}$ ZHLAVÍ DU1 $2\pi \times 12,15 = 76,34 \text{ m}$ CELKOVĚ MNOŽSTVÍ PROVEDENE ZA 9/2012 <u>152,68 m</u>  11/10/12	

Objekt	30 159 DN1 + DN2
Položka č.	35 113 - VODOTĚSNÁ SPÁRA SÍTKOU, STĚNÍČI BETON
Jímka plochých věntolů - Nabetoná stěna	
$1,7 + 1,5 + 1,7 =$	
$= 4,9 \text{ m}$	
Odtočná jímka	
Nabetoná stěna	
$1,2 + 2,2 + 1,2 =$	
$= 4,6 \text{ m}$	
2x vnitřní sloup vícepráce	
$2 \times (0,4 + 0,4 + 0,4 + 0,4)$	
$= 3,2 \text{ m}$	
<u>12,7 m</u>	
$\times 2$ (2. výměř)	
<u>25,4 m</u>	

Objekt	SO 159 DN 2 + DN 1
Položka č.	35 113 - kádka na napájení sítě vody a stáje beton
Přičky kádka	
1 přička $2 \times (1,44 + 0,25 + 1,21 + 0,4)$	
= 9 m	
x 4 přičky	
36 m	
x 2 (2 kádře)	
72 m	

Objekt	1.59 DOKAZOVACÍ LADEŽE
Položka č.	1.59-96101

$(0,7 \times 0,7 \times 0,3 - 0,2^2 \pi \times 0,3) \times 3 = 0,33 \text{ m}^3$ DKL

CELKOVÉ POUVEDENÉ MNOŽSTVÍ ZA 10 POKR $0,33 \text{ m}^3$

j.p. 5/11/12
 ("88" woodsonblau, 4
 'viceprice')

Objekt	SO 159 DOSAZOVACÍ NADŘEŽE
Položka č.	159 - 96 101

VYBOURÁNÍ PROSTOROVÝCH OKEN D1

$$(0,7 \times 0,7 \times 0,3 + 0,2^2 \times \pi \times 0,3) \times 3 = 0,33 \text{ m}^3$$

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ PROVEDENÉ ZA 9/2012 0,33 m³

OK
1. 10. 12

Objekt	1.59 DOSAZOVACÍ NADEBE
Položka č.	1.59-96102
PROSTOROVÁ OKNA DUL	
$0,7^2 \times 3 = 1,47 \text{ m}^2$	
CELKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKCE ZA 10/2012 <u>1,47 m²</u>	
5711/12 ("888" nesouhlasím - v "příloze")	
$\Sigma = 1,47 + 1,47 = 2,94 \text{ m}^2$	

Objekt	SO 159 DOSAZOVACÍ KADAPZÉ
Položka č.	159 - 96 102

ŘEZÁNÍ PROSTUPOVÝCH OKEN DNÍ

$$0,47^2 \times 3 = 1,47 \text{ m}^2$$

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ PROVEDENÍ ZA 9/2012 1,47 m²

OK
1. 10/12

Objekt	SO 1.59 - DOSAŽOVACÍ NÁDRAŽÍ
Položka č.	80 1.59 - 76706 - VERET POKLOP...

$$1,56 \times 1,65 \times 2 = \underline{5,15 \text{ m}^2}$$

Objekt	SD 159 DOSAZOVACÍ KADĚŽE
Položka č.	159 - 96 103

BOURÁNÍ ZHLAVÍ KADĚŽE

$$\pi (12,45^2 - 11,85^2) \times 0,3 = 13,74 \text{ m}^3$$

BOURÁNÍ STĚN KADĚŽE

$$\pi (12,3^2 - 12^2) \times 0,3 = 6,87 \text{ m}^3$$

BOURÁNÍ STŘEDOVÝCH SLOUPŮ

$$0,4 \times 0,4 \times 3,7 \times 4 = 2,37 \text{ m}^3$$

$$0,65 \times 0,4 \times 0,25 \times 4 = 0,26 \text{ m}^3$$

$$\pi (1,4^2 - 1^2) \times 0,25 = 0,75 \text{ m}^3$$

$$\pi (0,35^2 - 0,15^2) \times 0,4 = 0,13 \text{ m}^3$$


BOURÁNÍ STŘEDOVÝCH SLOUPŮ CELKEM 29,12 m³

ODBOURÁNÍ 2 KS PORUŠENÝCH SLOUPŮ VÍCEPRÁCE

$$(1,81 \times 0,4 \times 0,4) \times 2 = 0,6 \text{ m}^3$$

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ PROVEDENE ZA 9/2012 ~~45,33~~³ 48,24 m³ DÚ1 + DÚ2

✓ 1201-0
24 01/12
43 588 m³
(do 11/12)
OK
11/12

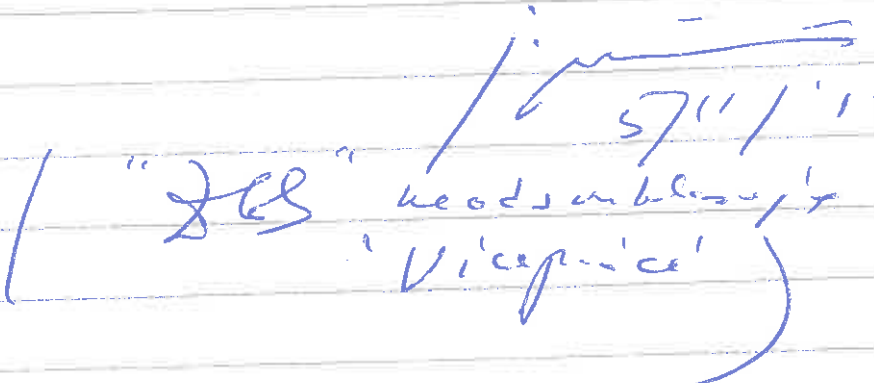Objekt	SO 1.59 DOKAZOVACÍ NÁDRŽE
Položka č.	1.59 - 96 103
DOURÁNÍ 2 KS POROBĚNÝCH SLOUPŮ - VICEPRACE	
$(1,81 \times 0,4 \times 0,4) \times 2 = 0,6 \text{ m}^3$	
EKVIVALENČNÍ PROVEDENÍ ZA 10/2012 0,6 m ³	
5711/12  "2 ks" head assembly / "Viceprace"	

Deník víceprací a méněprací

Stavba : Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV
Ucelená část 1B Čistírna odpadních vod

1) Objednatel:

jméno: TEPVOS, spol s r.o.
adresa: Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí
IČ: 25945793
DIČ: CZ 25945793
kontakt: Ing. Václav Knejp - 774 673 364
e-mail: knejp@tepvos.cz
zastoupená: Ing. Václavem Knejpem – jednatelem společnosti

2) Projektant:

jméno: Aqua Procon s.r.o.
adresa: Palackého tř. 12, 612 00 Brno
IČ:
DIČ:
kontakt: Ing. Daniel Kozický; Ing. Michal Ašer
e-mail:

3) Zhotovitel:

jméno: Sdružení pro stavbu Ústí nad Orlicí
adresa: SMP CZ a.s., VCES a.s., Hochtief CZ a.s., A.B.V. s.r.o.
IČ: Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6
DIČ: 271 951 47
kontakt: CZ 271 951 47
e-mail: p. Hána – Tel. 725v594 392
zastoupená: hana@smp.cz
Ing. Martin Doksanský, p. Bronislav Hána

4) Správce stavby:

jméno: d Plus projektová a inženýrská a.s.
adresa: Sokolovská 16/45, 186 00 Praha
kontakt: Ing. Ševčík – 723 780 763
e-mail:
zastoupená: Ing. Bohumil Ševčík

Zápis č. 1 – SO 1.69 – provozní budova

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Na základě skutečné skladby střešní konstrukce provozní budovy ČOV Ústí nad Orlicí, která nekoresponduje s původními podklady objednatele a tudíž i s projektovou dokumentací, je nezbytné provést nový návrh řešení střešní konstrukce.

Zhotovitel předloží revizi RPD a změnový list.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 2 – SO 1.69 – provozní budova

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Při bourání stávající dlažby bylo zjištěno, že lokální degradace podkladních vrstev je natolik rozsáhlá, že není možné jejich využití. Na některých místech naopak bylo spojení celé konstrukce takové, že nebylo možné jejich oddělení bez porušení stávající hydroizolace. Proto je nutné provést novou skladbu podlahy vč. hydroizolační vrstvy.

Současně s provedením podlahy bylo nezbytné provedení úpravy prahové části vrat vč. nájezdu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 3 – SO 1.52 – česlovna

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Při bourání stávající dlažby bylo zjištěno, že lokální degradace podkladních vrstev je natolik rozsáhlá, že není možné jejich využití. Na některých místech naopak bylo spojení celé konstrukce takové, že nebylo možné jejich oddělení bez porušení stávající hydroizolace. Proto je nutné provést novou skladbu podlahy vč. hydroizolační vrstvy.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 4 – SO 1.50, 1.52, 1.57, 1.60, 1.63, 1.69 – stavební elektro I. část

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Na základě zjištění pokročilé degradace stávajícího elektro vybavení různých SO, které mělo být dle PD ponecháno a pouze doplněno, bylo rozhodnuto, že musí být realizováno vystrojení zcela nové. Jeho zachování nebylo možné.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 5 – Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Po obnazení stávajícího potrubí bylo zjištěno, není možné provést napojení tak jak předpokládal projekt a bylo nutné využít jiného typu litinového potrubí.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 6 – SO 1.52 – Česlovna

Datum : 18/09/2012

Na žádost : Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatele byla provedena úprava ostění u vrat do česlovny. Zhotovitel předložil ZL kategorie 3 (Neuznatelný náklad)

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 7 – SO 1-50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Provedení nové omítky na ČS město nebylo možné ponechání původní omítky a pouze její doplnění, protože to její stav neumožňoval – budova by byla strukturně nesjednotitelná.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 8 – SO 1.64, 1.67, 1.55 – stavební elektro II. část

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Na základě zjištění pokročilé degradace stávajícího elektro vybavení různých SO, které mělo být dle PD ponecháno a pouze doplněno, bylo rozhodnuto, že musí být realizováno vystrojení zcela nové. Jeho zachování nebylo možné.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 8 – SO 1-57 – Dmýchárna

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Při bourání stávající dlažby bylo zjištěno, že lokální degradace podkladních vrstev je natolik rozsáhlá, že není možné jejich využití. Na některých místech naopak bylo spojení celé konstrukce takové, že nebylo možné jejich oddělení bez porušení stávající hydroizolace. Provedení hydroizolace a podkladního betonu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 9 – SO 1.64 – Budova kalového hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Přesun dveří rozvodny odvodnění kalu na vnější stěnu. Viz zápis s Tepvosem 17.4.2013.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 10 – SO 1-50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Provedení nových poklopů nad mokrou jímku ČS město. Stávající poklopy vykazovaly značnou degradaci.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 11 – SO 1.65 – Vyhnívací a uskladňovací nádrže

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Vzhledem k pokročilému stádiu degradace stávajícího koridoru k VN bylo nutno provést jeho opravu. Hrozilo zatékání do strojovny.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 12 – SO 1.65 – Vyhnívací a uskladňovací nádrže

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Po odkrytí stávajícího opláštění bylo zjištěno, že není možné užít stávajícího uchycení pro opláštění, proto bylo nutné provést novou nosnou konstrukci pro opláštění.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 13 – SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Doplnění stavebního elektra na ČS Město, které bylo v havarijním stavu a s jehož výměnou nebylo v rámci projektu počítáno (mělo být zachováno).

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 14 – SO 1.64 – Budova kalového hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele a objednatele

Na základě vyšší degradace obkladů stěn bylo nezbytné provést v místnostech 1.15 a části 1.12 obklad nad rámec předpokladu projektu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 15 – SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Provedení žebříku, který chyběl ve výkazu výměr (ale byl uveden na výkresech).

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 16 SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele a objednatele

S ohledem na pokročilou degradaci stávajícího stavu rampy na ČS město, která nebyla projektem řešena bylo rozhodnuto objednatelem o její rekonstrukci.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 17 – SO 1.66 – objekt BRO

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Změny ve stavební části vyplývající ze změny využití objektu BRO na garáže.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 18 – SO 1.65 – vyhnívací a uskladňovací nádrže

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Na základě změny platné legislativy řešící konstrukční návržení hromosvodů, bylo nutné přepracovat koncepci ochrany VN a UN.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 19 – SO 1.69 - provozní budova

Datum : 07/03/2013

Na žádost : Objednatele

Na přání objednatele provedení čistící rohože před provozní budovou. Zhotovitel předloží ZL kategorie 3 (neuznatelný náklad)

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 20 – SO 1.81 – Dmýchárna

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu, bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav, neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 21 – SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatele.

Realizace zabezpečovacího zařízení na ČS Město. Dle specifikace objednatele. Zhotovitel předloží ZL kategorie 3 (Neuznatelné náklady).

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 22 – SO 1.76 – Oplocení

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatele

Doplnění vstupní branky pro pěši, která nebyla projektem řešena. Dle specifikace objednatele. Zhotovitel předloží ZL kategorie 3 (Neuznatelné náklady).

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 23 – SO 1.57 – Dmychárna

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávajícího stavu dvou ramp a částí dveří u dmychárny, které nebyla projektem dotčeny bylo rozhodnuto objednatelem o jejich rekonstrukci.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 24 – SO 1.60 – Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu, bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav, neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 25 – SO 1.64 – Budova kalového hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav, neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 26 – SO 1.63 – zahuštění kalů

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 27 – SO 1.72 – Propojovací potrubí a žlaby

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatel

Jedná se o výměnu zkorodovaného a nevyhovujícího zakrytí jímky na nátoky na ČOV vyplývající z požadavku pracovníce OIP a objednatele.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 28 – PS 04 – kalové hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatel

Na žádost objednatel došlo k nacenění doplnění šoupat před 4ks čerpadel recirkulace VN.

Za objednatel :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitel :

p. Pavlič

Zápis č. 29 – PS 04 – kalové hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatel nebude realizováno technologické vstrojení plánované pro linku BRO.

Za objednatel :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitel :

p. Pavlič

Zápis č. 30 – SO 1.70 – Demolice

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Při realizaci demoličních prací v rámci objektu So 1.70 bylo zjištěno, že zakryté podkladní konstrukce nádrží a jímek byly dle skutečnosti ve větších mocnostech, než bylo zakresleno v dokumentaci skutečného provedení původní stavby. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatel :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitel :

p. Pavlič

Zápis č. 31 – PS 04 – doplnění zpětné klapky

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Z důvodu zvýšení ochrany výměníku tepla voda – kal bylo navrženo doplnění zpětné klapky DN 150 na potrubní větev 4.64 (výtláčné potrubí ohřevu a přečerpávání kalu), která zajistí oddělení výtlaku čerpadel 4.05 osazených v zahuštění kalu od výměníku. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 32 – SO 1.72 – propojení gravitačního zahuštění a odvodnění

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatele o zachování stávající nádrže zahuštění kalu je nutné provést napojení odtahu kalu z této nádrže do nově budovaného potrubí K9 (odtah kalu na odvodnění). Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 33 – SO 1.63 – nový žlab stávajícího zahuštění kalu

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Po otryskání konstrukce stávajícího žlabu bylo zjištěno, že míra degradace neumožňuje jeho opětovné využití. Objednatel rozhodl o výměně stávajícího žlabu za nový. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 34 – SO 1.64 – změna vytápění

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Při tvorbě zadávací dokumentace stavby nebylo možno specifikovat konkrétní typy jednotlivých strojních zařízení, ale pouze parametry, které jimi musí být splněny. Po konkretizaci jednotlivých zařízení v rámci realizačního stupně projektové dokumentace bylo nutno přistoupit k dílčím úpravám řešení části vytápění. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 35 – SO 1.57 – nový hromosvod dmychárny

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Z důvodu kompletně nově zrealizované střechy na objektu (viz zápis č. 20), bylo nutno přistoupit též k realizaci nového hromosvodu. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 36 – SO 1.64 – nový hromosvod kalového hospodářství

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Z důvodu kompletně nově zrealizované střechy na objektu (viz zápis č. 25), bylo nutno přistoupit též k realizaci nového hromosvodu. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 37 – PS 05 – Nerealizace linky BRO

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatele nerealizovat linku BRO, došlo ke změně užívání stávajícího objektu. Zhotovitel předloží revizi PD a návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 38 – PS 05 – Oprava plynojemů

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

V době realizace zadávací dokumentace stavby byl plynojem v plném provozu, a proto nemohlo dojít k prohlídce všech jeho součástí. Po odstavení stávajícího plynojemů bylo zjištěno, že dochází k zasekávání plovacího stropu v krajních polohách, způsobené špatnou funkcí teleskopu. Pro bezvadnou funkci plynojemů je nutné provést opravu teleskopu. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 39 – SO 1.55 – Stavební změny na objektu regenerace

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Po vyčištění stávající nádrže bylo zjištěno, že má tato nádrž rozdílné řešení systému zábrany proti vyplavání nádrže. Místo pouhého využití studen kolem nádrže, je nádrž vybavena vztakovými ventily

umožňujícími pronikání vody spodní vody do nádrže v době jejího odstavení z provozu. Tyto skutečnosti nebyly dostatečně zachyceny v dokumentaci skutečného provedení původní stavby a z důvodu píného provozu v době tvorby zadávací dokumentace nebylo možno zjistit skutečný stav ani při prohlídkách stavby. Na základě těchto zjištěných informací je nutno navrhnout i pozměněné řešení stavební části objektu – utěsnění prostupů, jímací studny, řešení dilatací, celoplošná hydroizolace, zatěsnění a čerpaní vody. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 40 – SO 1.64 – Úprava vnitřních prostor objektu

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatele

Na základě ohledání aktuálního stavu před započatím realizace dílčích prací bylo zjištěno že:

- Degradace částí stávajících obkladů, které měly být v rámci projektu zachovány, dostoupila takové míry, kdy není efektivní jejich zachování a doplňování. Proto bylo rozhodnuto o jejich odstranění a nahrazení novými obklady a výmalbami.
- Při tvorbě zadávací dokumentace stavby nebylo možno specifikovat konkrétní typy jednotlivých strojních zařízení, ale pouze parametry, které jimi musí být splněny. Po konkretizaci jednotlivých zařízení v rámci realizačního stupně projektové dokumentace bylo nutno přistoupit k dílčím úpravám rozměrových parametrů betonových fundamentů, na kterých jsou zařízení uložena a tras potrubí.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 41 – SO 1.72 – Změna trasy potrubí O6

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatele

Při výkopových pracích bylo zjištěno, že sklolaminátové potrubí odtoku vyčištěné vody z dosazovací nádrže O6 není možno položit v zamýšlené trase z důvodu výškové kolize se stávajícím potrubím z ČS kalu a shlukem kabelových vedení jdoucím kolem tohoto potrubí. Poloha těchto stávajících konstrukcí nekorespondovala s údaji uvedenými v dokumentaci skutečného provedení původní stavby. Bylo rozhodnuto o změně části trasy potrubí O6, které bylo prodlouženo a doplněno o dvě kolena 90°. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 42 – SO 1.72 – Úprava měrného žlabu

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatel došlo k úpravě měrného žlabu. Bylo rozhodnuto, že nedojde k vybourání stávajícího venturiho žlabu, vnitřní prostor bude sanován dle DPS a objednatel si zajistí zakrytí. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 43 – SO 1.65 – Úpravy soklu uskladňovací nádrže

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatel došlo k doplnění soklu kolem uskladňovací nádrže, tak aby byla jeho úprava identická s vyhnívacími nádržemi. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 44 – SO 1.50 – Úpravy kolem trafostanice

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: ČEZ

Na základě zjištění aktuálního technického stavu elektroinstalace a požadavku ČEZ, bylo rozhodnuto o provedení následujících úprav v rozvodně VN a na ČS město:

- Doplnění oplocení, branky a el. zámku (z požadavku ČEZ bylo nutné zajistit přístup k měření na ČS město).
- Přemístění měření (požadavkem ČEZ, který definuje podmínky připojení, na základě těchto požadavků bylo nutné zajistit).
- Odpojovač trafa (v revizní zprávě provozovatele bylo zjištěno, že stavující odpojovače trafa se při porušení VN pojistky neodpojí a tím může dojít k poškození transformátoru a třífázových točivých strojů, bylo rozhodnuto o výměně).

Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 45 – SO 1.57 – Doplnění elektro dmychárny a trafostanice

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Na základě zjištění pokročilé degradace stávajícího elektro vybavení, které neumožňovalo splnění původní idey ZDS počítající s jejím ponecháním a doplněním, bylo rozhodnuto, že musí být realizováno vstrojení zcela nové. Jeho zachování nebylo možné. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 47 – SO 1.54 – úprava dna

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Po odstavení z provozu, vypuštění, vyčištění a místním ohledání stávajících nádrží dešťových zdrží bylo zjištěno, že spádové betony den jsou značně zdegradované. Na základě těchto informací bylo rozhodnuto o odbourání spádového betonu a technickém řešení nového provedení. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 48 – SO 1.59 – úprava dna

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Po odstavení z provozu, vypuštění, vyčištění a místním ohledání stávajících dosazovacích nádrží II° bylo zjištěno, že spádové betony den jsou značně zdegradované. Na základě těchto informací bylo rozhodnuto o odbourání spádového betonu a technickém řešení nového provedení. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 49 – SO 1.60 – Nový hromosvod ČS Kalu

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Z důvodu rozhodnutí o nutnosti realizace kompletně nové střechy na objektu, bylo nutno přistoupit též k realizaci nového hromosvodu, protože původní musel být před prováděním prací zcela zdemontován. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 50 – PS 07 – SŘTP PS 05

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatel nerealizovat linku BRO, došlo k úpravě rozsahu na stávajícím objektu. Zhotovitel předloží revizi PD a návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 51 – SO 1.73 – Komunikace

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

V rámci nutných zásahů do konstrukce stávající komunikace na ČOV bylo zjištěno, že je betonová vrstva v některých místech značně degradovaná a vykazuje též odchylky od požadované mocnosti. Proto bylo rozhodnuto kompletní renovaci některých nejvíce postižených úseků.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 52 – SO 1.50 – Úprava konceptu řešení OK

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Během výkopových prací pro novou OK a provizorní žlab bylo zjištěno, že se v tomto prostoru vyskytují zbytky larsenové stěny, znemožňující provedení některých konstrukcí dle původních předpokladů projektu. Na základě toho zjištění je nutno aby došlo ke kompletní úpravě konceptu řešení výstavby na odlehčovací komoře. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 53 – SO 1.57 – Výměna ocelových vrat

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Na základě pokročilého stupně degradace a oslabení konstrukce vrat na objektu dmychárny bylo rozhodnuto o jejich kompletní výměně. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 54 – SO 1.57 – Výměna odpojovačů

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

V průběhu odstávky vysokého napětí na ČOV došlo k zjištění aktuálního technického stavu elektroinstalace v trafostanici VN bylo rozhodnuto o nutnosti provedení výměny odpojovačů traf, aby nemohlo nastat porušení transformátoru a třífázových točivých strojů. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 55 – SO 1.50 – Napájecí kabel

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: ČEZ/Objednatel

Trafo (400 VA) má dva vývodní kabely, které byly dimenzovány na 577A. Po proměření stavu kabelů revizním technikem bylo zjištěno, že jeden kabel od každého trafo má sníženou izolační schopnost. Bylo rozhodnuto objednatelem o výměně napájecích kabelu. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 56 – SO 1.55 – Prodloužení studny

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Po vyčištění stávající nádrže bylo zjištěno, že má tato nádrž rozdílné řešení systému zábrany proti vyplavání nádrže. Místo pouhého využití studen kolem nádrže, je nádrž vybavena vztlakovými ventily umožňujícími pronikání vody spodní vody do nádrže v době jejího odstavení z provozu. Tyto skutečnosti nebyly dostatečně zachyceny v dokumentaci skutečného provedení původní stavby a z důvodu plného provozu v době tvorby zadávací dokumentace nebylo možno zjistit skutečný stav ani při prohlídkách stavby. Na základě těchto zjištěných informací je nutno navrhnout i pozměněné řešení stavební části objektu – utěsnění prostupů, jímací studny, řešení dilatací, celoplošná hydroizolace, zatěsnění a čerpaní vody. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 57 – SO 1.51 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp




Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlíč



Zápis č. 58 – SO 1.52 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp




Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlíč



Zápis č. 59 – SO 1.53 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp




Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlíč



Zápis č. 60 – SO 1.54 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlíč



Zápis č. 61 – SO 1.55 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 62 – SO 1.56 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 63 – SO 1.57 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 64 – SO 1.58 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 65 – SO 1.59 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 66 – SO 1.60 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 67 – SO 1.61 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 68 – SO 1.62 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 69 – SO 1.63 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 70 – SO 1.64 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 71 – SO 1.65 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 72 – SO 1.66 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 73 – SO 1.67 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp




Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 74 – SO 1.68 – Celková bilance


Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 75 – SO 1.69 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 76 – SO 1.70 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 77 – SO 1.71 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 78 – SO 1.72 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 79 – SO 1.73 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 80 – SO 1.74 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 81 – SO 1.76 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 82 – SO 1.77 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 83 – PS 01 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 84 – PS 02 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 85 – PS 03 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlíč



Zápis č. 86 – PS 04 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlíč



Zápis č. 87 – PS 05 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlíč



Zápis č. 88 – PS 06 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlíč



Zápis č. 89 – PS 07 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 90 – PS 08 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 91 – 1.55 – Lávky

Datum: 27/05/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší doplnění zámečnických konstrukcí na regeneraci kalu. Na základě požadavků bezpečnostního technika z fyzické prohlídky stavby bylo rozhodnuto o nutnosti doplnění lávek v místech míchadel na regenerační nádrži. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič


V. J. KUSELA

Zápis č. 92 – SO 1.50 – Celková bilance

Datum: 30/05/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		č.	
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY		ZL č.1B-78	
Komu: TEPVOS, spol. s r.o.		Datum:	
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.59 - Dosazovací nádrže	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:			
Důvod změny: Rozdíl mezi ZDS a RDS			
Popis změny:			
Uvedený změnový list řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.			
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny: Vícepráce 360 600,67 Kč Méněpráce -77 287,83 Kč Celkem 283 312,84 Kč			
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
<i>Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.</i>			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí 28.07.2014 Sdružení pro Ústí nad Orlicí - Kanalizace a ČOV Pobřežní 667/78 186 00 Praha 8		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí 28.07.2014 AQUA PROCON divize Praha Dukelských hrdinů 12 170 00 Praha 7, ČR DIČ: CZ46964371	
Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí 24.07.2014 TEPVO S.R.O. Třepovská 287 552 01 Ústí nad Orlicí		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí 28.07.2014 TEPVO S.R.O. Třepovská 287 552 01 Ústí nad Orlicí IČ: 25945753 DIČ: CZ25945753	

5. 8. 2014

28.7.2014

Rekapitulace				
--------------	--	--	--	--

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.59 - Dosazovací nádrže	Celková bilance	-77 287,83 Kč	360 600,67 Kč	283 312,84 Kč
CELKEM		-77 287,83 Kč	360 600,67 Kč	283 312,84 Kč

Kód položky		Objekt	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
1.	2.	3.	5.	6.	11.	12.	13.
		SO 1.59	SO 1.59 DOSAZOVACÍ NÁDRŽE				5 212 121,51
		SO 1.59	Betonové konstrukce				4 712 252,63
1.59 - 35101		SO 1.59	Beton železový vodostavební C 30/37 XA2 XF3	m3	302,498	11 833,80	3 579 701,42
1.59 - 35101	vp	SO 1.59	Beton železový vodostavební C 30/37 XA2 XF3	m3	24,142	11 833,80	285 691,60
1.59 - 35107		SO 1.59	Zkouška vodotěsnosti nádrže	m3	4 932,249	86,20	425 159,84
1.59 - 35113		SO 1.59	Vodotěsná spára - styk nový a stávající beton	m	170,720	676,70	115 526,22
1.59 - 35113	vp	SO 1.59	Vodotěsná spára - styk nový a stávající beton	m	79,360	676,70	53 702,91
1.59 - 35118		SO 1.59	Úprava betonového povrchu-strojně gletovaný povrch	m2	1 003,407	185,80	186 432,95
1.59 - 35118	mp	SO 1.59	Úprava betonového povrchu-strojně gletovaný povrch	m2	130,427	185,80	24 233,34
1.59 - 35119		SO 1.59	Dilatace betonového dna od stěn-např. polystyrén	m	150,720	53,10	8 003,23
1.59 - 35120		SO 1.59	Smršťovací a dilatační spáry,včetně zapravení-dobetonávka dna	sada	1,000	44 583,80	44 583,80
1.59 - 35121		SO 1.59	Kotvení nerez odtok žlabu (pomocí chemických kotev)	kus	2,000	18 842,00	37 684,00
		SO 1.59	Sanace				805 054,10
1.59 - 36113		SO 1.59	Sanace pro SO 1.59	sada	1,000	805 054,10	805 054,10
		SO 1.59	Kompletní konstrukce				89 168,00
1.59 - 38103		SO 1.59	Úprava vztlakových ventilů,včetně odvedení podzemní vody do středu nádrže	kus	18,000	5 573,00	89 168,00
		SO 1.59	Potrubí				1150 470,40
1.59 - 81127		SO 1.59	Prostupy a otvory pro SO 1.59	sada	1,000	135 809,20	135 809,20
1.59 - 81128		SO 1.59	Opískovaná spojka DN 500	kus	2,000	7 430,80	14 861,20
		SO 1.59	Bourání a demolice konstrukcí				2220 22,73
1.59 - 96101		SO 1.59	Vybourání železobetonových konstrukcí	m3	0,504	4 410,60	2 222,94
1.59 - 96101	vp	SO 1.59	Vybourání železobetonových konstrukcí	m3	0,156	4 410,60	688,05
1.59 - 96102		SO 1.59	Řezání železobetonu,včetně úpravy otvoru	m2	3,580	1 353,40	4 818,10
1.59 - 96102	mp	SO 1.59	Řezání železobetonu,včetně úpravy otvoru	m2	0,620	1 353,40	839,11
1.59 - 96103		SO 1.59	Bourání železobetonových konstrukcí bez poškození výztuže	m3	43,588	4 410,60	192 249,05
1.59 - 96103	vp	SO 1.59	Bourání železobetonových konstrukcí bez poškození výztuže	m3	4,652	4 410,60	20 518,11
1.59 - 96104		SO 1.59	Bourání betonových konstrukcí	m3	0,198	3 863,90	765,05
1.59 - 96121		SO 1.59	Vybourání ocel.ploten ze stěn-komplet	kus	98,000	491,00	47 136,00
1.59 - 96121	mp	SO 1.59	Vybourání ocel.ploten ze stěn-komplet	kus	98,000	491,00	47 136,00
1.59 - 96122		SO 1.59	Odstření asfalt.nátěru stěn u dna nádrže	m2	75,360	265,40	20 000,54
		SO 1.59	Kovové stavební konstrukce				2220 713,65
1.59 - 76706		SO 1.59	Nerez poklop,včetně rámu	m2	5,440	17 515,10	95 282,14
1.59 - 76706	mp	SO 1.59	Nerez poklop,včetně rámu	m2	0,290	17 515,10	5 079,38
1.59 - 76716		SO 1.59	Nerez rošt,včetně rámu	m2	5,760	11 676,70	67 257,79
1.59 - 76748		SO 1.59	Demontáž ocelových prvků pro SO 1.59	sada	1,000	63 293,10	63 293,10
