

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list č.		č.	
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY		ZL č.1B-56	
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum:	8.5.2014
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.57 Dmychárna	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny:			
Popis změny:			
V projektu byl předpoklad ponechání skříně stávajícího elektro-stavebního rozvaděče včetně původního vyzbrojení a jeho doplnění novou elektrickou výzbrojí. Po částečné demontáži tohoto rozvaděče bylo zjištěno, že doplnění nové části rozvaděče pro rekonstruované místnosti v soustavě TN-S není technicky proveditelné, neboť rozvaděč vykazoval známky nadměrné koroze. Proto bylo rozhodnuto, že je nutné realizovat nový elektro-stavební rozvaděč včetně náhrady stávajícího vyzbrojení a doplnění o nové prvky dle původního projektu. Rozvodna bude mít tedy kompletně novou elektro-stavební instalaci. Tato instalace bude provedena v soustavě TN-S V rámci nutnosti sjednocení elektro-soustav a úprav rozvaděče, bylo přistoupeno k výměně svítidel, vypínačů a zásuvek. Součástí oznámení změny je: 1) Rekapitulace kalkulace 2) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny – elektro dmychárna 3) Dokumentace RDS – SO 1.57 – zakres změny 4) Stanovisko HIP 5) Zápis v deníku více / méně prací a stavebním deníku 6) Fotodokumentace			
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí – nesouhlasí - Kanalizace a ČOV Přebřežní 667/18 186 00 Praha 8 Datum: 8.5.2014		Za projektanta: Souhlasí – nesouhlasí AQUA VAPROCON divize Praha Dukelských hrdinů 12 170 00 Praha 7, ČR DIČ: CZ696437 Datum: 8.5.2014	
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV Datum: 8.5.2014		Za objednatele: Souhlasí – nesouhlasí TEPVOS, spol. s r.o. Třebovská 287 562 03 Ústí nad Orlicí 3 Datum: 8.5.2014	

Souhlas "ZLS":

Rekapitulace				
--------------	--	--	--	--

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.57 - Dmychárna	Elektro dmychárna	0,00 Kč	153 948,42 Kč	153 948,42 Kč
CELKEM		0,00 Kč	153 948,42 Kč	153 948,42 Kč

Kalkulace - elektro dmycharna			
	Cena dodavatele	Procento režijních nákladů a zisku - 5%	Cena celkem
Elektro dmycharna	146 617,54 Kč	7 330,88 Kč	153 948,42 Kč
CELKEM			153 948,42 Kč

Číslo zakázky: 3332050
Rozpočet číslo: PK13f0415

**SE - nabídka vícepráce ČOV dmychárna, rozvodna, VN
SMP CZ**

SE - nové rozvodnice RS - dmychárna, rozvodna NN

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
1		* Nové rozvodnice RS	0		0,00 Kč	0,00 Kč
2		Rozvodnice Luca Europa, 380x370x140, 2x18 modulů, IP65,	2 ks		1 525,89 Kč	3 051,78 Kč
3		Držák svorek pro 18 modulů v řadě, obj.č.: LUCASYSTEM12	2 ks		21,52 Kč	43,04 Kč
4		Blok svorek 15x4,5+6x5,6, obj.č.: LUCASYSTEM12534 - Sor	2 ks		70,82 Kč	141,65 Kč
5		Záslepka pro 4 moduly šedá, obj.č.: LUCASYSTEM12863 - Š	4 ks		12,11 Kč	48,45 Kč
6		* Jističí prvky	0		0,00 Kč	0,00 Kč
7		E203/40A gr (Vypínač řady E200, 3P 40A, na DIN, barva pát	2 ks		539,27 Kč	1 078,54 Kč
8		S201M-B16 (Jistič modulární 1P 16A char. B, 10kA, 440V~)	6 ks		100,68 Kč	604,09 Kč
9		S201M-B10 (Jistič modulární 1P 10A char. B, 10kA, 440V~)	10 ks		100,68 Kč	1 006,81 Kč
10		F204 AC-40/0,03 (Proudový chránič 3P+N, 30mA AC, In=40,	2 ks		1 054,22 Kč	2 108,43 Kč
11		* Svorkovnice	0		0,00 Kč	0,00 Kč
12		D2,5/5.2L (Řadová svorka pružinová standardní, dvě pružiny	40 ks		12,05 Kč	481,84 Kč
13		D2,5/5.N.2L (Řadová svorka pružinová standardní, dvě pruži	21 ks		10,74 Kč	225,63 Kč
14		D2,5/5.P.2L (Řadová svorka pružinová zemní, dvě pružiny,	21 ks		44,46 Kč	933,66 Kč
15		FED5.2L (Koncová sekce pro pružinové svorky 1.5-4mm2 se	21 ks		9,89 Kč	207,68 Kč
16		* Vývodky	0		0,00 Kč	0,00 Kč
17		BML-12 (plastová matice s metrickým závitem M20x1,5)	20 ks		2,37 Kč	47,31 Kč
18		BML-14 (plastová matice s metrickým závitem M32x1,5)	2 ks		4,59 Kč	9,18 Kč
19		BM-12L (vývodka metrická M20x1,5, upínací rozsah 6-12 mm	20 ks		9,57 Kč	191,33 Kč
20		BM-17 (vývodka metrická M32x1,5, upínací rozsah 18-25 mm	2 ks		39,21 Kč	78,41 Kč
21		S201M-B10 (Jistič modulární 1P 10A char. B, 10kA, 440V~)	1 ks		152,00 Kč	152,00 Kč
22		S201M-B16 (Jistič modulární 1P 16A char. B, 10kA, 440V~)	1 ks		152,00 Kč	152,00 Kč
Celkem						10 561,82 Kč

SE - svítidla, vypínače, zásuvky

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
1		*Osvětlení, zásuvky	0		0,00 Kč	0,00 Kč
2		3558N-C01510 S (Spínač jednopólový IP 44 (1), ABB řada V	6 ks		105,95 Kč	635,72 Kč
3		3558N-C06510 S (Přepínač střídavý IP 44 (6) - ABB řada Va	8 ks		111,37 Kč	890,95 Kč
4		3558N-C07510 S (Přepínač křížový IP 44 (7) - ABB řada Var	2 ks		132,51 Kč	265,01 Kč
5		5518N-C02510 S (Zásuvka jednonásobná IP 44 s víčkem 2P	11 ks		98,05 Kč	1 078,54 Kč
6		Svítilno PROFI 258 AC E IP65	34 ks		856,81 Kč	29 131,37 Kč
7		Zářivka 58W/840 L T8 Lumilux Osram	68 ks		76,40 Kč	5 195,13 Kč
8		RD 9125 (Odbočná krabice 2,5 mm, 5 pól. svorkovnice 2,5 m	15 ks		277,70 Kč	4 165,56 Kč
9		*Orientační osvětlení	0		0,00 Kč	0,00 Kč
10		ATN-3h - ATLANTIC 1x8W, dočasné, 3h, IP65	4 ks		1 365,82 Kč	5 463,26 Kč
Celkem						46 825,55 Kč

SE - kabely, kabelové trasy

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
1		*Kabely	0		0,00 Kč	0,00 Kč
2		CYKY-O 3x1,5 (3Ax1,5) (silový kabel 3x1,5mm dráty, průměr	120 m		11,12 Kč	1 333,80 Kč
3		CYKY-J 3x1,5 (3Cx1,5) (silový kabel 3x1,5mm dráty, průměr	500 m		11,25 Kč	5 624,00 Kč
4		CYKY-J 5x1,5 (5Cx1,5) (silový kabel 5x1,5mm dráty, průměr	50 m		18,29 Kč	914,38 Kč
5		CYKY-J 3x2,5 (3Cx2,5) (silový kabel 3x2,5mm dráty, průměr	180 m		17,79 Kč	3 202,83 Kč
6		*Kabelové trasy	0		0,00 Kč	0,00 Kč
7		UPRM 25 (plastová elektroinstalační trubka tmavě šedá)	80 m		23,24 Kč	1 858,96 Kč
8		UPRM 32 (plastová elektroinstalační trubka tmavě šedá)	40 m		32,89 Kč	1 315,56 Kč
9		CL25 (příchytka pro plastové trubky - šedá)	160 ks		4,05 Kč	647,52 Kč
10		CL32 (příchytka pro plastové trubky - šedá)	80 ks		5,71 Kč	456,76 Kč
11		SRC 25 (instalační trubka ohebná plast)	20 m		25,96 Kč	519,27 Kč
12		SRC 16 (instalační trubka ohebná plast)	20 m		15,11 Kč	302,10 Kč

13	Ostatní drobný materiál	1 kpl	2 660,00 Kč	2 660,00 Kč
Celkem				18 835,18 Kč

SO1.57 Dmychárna - montáže, projekce

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Celkem
1		Montážní práce	1 ks	53 200,00 Kč	53 200,00 Kč
2		Projekce	1 ks	6 080,00 Kč	6 080,00 Kč
Celkem					59 280,00 Kč

Inženýrská činnost

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Celkem
1		Inženýrská činnost	1 kpl	3 990,00 Kč	3 990,00 Kč
Celkem					3 990,00 Kč

Revize


No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Celkem
1		Revize	1 kpl	7 125,00 Kč	7 125,00 Kč
Celkem					7 125,00 Kč

Vyjádření projektanta ke změně

Podprojekt: 1B – ČOV
SO/PS: SO 1.57 Dmychárna
Změna: Elektro dmychárna
Datum:

Vyjádření projektanta:

V projektu byl předpoklad ponechání skříně stávajícího elektrostatického rozvaděče včetně původního vyzbrojení a jeho doplnění novou elektrickou výzbrojí. Po částečné demontáži tohoto rozvaděče bylo zjištěno, že doplnění nové části rozvaděče pro rekonstruované místnosti v soustavě TN-S není technicky proveditelné, neboť rozvaděč vykazoval známky nadměrné koroze. Degradace zařízení pokročila od doby započetí projektových prací do takového stádia, že by byla ponecháním stávajících rozvaděčů výrazně ohrožena životnost celého systému. Proto bylo rozhodnuto, že je nutné realizovat nový elektrostatický rozvaděč včetně náhrady stávajícího vyzbrojení a doplnění o nové prvky dle původního projektu. Rozvodna bude mít tedy kompletně novou elektrostatickou instalaci. Tato instalace bude provedena v soustavě TN-S. V rámci nutnosti sjednocení elektro-soustav a úprav rozvaděče, bylo přistoupeno k výměně svítidel, vypínačů a zásuvek.



Deník víceprací a méněprací

Stavba : Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV
Ucelená část 1B Čistírna odpadních vod

1) Objednatel:

jméno: TEPVOS, spol s r.o.
adresa: Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí
IČ: 25945793
DIČ: CZ 25945793
kontakt: Ing. Václav Knejp - 774 673 364
e-mail: knejp@tepvos.cz
zastoupená: Ing. Václavem Knejpem – jednatelem společnosti

2) Projektant:

jméno: Aqua Procon s.r.o.
adresa: Palackého tř. 12, 612 00 Brno
IČ:
DIČ:
kontakt: Ing. Daniel Kozický; Ing. Michal Ašer
e-mail:

3) Zhotovitel:

jméno: Sdružení pro stavbu Ústí nad Orlicí
adresa: SMP CZ a.s., VCES a.s., Hochtief CZ a.s., A.B.V. s.r.o.
IČ: Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6
DIČ: 271 951 47
kontakt: CZ 271 951 47
e-mail: p. Hána – Tel. 725v594 392
zastoupená: hana@smp.cz
Ing. Martin Doksanský, p. Bronislav Hána

4) Správce stavby:

jméno: d Plus projektová a inženýrská a.s.
adresa: Sokolovská 16/45, 186 00 Praha
kontakt: Ing. Ševčík – 723 780 763
e-mail:
zastoupená: Ing. Bohumil Ševčík



Zápis č. 1 – SO 1.69 – provozní budova

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Na základě skutečné skladby střešní konstrukce provozní budovy ČOV Ústí nad Orlicí, která nekoresponduje s původními podklady objednatele a tudíž i s projektovou dokumentací, je nezbytné provést nový návrh řešení střešní konstrukce.

Zhotovitel předloží revizi RPD a změnový list.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 2 – SO 1.69 – provozní budova

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Při bourání stávající dlažby bylo zjištěno, že lokální degradace podkladních vrstev je natolik rozsáhlá, že není možné jejich využití. Na některých místech naopak bylo spojení celé konstrukce takové, že nebylo možné jejich oddělení bez porušení stávající hydroizolace. Proto je nutné provést novou skladbu podlahy vč. hydroizolační vrstvy.

Současně s provedením podlahy bylo nezbytné provedení úpravy prahové části vrat vč. nájezdu.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 3 – SO 1.52 – česlovna

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Při bourání stávající dlažby bylo zjištěno, že lokální degradace podkladních vrstev je natolik rozsáhlá, že není možné jejich využití. Na některých místech naopak bylo spojení celé konstrukce takové, že nebylo možné jejich oddělení bez porušení stávající hydroizolace. Proto je nutné provést novou skladbu podlahy vč. hydroizolační vrstvy.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 4 – SO 1.50, 1.52, 1.57, 1.60, 1.63, 1.69 – stavební elektro I. část

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Na základě zjištění pokročilé degradace stávajícího elektro vybavení různých SO, které mělo být dle PD ponecháno a pouze doplněno, bylo rozhodnuto, že musí být realizováno vystrojení zcela nové. Jeho zachování nebylo možné.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 5 – Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Po obnažení stávajícího potrubí bylo zjištěno, není možné provést napojení tak jak předpokládal projekt a bylo nutné využít jiného typu litinového potrubí.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 6 – SO 1.52 – Česlovna

Datum : 18/09/2012

Na žádost : Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatele byla provedena úprava ostění u vrat do česlovny. Zhotovitel předloží ZL kategorie 3 (Neuznatelný náklad)

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 7 – SO 1-50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Provedení nové omítky na ČS město nebylo možné ponechání původní omítky a pouze její doplnění, protože to její stav neumožňoval – budova by byla strukturně nesjednotitelná.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 8 – SO 1.64, 1.67, 1.55 – stavební elektro II. část

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Na základě zjištění pokročilé degradace stávajícího elektro vybavení různých SO, které mělo být dle PD ponecháno a pouze doplněno, bylo rozhodnuto, že musí být realizováno vystrojení zcela nové. Jeho zachování nebylo možné.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 8 – SO 1-57 –Dmýchárna

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Při bourání stávající dlažby bylo zjištěno, že lokální degradace podkladních vrstev je natolik rozsáhlá, že není možné jejich využití. Na některých místech naopak bylo spojení celé konstrukce takové, že nebylo možné jejich oddělení bez porušení stávající hydroizolace. Provedení hydroizolace a podkladního betonu.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 9 – SO 1.64 – Budova kalového hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na žádost: zhotovitele

Přesun dveří rozvodny odvodnění kalu na vnější stěnu. Viz zápis s Tepvosem 17.4.2013.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 10 –SO 1-50 –vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Provedení nových poklopů nad mokrou jímku ČS město. Stávající poklopy vykazovaly značnou degradaci.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 11 – SO 1.65 – Vyhnivací a uskladňovací nádrže

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Vzhledem k pokročilému stádiu degradace stávajícího koridoru k VN bylo nutno provést jeho opravu. Hrozilo zatékání do strojovny.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 12 – SO 1.65 –Vyhnivací a uskladňovací nádrže

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Po odkrytí stávajícího opláštění bylo zjištěno, že není možné užít stávajícího uchycení pro opláštění, proto bylo nutné provést novou nosnou konstrukci pro opláštění.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 13 – SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Doplnění stavebního elektra na ČS Město, které bylo v havarijním stavu a s jehož výměnou nebylo v rámci projektu počítáno (mělo být zachováno).

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 14 – SO 1.64 – Budova kalového hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele a objednatele

Na základě vyšší degradace obkladů stěn bylo nezbytné provést v místnostech 1.15 a části 1.12 obklad nad rámec předpokladu projektu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 15 – SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Provedení žebříku, který chyběl ve výkazu výměr (ale byl uveden na výkresech).

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 16 SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele a objednatele

S ohledem na pokročilou degradaci stávajícího stavu rampy na ČS město, která nebyla projektem řešena bylo rozhodnuto objednatelem o její rekonstrukci.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 17 – SO 1.66 – objekt BRO

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Změny ve stavební části vyplývající ze změny využití objektu BRO na garáže.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 18 – SO 1.65 – vyhnívací a uskladňovací nádrže

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Na základě změny platné legislativy řešící konstrukční navržení hromosvodů, bylo nutné přepracovat koncepci ochrany VN a UN.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 19 – SO 1.69 - provozní budova

Datum : 07/03/2013

Na žádost : Objednatele

Na přání objednatele provedení čistící rohože před provozní budovou. Zhotovitel předloží ZL kategorie 3 (neuznatelný náklad)

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 20 – SO 1.81 – Dmýchárna

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu, bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav, neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 21 – SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatele.

Realizace zabezpečovacího zařízení na ČS Město. Dle specifikace objednatele. Zhotovitel předloží ZL kategorie 3 (Neuznatelné náklady).

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 22 – SO 1.76 – Oplocení

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatele

Doplnění vstupní branky pro pěší, která nebyla projektem řešena. Dle specifikace objednatele. Zhotovitel předloží ZL kategorie 3 (Neuznatelné náklady).

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 23 – SO 1.57 – Dmychárna

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávajícího stavu dvou ramp a částí dveří u dmycháren, které nebyla projektem dotčena bylo rozhodnuto objednatelům o jejich rekonstrukci.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 24 – SO 1.60 – Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu, bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav, neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 25 – SO 1.64 – Budova kalového hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav, neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 26 – SO 1.63 – zahuštění kalů

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 27 – SO 1.72 – Propojovací potrubí a žlaby

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatel

Jedná se o výměnu zkorodovaného a nevyhovujícího zakrytí jímky na nátok na ČOV vyplývající z požadavku pracovníce OIP a objednatele.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 28 – PS 04 – kalové hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatele

Na žádost objednatele došlo k nacenění doplnění šoupat před 4ks čerpadel recirkulace VN.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 29 – PS 04 – kalové hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatele

Na základě rozhodnutí objednatele nebude realizováno technologické vystrojení plánované pro linku BRO.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 30 – SO 1.70 – Demolice

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Při realizaci demoličních prací v rámci objektu So 1.70 bylo zjištěno, že zakryté podkladní konstrukce nádrží a jímek byly dle skutečnosti ve větších mocnostech, než bylo zakresleno v dokumentaci skutečného provedení původní stavby. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 31 – PS 04 – doplnění zpětné klapky

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatele

Z důvodu zvýšení ochrany výměníku tepla voda – kal bylo navrženo doplnění zpětné klapky DN 150 na potrubní větev 4.64 (výtlačné potrubí ohřevu a přečerpávání kalu), která zajistí oddělení výtlačku čerpadel 4.05 osazených v zahuštění kalu od výměníku. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 32 – SO 1.72 – propojení gravitačního zahuštění a odvodnění

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatele

Na základě rozhodnutí objednatele o zachování stávající nádrže zahuštění kalu je nutné provést napojení odtahu kalu z této nádrže do nově budovaného potrubí K9 (odtah kalu na odvodnění). Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 33 – SO 1.63 – nový žlab stávajícího zahuštění kalu

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatele

Po otryskání konstrukce stávajícího žlabu bylo zjištěno, že míra degradace neumožňuje jeho opětovné využití. Objednatel rozhodl o výměně stávajícího žlabu za nový. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 34 – SO 1.64 – změna vytápění

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatele

Při tvorbě zadávací dokumentace stavby nebylo možno specifikovat konkrétní typy jednotlivých strojních zařízení, ale pouze parametry, které jimi musí být splněny. Po konkretizaci jednotlivých zařízení v rámci realizačního stupně projektové dokumentace bylo nutno přistoupit k dílčím úpravám řešení části vytápění. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 35 – SO 1.57 – nový hromosvod dmychárny

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Z důvodu kompletně nově zrealizované střechy na objektu (viz zápis č. 20), bylo nutno přistoupit též k realizaci nového hromosvodu. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 36 – SO 1.64 – nový hromosvod kalového hospodářství

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Z důvodu kompletně nově zrealizované střechy na objektu (viz zápis č. 25), bylo nutno přistoupit též k realizaci nového hromosvodu. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 37 – PS 05 – Nerealizace linky BRO

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatele nerealizovat linku BRO, došlo ke změně užívání stávajícího objektu. Zhotovitel předloží revizi PD a návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 38 – PS 05 – Oprava plynojemů

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

V době realizace zadávací dokumentace stavby byl plynojem v plném provozu, a proto nemohlo dojít k prohlídce všech jeho součástí. Po odstavení stávajícího plynojemů bylo zjištěno, že dochází k zasekávání plovoucího stropu v krajních polohách, způsobené špatnou funkcí teleskopu. Pro bezvadnou funkci plynojemů je nutné provést opravu teleskopu. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 39 – SO 1.55 – Stavební změny na objektu regenerace

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Po vyčištění stávající nádrže bylo zjištěno, že má tato nádrže rozdílné řešení systému zábrany proti vyplavání nádrže. Místo pouhého využití studen kolem nádrže, je nádrž vybavena vztákovými ventily

umožňujícími pronikání vody spodní vody do nádrže v době jejího odstavení z provozu. Tyto skutečnosti nebyly dostatečně zachyceny v dokumentaci skutečného provedení původní stavby a z důvodu plného provozu v době tvorby zadávací dokumentace nebylo možno zjistit skutečný stav ani při prohlídkách stavby. Na základě těchto zjištěných informací je nutno navrhnout i pozměněné řešení stavební části objektu – utěsnění prostupů, jímací studny, řešení dilatací, celoplošná hydroizolace, zatěsnění a čerpaní vody. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 40 – SO 1.64 – Úprava vnitřních prostor objektu

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatele

Na základě ohledání aktuálního stavu před započítím realizace dílčích prací bylo zjištěno že:

- Degradace částí stávajících obkladů, které měly být v rámci projektu zachovány, dostoupila takové míry, kdy není efektivní jejich zachování a doplňování. Proto bylo rozhodnuto o jejich odstranění a nahrazení novými obklady a výmalbami.
- Při tvorbě zadávací dokumentace stavby nebylo možno specifikovat konkrétní typy jednotlivých strojních zařízení, ale pouze parametry, které jimi musí být splněny. Po konkretizaci jednotlivých zařízení v rámci realizačního stupně projektové dokumentace bylo nutno přistoupit k dílčím úpravám rozměrových parametrů betonových fundamentů, na kterých jsou zařízení uložena a tras potrubí.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 41 – SO 1.72 – Změna trasy potrubí O6

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatele

Při výkopových pracích bylo zjištěno, že sklolaminátové potrubí odtoku vyčištěné vody z dosazovací nádrže O6 není možno položit v zamýšlené trase z důvodu výškové kolize se stávajícím potrubím z ČS kalu a shlukem kabelových vedení jdoucím kolem tohoto potrubí. Poloha těchto stávajících konstrukcí nekorespondovala s údaji uvedenými v dokumentaci skutečného provedení původní stavby. Bylo rozhodnuto o změně části trasy potrubí O6, které bylo prodlouženo a doplněno o dvě kolena 90°. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 42 – SO 1.72 – Úprava měrného žlabu

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatele došlo k úpravě měrného žlabu. Bylo rozhodnuto, že nedojde k vybourání stávajícího venturiho žlabu, vnitřní prostor bude sanován dle DPS a objednatel si zajistí zakrytí. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 43 – SO 1.65 – Úpravy soklu uskladňovací nádrže

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatele došlo k doplnění soklu kolem uskladňovací nádrže, tak aby byla jeho úprava identická s vyhnívacími nádržemi. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp




Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 44 – SO 1.50 – Úpravy kolem trafostanice

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: ČEZ

Na základě zjištění aktuálního technického stavu elektroinstalace a požadavku ČEZ, bylo rozhodnuto o provedení následujících úprav v rozvodně VN a na ČS město:

- Doplnění oplocení, branky a el. zámku (z požadavku ČEZ bylo nutné zajistit přístup k měření na ČS město).
- Přemístění měření (požadavkem ČEZ, který definuje podmínky připojení, na základě těchto požadavků bylo nutné zajistit).
- Odpojovač trafa (v revizní zprávě provozovatele bylo zjištěno, že stavující odpojovače trafa se při porušení VN pojistky neodpojí a tím může dojít k poškození transformátoru a třífázových točivých strojů, bylo rozhodnuto o výměně).

Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 45 – SO 1.57 – Doplnění elektro dmychárny a trafostanice

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Na základě zjištění pokročilé degradace stávajícího elektro vybavení, které neumožňovalo splnění původní idey ZDS počítající s jejím ponecháním a doplněním, bylo rozhodnuto, že musí být realizováno vystrojení zcela nové. Jeho zachování nebylo možné. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 47 – SO 1.54 – úprava dna

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Po odstavení z provozu, vypuštění, vyčištění a místním ohledání stávajících nádrží dešťových zdrží bylo zjištěno, že spádové betony den jsou značně zdegradované. Na základě těchto informací bylo rozhodnuto o odbourání spádového betonu a technickém řešení nového provedení. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 48 – SO 1.59 – úprava dna

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Po odstavení z provozu, vypuštění, vyčištění a místním ohledání stávajících dosazovacích nádrží II° bylo zjištěno, že spádové betony den jsou značně zdegradované. Na základě těchto informací bylo rozhodnuto o odbourání spádového betonu a technickém řešení nového provedení. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 49 – SO 1.60 – Nový hromosvod ČS Kalu

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Z důvodu rozhodnutí o nutnosti realizace kompletně nové střechy na objektu, bylo nutno přistoupit též k realizaci nového hromosvodu, protože původní musel být před prováděním prací zcela zdemontován. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 50 – PS 07 – SŘTP PS 05

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatele nerealizovat linku BRO, došlo k úpravě rozsahu na stávajícím objektu. Zhotovitel předloží revizi PD a návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 51 – SO 1.73 – Komunikace

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

V rámci nutných zásahů do konstrukce stávající komunikace na ČOV bylo zjištěno, že je betonová vrstva v některých místech značně degradovaná a vykazuje též odchylky od požadované mocnosti. Proto bylo rozhodnuto kompletní renovaci některých nejvíce postižených úseků.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 52 – SO 1.50 – Úprava konceptu řešení OK

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Během výkopových prací pro novou OK a provizorní žlab bylo zjištěno, že se v tomto prostoru vyskytují zbytky larsenové stěny, znemožňující provedení některých konstrukcí dle původních předpokladů projektu. Na základě toho zjištění je nutno aby došlo ke kompletní úpravě konceptu řešení výstavby na odlehčovací komoře. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 53 – SO 1.57 – Výměna ocelových vrat

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Na základě pokročilého stupně degradace a oslabení konstrukce vrat na objektu dmychárny bylo rozhodnuto o jejich kompletní výměně. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 54 – SO 1.57 – Výměna odpojovačů

Datum: 24/04/2014


Z požadavku: Objednatel

V průběhu odstávky vysokého napětí na ČOV došlo k zjištění aktuálního technického stavu elektroinstalace v trafostanici VN bylo rozhodnuto o nutnosti provedení výměny odpojovačů traf, aby nemohlo nastat porušení transformátoru a třífázových točivých strojů. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 55 – SO 1.50 – Napájecí kabel

Datum: 24/04/2014


Z požadavku: ČEZ/Objednatel

Trafo (400 VA) má dva vývodní kabely, které byly dimenzovány na 577A. Po proměření stavu kabelů revizním technikem bylo zjištěno, že jeden kabel od každého trafá má sníženou izolační schopnost. Bylo rozhodnuto objednatelem o výměně napájecích kabelu. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 56 – SO 1.55 – Prodloužení studny

Datum: 24/04/2014


Z požadavku: Objednatel

Po vyčištění stávající nádrže bylo zjištěno, že má tato nádrž rozdílné řešení systému zábrany proti vyplavání nádrže. Místo pouhého využití studen kolem nádrže, je nádrž vybavena vztakovými ventily umožňujícími pronikání vody spodní vody do nádrže v době jejího odstavení z provozu. Tyto skutečnosti nebyly dostatečně zachyceny v dokumentaci skutečného provedení původní stavby a z důvodu plného provozu v době tvorby zadávací dokumentace nebylo možno zjistit skutečný stav ani při prohlídkách stavby. Na základě těchto zjištěných informací je nutno navrhnout i pozměněné řešení stavební části objektu – utěsnění prostupů, jímací studny, řešení dilatací, celoplošná hydroizolace, zatěsnění a čerpaní vody. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 57 – SO 1.51 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp




Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 58 – SO 1.52 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 59 – SO 1.53 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp




Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 60 – SO 1.54 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 61 – SO 1.55 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp




Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 62 – SO 1.56 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 63 – SO 1.57 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 64 – SO 1.58 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp




Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 65 – SO 1.59 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 66 – SO 1.60 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014


Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 67 – SO 1.61 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014


Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 68 – SO 1.62 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014


Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 69 – SO 1.63 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014


Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 70 – SO 1.64 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014


Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 71 – SO 1.65 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014


Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 72 – SO 1.66 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 73 – SO 1.67 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel


Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 74 – SO 1.68 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel


Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 75 – SO 1.69 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel


Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 76 – SO 1.70 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel


Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 77 – SO 1.71 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel


Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 78 – SO 1.72 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 79 – SO 1.73 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel


Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 80 – SO 1.74 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel


Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 81 – SO 1.76 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel


Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 82 – SO 1.77 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel


Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 83 – PS 01 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel


Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 84 – PS 02 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel


Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 85 – PS 03 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014


Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 86 – PS 04 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014


Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič




Zápis č. 87 – PS 05 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014


Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 88 – PS 06 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014


Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp



Za správce stavby :
p. Ševčík



Za zhotovitele :
p. Pavlič



Zápis č. 89 – PS 07 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlíč



Zápis č. 90 – PS 08 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlíč



Zápis č. 91 – 1.55 – Lávky

Datum: 27/05/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší doplnění zámečnických konstrukcí na regeneraci kalu. Na základě požadavků bezpečnostního technika z fyzické prohlídky stavby bylo rozhodnuto o nutnosti doplnění lávek v místech míchadel na regenerační nádrži. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp




Za správce stavby :

p. Ševčík







Za zhotovitele :

p. Pavlič

V. S. KUBELA


Fotodokumentace

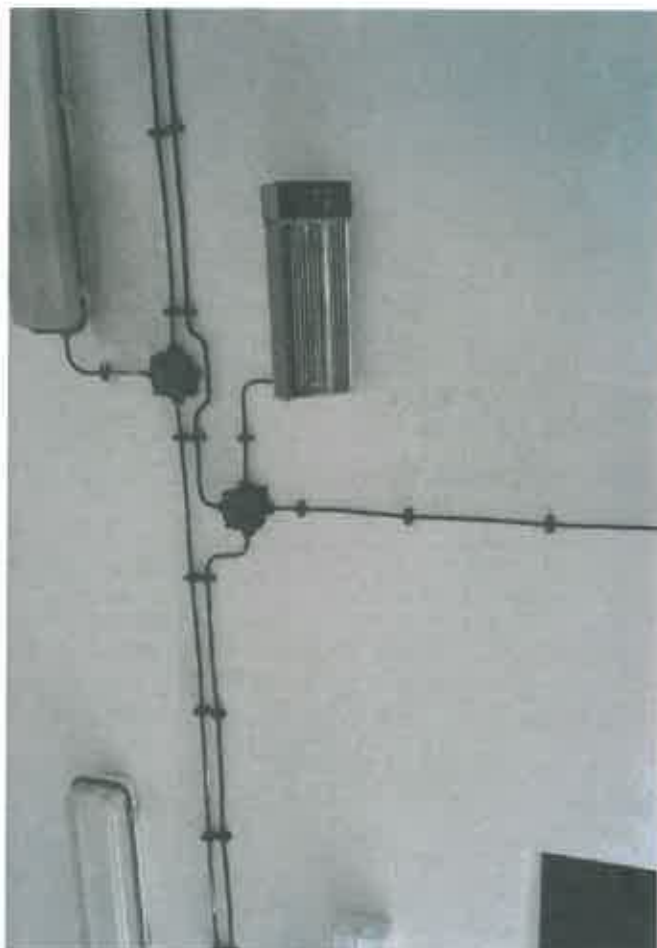

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “					
Změnový list				č.	
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY				ZL č.1B-56	
Komu: TEPVOS, spol. s r.o.			Datum:		
Odesláno/		předáno:			
Stavební objekt (provozní soubor):			SO 1.57 Dmychárna		
Odkazy:		na specifikaci: RDS			
		na výkresy: Projektová dokumentace změny RDS			
		na rozp. podklady: Výkaz výměr změny – kalkulace změny			
		na jinou část smlouvy:			
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:					
Důvod změny: Rozdíl mezi ZDS a RDS					
Popis změny:					
V projektu byl předpoklad ponechání skříně stávajícího elektrostavebního rozváděče včetně původního vstrojení a jeho doplnění novou elektrickou výzbou. Po částečné demontáži tohoto rozváděče bylo zjištěno, že doplnění nové části rozváděče pro rekonstruované místnosti v soustavě TN-S není technicky proveditelné, neboť rozváděč vykazoval známky nadměrné koroze. Proto bylo rozhodnuto, že je nutné realizovat nový elektrostavební rozváděč včetně náhrady stávajícího vyzbrojení a doplnění o nové prvky dle původního projektu. Rozvodna bude mít tedy kompletně novou elektrostavební instalaci. Tato instalace bude provedena v soustavě TN-S V rámci nutnosti sjednocení elektro-soustav a úprav rozváděče, bylo přistoupeno k výměně svítidel, vypínačů a zásuvek.					
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny: Vícepráce 153 948,42 Kč Méněpráce 0,00 Kč Celkem 153 948,42 Kč 2) Fotodokumentace					
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “					
<i>Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.</i>					
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.					
Vyjádření dotčených:					
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí  Datum: 24. 9. 2014			Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí  Datum: 24. 9. 2014		
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí  Datum: 24. 9. 2014			Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí  Datum: 24. 9. 2014		

Smlouva č. 885

Rekapitulace					
--------------	--	--	--	--	--

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.57 - Dmychárna	Elektro dmycharna	0,00 Kč	153 948,42 Kč	153 948,42 Kč
CELKEM		0,00 Kč	153 948,42 Kč	153 948,42 Kč

Kalkulace - elektro dmycharna			
	Cena dodavatele	Procento režijních nákladů a zisku - 5%	Cena celkem
Elektro dmycharna	146 617,54 Kč	7 330,88 Kč	153 948,42 Kč
CELKEM			153 948,42 Kč

Číslo zakázky: 3332050
Rozpočet číslo: PK13F0415

SE - nabídka vícepráce ČOV dmychárna, rozvodna, VN SMP CZ

SE - nové rozvodnice RS - dmychárna, rozvodna NN

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
1		* Nové rozvodnice RS	0		0,00 Kč	0,00 Kč
2		Rozvodnice Luca Europa, 380x370x140, 2x18 modulů, IP65,	2 ks		1 525,89 Kč	3 051,78 Kč
3		Držák svorek pro 18 modulů v řadě, obj.č.: LUCASYSTEM12	2 ks		21,52 Kč	43,04 Kč
4		Blok svorek 15x4,5+6x5,6, obj.č.: LUCASYSTEM12534 - Sor	2 ks		70,82 Kč	141,65 Kč
5		Záslepka pro 4 moduly šedá, obj.č.: LUCASYSTEM12863 - S	4 ks		12,11 Kč	48,45 Kč
6		*Jističí prvky	0		0,00 Kč	0,00 Kč
7		E203/40A gr (Vypínač řady E200, 3P 40A, na DIN, barva pát	2 ks		539,27 Kč	1 078,54 Kč
8		S201M-B16 (Jistič modulární 1P 16A char. B, 10kA, 440V~)	6 ks		100,68 Kč	604,09 Kč
9		S201M-B10 (Jistič modulární 1P 10A char. B, 10kA, 440V~)	10 ks		100,68 Kč	1 006,81 Kč
10		F204 AC-40/0,03 (Proudový chránič 3P+N, 30mA AC, In=40,	2 ks		1 054,22 Kč	2 108,43 Kč
11		* Svorkovnice	0		0,00 Kč	0,00 Kč
12		D2,5/5.2L (Řadová svorka pružinová standardní, dvě pružiny	40 ks		12,05 Kč	481,84 Kč
13		D2,5/5.N.2L (Řadová svorka pružinová standardní, dvě pruži	21 ks		10,74 Kč	225,63 Kč
14		D2,5/5.P.2L (Řadová svorka pružinová zemní, dvě pružiny,	21 ks		44,46 Kč	933,66 Kč
15		FED5.2L (Koncová sekce pro pružinové svorky 1.5-4mm2 se	21 ks		9,89 Kč	207,68 Kč
16		* Vývodky	0		0,00 Kč	0,00 Kč
17		BML-12 (plastová matice s metrickým závitem M20x1,5)	20 ks		2,37 Kč	47,31 Kč
18		BML-14 (plastová matice s metrickým závitem M32x1,5)	2 ks		4,59 Kč	9,18 Kč
19		BM-12L (vývodka metrická M20x1,5, upínací rozsah 6-12 mm	20 ks		9,57 Kč	191,33 Kč
20		BM-17 (vývodka metrická M32x1,5, upínací rozsah 18-25 mm	2 ks		39,21 Kč	78,41 Kč
21		S201M-B10 (Jistič modulární 1P 10A char. B, 10kA, 440V~)	1 ks		152,00 Kč	152,00 Kč
22		S201M-B16 (Jistič modulární 1P 16A char. B, 10kA, 440V~)	1 ks		152,00 Kč	152,00 Kč
Celkem						10 561,82 Kč

SE - svítidla, vypínače, zásuvky

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
1		*Osvětlení, zásuvky	0		0,00 Kč	0,00 Kč
2		3558N-C01510 S (Spínač jednopólový IP 44 (1), ABB řada V	6 ks		105,95 Kč	635,72 Kč
3		3558N-C06510 S (Přepínač střídavý IP 44 (6) - ABB řada Va	8 ks		111,37 Kč	890,95 Kč
4		3558N-C07510 S (Přepínač křížový IP 44 (7) - ABB řada Var	2 ks		132,51 Kč	265,01 Kč
5		5518N-C02510 S (Zásuvka jednonásobná IP 44 s víčkem 2F	11 ks		98,05 Kč	1 078,54 Kč
6		Svítidlo PROFI 258 AC E IP65	34 ks		856,81 Kč	29 131,37 Kč
7		Zářivka 58W/840 L T8 Lumilux Osram	68 ks		76,40 Kč	5 195,13 Kč
8		RD 9125 (Odbočná krabice 2,5 mm, 5 pól. svorkovnice 2,5 nr	15 ks		277,70 Kč	4 165,56 Kč
9		*Orientační osvětlení	0		0,00 Kč	0,00 Kč
10		ATN-3h - ATLANTIC 1x8W, dočasné, 3h, IP65	4 ks		1 365,82 Kč	5 463,26 Kč
Celkem						46 825,55 Kč

SE - kabely, kabelové trasy

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
1		*Kabely	0		0,00 Kč	0,00 Kč
2		CYKY-O 3x1,5 (3Ax1,5) (silový kabel 3x1,5mm dráty, průměr	120 m		11,12 Kč	1 333,80 Kč
3		CYKY-J 3x1,5 (3Cx1,5) (silový kabel 3x1,5mm dráty, průměr	500 m		11,25 Kč	5 624,00 Kč
4		CYKY-J 5x1,5 (5Cx1,5) (silový kabel 5x1,5mm dráty, průměr	50 m		18,29 Kč	914,38 Kč
5		CYKY-J 3x2,5 (3Cx2,5) (silový kabel 3x2,5mm dráty, průměr	180 m		17,79 Kč	3 202,83 Kč
6		*Kabelové trasy	0		0,00 Kč	0,00 Kč
7		UPRM 25 (plastová elektroinstalační trubka tmavě šedá)	80 m		23,24 Kč	1 858,96 Kč
8		UPRM 32 (plastová elektroinstalační trubka tmavě šedá)	40 m		32,89 Kč	1 315,56 Kč
9		CL25 (přichytka pro plastové trubky - šedá)	160 ks		4,05 Kč	647,52 Kč
10		CL32 (přichytka pro plastové trubky - šedá)	80 ks		5,71 Kč	456,76 Kč
11		SRC 25 (instalační trubka ohebná plast)	20 m		25,96 Kč	519,27 Kč
12		SRC 16 (instalační trubka ohebná plast)	20 m		15,11 Kč	302,10 Kč

13	Ostatní drobný materiál	1 kpl	2 660,00 Kč	2 660,00 Kč
Celkem				18 835,18 Kč

SO1.57 Dmychárna - montáže, projekce

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Celkem
1		Montážní práce	1 ks	53 200,00 Kč	53 200,00 Kč
2		Projekce	1 ks	6 080,00 Kč	6 080,00 Kč
Celkem					59 280,00 Kč

Inženýrská činnost

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Celkem
1		Inženýrská činnost	1 kpl	3 990,00 Kč	3 990,00 Kč
Celkem					3 990,00 Kč

Revize

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Celkem
1		Revize	1 kpl	7 125,00 Kč	7 125,00 Kč
Celkem					7 125,00 Kč

Fotodokumentace

