

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “		
Změnový list č.		č.
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY		ZL č.1B-04
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum: 2 10 2012
Odesláno/	předáno:	
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.50 – vstupní čerpací stanice
Odkazy:	na specifikaci:	RDS
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny
	na jinou část smlouvy:	
ZMĚNA – popis změny: Popis změny: V projektu byl předpoklad ponechání skříně stávajícího elektrostatického rozvaděče včetně původního vystrojení a jeho doplnění novou elektrickou výzbrojí. Po částečné demontáži tohoto rozvaděče bylo zjištěno, že doplnění nové části rozvaděče pro rekonstruované místnosti v soustavě TN-S není technicky proveditelné, neboť rozvaděč vykazoval známky nadměrné koroze. Proto bylo rozhodnuto, že je nutné realizovat nový elektrostatický rozvaděč včetně náhrady stávajícího vyzbrojení a doplnění o nové prvky dle původního projektu. Rozvodna bude mít tedy kompletně novou elektrostatickou instalaci. Tato instalace bude provedena v soustavě TN-S.		
Součástí oznámení změny je: 1) Rekapitulace kalkulace 2) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny – doplnění stavební elektroinstalace 3) Dokumentace RDS – SO 1.50 – zakres změny 4) Stanovisko HIP 5) Zápis v deníku více / méně prací a stavebním deníku 6) Fotodokumentace		
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “		
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.		
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 2.10.2012 „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – - Kanalizace a ČOV“ Pobožní 667/78 186 00 Praha 8	Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 2.10.2012 divize Praha Dukelský boj 12 100 00 Praha 1, ČR IČ: 25055111	
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí Datum: 2.10.2012	Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 2.10.2012	

Za "ZSS": OK - j -
8/04/14

Rekapitulace				
--------------	--	--	--	--

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.50 vstupní čerpací stanice	doplňní stavební elektroinstalace	0,00 Kč	14 256,23 Kč	14 256,23 Kč
CELKEM		0,00 Kč	14 256,23 Kč	14 256,23 Kč

Stavební elektroinstalace

SO 1.50	Vstupní čerpací stanice
----------------	--------------------------------

SO 1.50	Nová rozvodnice RS
---------	--------------------

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			Rozvodnice na povrch IP65/36M, 12755	ks	1	1 868,53	1 868,53
			S201M-B10 (Jistič modulární 1P 10A char.B, 10kA, 440V)	ks	1	124,34	124,34
			Sada svorek a pomocný spojovací materiál	kpl	1	176,00	176,00
			Propojovací vodiče typu CYA, popisky a kabelové návlečky	kpl	1	440,00	440,00
			3558N-C01510 B (Spínač jednopólový IP 44 (1), ABB řada V)	ks	2	153,95	307,90
			RONDO bílá (předsazené stropní nebo nástěnné kruhové svítidlo)	ks	2	191,14	382,28
			CYKY-J 3x1,5	m	36	15,81	553,35
			CYKY-O 3x1,5 (3Ax1,5) (silový kabel 3x1,5mm dráty)	m	10	29,43	294,30
			LH 15x10 HA (kabelová lišta 15x10mm, 3m)	ks	5	17,05	85,25
			RD 9125 (Odbočná karabice 2,5 mm, 5 pól. Svorkovnice 2,5 m)	ks	2	354,82	709,64
			5518N-C02510 B (Zásuvka IP44, ABB řada Variant)	ks	1	154,64	154,64
			Montážní práce	sada	1	6 160,00	6 160,00
			Projektční činnost pro SO 1.50	sada	1	3 000,00	3 000,00

	14 256,23
--	-----------

Celkem SO 1.50	14 256,23
-----------------------	------------------

Celkem SO 1.50	14 256,23
-----------------------	------------------


Vyjádření projektanta ke změně

Podprojekt: 1B – ČOV
SO/PS: 1.50 – Čerpací stanice
Změna: Stavební elektro
Datum:

Vyjádření projektanta:

V projektu byl předpoklad ponechání skříně stávajícího elektrostatického rozváděče včetně původního vyzbrojení a jeho doplnění novou elektrickou výzbrojí. Po částečné demontáži tohoto rozváděče bylo zjištěno, že doplnění nové části rozváděče pro rekonstruované místnosti v soustavě TN-S není technicky proveditelné, neboť rozváděč vykazoval známky nadměrné koroze. Degradace zařízení pokročila od doby započetí projektových prací do takového stádia, že by byla ponecháním stávajících rozváděčů výrazně ohrožena životnost celého systému. Proto bylo rozhodnuto, že je nutné realizovat nový elektrostatický rozváděč včetně náhrady stávajícího vyzbrojení a doplnění o nové prvky dle původního projektu. Rozvodna bude mít tedy kompletně novou elektrostatickou instalaci. Tato instalace bude provedena v soustavě TN-S. Tuto novou elektroinstalaci je třeba napájet ze samostatné jističové skřínky, která se umístí do rozvodny. Totéž se týká i místnosti WC a předsíně WC. Nová instalace se tedy týká místností 05, 06, a 09.

4



Deník víceprací a méněprací

Stavba : Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV
Ucelená část 1B Čistírna odpadních vod

1) Objednatel:

jméno: TEPVOS, spol s r.o.
adresa: Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí
IČ: 25945793
DIČ: CZ 25945793
kontakt: Ing. Václav Knejp - 774 673 364
e-mail: knejp@tepvos.cz
zastoupená: Ing. Václavem Knejpem – jednatelem společnosti

2) Projektant:

jméno: Aqua Procon s.r.o.
adresa: Palackého tř. 12, 612 00 Brno
IČ:
DIČ:
kontakt: Ing. Daniel Kozický; Ing. Michal Ašer
e-mail:

3) Zhotovitel:

jméno: Sdružení pro stavbu Ústí nad Orlicí
adresa: SMP CZ a.s., VCES a.s., Hochtief CZ a.s., A.B.V. s.r.o.
IČ: Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6
DIČ: 271 951 47
kontakt: CZ 271 951 47
e-mail: p. Hána – Tel. 725v594 392
zastoupená: hana@smp.cz
Ing. Martin Doksanský, p. Bronislav Hána

4) Správce stavby:

jméno: d Plus projektová a inženýrská a.s.
adresa: Sokolovská 16/45, 186 00 Praha
kontakt: Ing. Ševčík – 723 780 763
e-mail:
zastoupená: Ing. Bohumil Ševčík



Zápis č. 1 – SO 1.69 – provozní budova

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Na základě skutečné skladby střešní konstrukce provozní budovy ČOV Ústí nad Orlicí, která nekoresponduje s původními podklady objednatele a tudíž i s projektovou dokumentací, je nezbytné provést nový návrh řešení střešní konstrukce.

Zhotovitel předloží revizi RPD a změnový list.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 2 – SO 1.69 – provozní budova

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Při bourání stávající dlažby bylo zjištěno, že lokální degradace podkladních vrstev je natolik rozsáhlá, že není možné jejich využití. Na některých místech naopak bylo spojení celé konstrukce takové, že nebylo možné jejich oddělení bez porušení stávající hydroizolace. Proto je nutné provést novou skladbu podlahy vč. hydroizolační vrstvy.

Současně s provedením podlahy bylo nezbytné provedení úpravy prahové části vrat vč. nájezdu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 3 – SO 1.52 – česlovna

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Při bourání stávající dlažby bylo zjištěno, že lokální degradace podkladních vrstev je natolik rozsáhlá, že není možné jejich využití. Na některých místech naopak bylo spojení celé konstrukce takové, že nebylo možné jejich oddělení bez porušení stávající hydroizolace. Proto je nutné provést novou skladbu podlahy vč. hydroizolační vrstvy.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 4 – SO 1.50, 1.52, 1.57, 1.60, 1.63, 1.69 – stavební elektro I. část

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Na základě zjištění pokročilé degradace stávajícího elektro vybavení různých SO, které mělo být dle PD ponecháno a pouze doplněno, bylo rozhodnuto, že musí být realizováno vystrojení zcela nové. Jeho zachování nebylo možné.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 5 – Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Po obnažení stávajícího potrubí bylo zjištěno, není možné provést napojení tak jak předpokládal projekt a bylo nutné využít jiného typu litinového potrubí.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 6 – SO 1.52 – Česlovna

Datum : 18/09/2012

Na žádost : Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatele byla provedena úprava ostění u vrat do česlovny. Zhotovitel předloží ZL kategorie 3 (Neuznatelný náklad)

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 7 – SO 1-50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Provedení nové omítky na ČS město nebylo možné ponechání původní omítky a pouze její doplnění, protože to její stav neumožňoval – budova by byla strukturně nesjednotitelná.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 8 – SO 1.64, 1.67, 1.55 – stavební elektro II. část

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Na základě zjištění pokročilé degradace stávajícího elektro vybavení různých SO, které mělo být dle PD ponecháno a pouze doplněno, bylo rozhodnuto, že musí být realizováno vystrojení zcela nové. Jeho zachování nebylo možné.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 8 – SO 1-57 – Dmýchárna

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Při bourání stávající dlažby bylo zjištěno, že lokální degradace podkladních vrstev je natolik rozsáhlá, že není možné jejich využití. Na některých místech naopak bylo spojení celé konstrukce takové, že nebylo možné jejich oddělení bez porušení stávající hydroizolace. Provedení hydroizolace a podkladního betonu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 9 – SO 1.64 – Budova kalového hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na žádost: zhotovitele

Přesun dveří rozvodny odvodnění kalu na vnější stěnu. Viz zápis s Tepvosem 17.4.2013.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 10 – SO 1-50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Provedení nových poklopů nad mokrou jímku ČS město. Stávající poklopy vykazovaly značnou degradaci.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 11 – SO 1.65 – Vyhnívací a uskladňovací nádrže

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Vzhledem k pokročilému stádiu degradace stávajícího koridoru k VN bylo nutno provést jeho opravu. Hrozilo zatékání do strojovny.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 12 – SO 1.65 – Vyhnívací a uskladňovací nádrže

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Po odkrytí stávajícího opláštění bylo zjištěno, že není možné užít stávajícího uchycení pro opláštění, proto bylo nutné provést novou nosnou konstrukci pro opláštění.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 13 – SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Doplnění stavebního elektra na ČS Město, které bylo v havarijním stavu a s jehož výměnou nebylo v rámci projektu počítáno (mělo být zachováno).

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 14 – SO 1.64 – Budova kalového hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele a objednatele

Na základě vyšší degradace obkladů stěn bylo nezbytné provést v místnostech 1.15 a části 1.12 obklad nad rámec předpokladu projektu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 15 – SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Provedení žebříku, který chyběl ve výkazu výměr (ale byl uveden na výkresech).

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 16 SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele a objednatele

S ohledem na pokročilou degradaci stávajícího stavu rampy na ČS město, která nebyla projektem řešena bylo rozhodnuto objednatelem o její rekonstrukci.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 17 – SO 1.66 – objekt BRO

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Změny ve stavební části vyplývající ze změny využití objektu BRO na garáže.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 18 – SO 1.65 – vyhnívací a uskladňovací nádrže

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Na základě změny platné legislativy řešící konstrukční návrhí hromosvodů, bylo nutné přepracovat koncepci ochrany VN a UN.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 19 – SO 1.69 - provozní budova

Datum : 07/03/2013

Na žádost : Objednatele

Na přání objednatele provedení čistící rohože před provozní budovou. Zhotovitel předloží ZL kategorie 3 (neuznatelný náklad)

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 20 – SO 1.81 – Dmýchárna

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu, bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijný stav, neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 21 – SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatele.

Realizace zabezpečovacího zařízení na ČS Město. Dle specifikace objednatele. Zhotovitel předloží ZL kategorie 3 (Neuznatelné náklady).

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 22 – SO 1.76 – Oplocení

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatele

Doplnění vstupní branky pro pěší, která nebyla projektem řešena. Dle specifikace objednatele. Zhotovitel předloží ZL kategorie 3 (Neuznatelné náklady).

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 23 – SO 1.57 – Dmychárna

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávajícího stavu dvou ramp a částí dveří u dmycháry, které nebyla projektem dotčena bylo rozhodnuto objednatelům o jejich rekonstrukci.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 24 – SO 1.60 – Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu, bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav, neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 25 – SO 1.64 – Budova kalového hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav, neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 26 – SO 1.63 – zahuštění kalů

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 27 – SO 1.72 – Propojovací potrubí a žlaby

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatel

Jedná se o výměnu zkorodovaného a nevyhovujícího zakrytí jímky na nátoky na ČOV vyplývající z požadavku pracovníce OIP a objednatele.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 28 – PS 04 – kalové hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatele

Na žádost objednatele došlo k nacenění doplnění šoupat před 4ks čerpadel recirkulace VN.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 30 – PS 04 – kalové hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatele

Na základě rozhodnutí objednatele nebude realizováno technologické vyzbrojení plánované pro linku BRO.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Datum	Denní záznamy stavby
12.2.2014	Počasí: oblačno +2; +6°C Pracovní doba: 12-11, 12-12 Stav: křižka, Holceček, Kantor, Veselý SSK = 3x HSK PSG THP: Fereňák HSV: Řezák, Šnola, Bureš, Peřka, Gamber, Najman, Obřihy VES THP: Broža HSV 'GxHSV', mechanizace, bariér, jízda Conel. Hamalčík, Palíčka, J. Váňa ASOS: montáž TIG - elektro Práce: SO 1.55: čerpání spodní vody 24h, dokončení, vložení armatury dla včetně dilatace. Provádění separace, vložení stěh Zápis zhotovitele Zadání "SSS" o provedení výkresu, bednění, lešení a d.l. práce na SO 1.55 - dle zadání o souhlas s belouškem SO 1.64: kompletní el. rozvoda číst 2 OK jin SO 1.52: vložení jističů plyn. sítě SO 1.60: betonování lustrů stěh 12.2.2014 Zápis zhotovitele I projekt dle ke změně - (více práce, méně práce) SO 1.50 - kompletní doplnění omítky - současně stáv. nevyhovující ponechat a doplnit původní omítky - k tomu zrealizovat omítky nové (vnější). Ohlasy - provedení nových podlah: 3ks nad mokrou jízdu → po obložení zjistit značení degradace Zěblík 23 - zěblík není ve výhledu výjezdu Iprava rampy - stavění správné rampy výhledu degradace na práci objednatel bude zrealizována. Zabezpečení realizace zabezpečovacího zvláště Doplnění stavebního plánu - stáv. sýla - havarijní stav, s výhledem nové v rámci projektu pod. káno Doplnění elektroinstalace: elektro výhledy nebylo možné zrealizovat (pohybující degradace) → realizace nové výhledu více SO 1.50 SO 1.52 SO 1.55 SO 1.57, SO 1.60, SO 1.63, SO 1.64, SO SO 1.65


Datum	Detaili zaznamy stavby
12.2.2014	SO 1.52 - Nová kpl. podlaha v číslone - viz bodu bylo zjištěno, že lokální degradace podtl. vstet je rozsáhlá, takže je nutné nově vytyčit na některých místech nově byla spojena celé lce betonové, že byly nově jept oddělené bez povolení stla izolace proveden hydroizolace a podtl. beton.
	oprava osleňovací na základě rozhodnutí objednatele byla provedena oprava osleňovací a vstet do rímsy
	SO 1.54 - na ptačím objektu, kde provedený sázení opravy dle Dž - zavezení jednotné, dle státního st.
	SO 1.55 - Stavba - ency - po vytyčení nadrž, že opat. podpočetem přijetí je vodorovná, která byla zobrazen prot. výstavby, nadrž toho bylo třeba nově pozměnit, které stavba, osleňovací objekt - nové kpl. stavba, zateplení, užití ve dne, dle společně, pod nové zateplení. dle, bude provedena separace vstet (act. pr.)
	SO 1.58 - Nová kpl. podlaha v dnyčce - viz podlaha číslo -
	oprava ramp a dveří odjezdů - na základě objednávky bude provedena rekonstrukce a dle zveřejněné degradace.
	oprava střechy - s ohledem na potrubí degradace střechy bylo rozhodnuto o provedení nové + realizace hospod.
	SO 1.60 - litinové potrubí - po obnovení stla. potrubí bylo zjištěno, že nově spojena, je podpočetem příje 1 a byla vstet vytyčena, je to typ litinového potrubí.
	oprava střechy - s ohledem na zveřejněnou degradaci, bylo rozhodnuto o provedení nové střechy.
	SO 1.63 - oprava střechy - viz SO 1.60

Datum	Denní záznamy stavby
12.2.2013	S01.63 - Na základě stav. zkušebního - po obdržení kec. stav. zkuš. zprávy, že má degradace umožňující jeho vyjmutí - dodat nového stěbo
	S01.64 - přesun - dle 1.14 (místnost) - na žádost objednatelů byl proveden přesun dle 1.14
	oprava střešy - vlivem degradace rozhodnuto o realizaci nové střešy včetně hromoskupu
	Doplňování kevanického obkladu nad vlnou pojezdu - na přísl. objednatel dostal k doplnění kec. obkladu v místnostech 1.15 a 1.12.
	Změna vyběpění - viz samostatný projekt
	Kovidou k VN - vzhledem k pokročilému stavu degradace stav. kec. k VN bylo nutné provést opravu hrozilo zatekáním do stropů
	S01.65 - oplocení VN - po obdržení stav. oplocení bylo zjištěno, že není možné užít stav. oplocení pro oplocení - bylo nutné provést nové kec. pro oplocení
	Změna koncepce hromoskupu na VN a VN - na základě plnění legislativní úpravy, konstrukční návrh hromoskupu, bylo nutné přepracovat koncept, ochrannou VN
	S01.66 - změna BRO na garáž - viz samostatný projekt. Změna BRO na garáž - stavba, část bez elektro - závěry ve stavbě, část, uplatňující se změny vzhledu objektu BRO na garáž
	S01.67 - kosa lpl. podlahy - po obdržení podkladních učin stav. podlahy bylo zjištěno, že je potřeba provést kompletní rekonstrukci celé střešy podlahy
	Úprava prahu garážových vjezdů - na žádost objednatelů bylo provedeno upravení vjezdů do vjezdu čistí provoz. stádku
	Čistící vohoz - na přísl. objednatelů provedena čistící vohoz přel. vstupu - do budovy

Datum	Deník záměrných stavby
12.2.2014	Střecha provoz budovy - změna provedení střechy na prac. bod.
	SO172: podlahy a náklady na cív - výměna zhotoveného a nevyhovujícího zhotoví jímky na náklady vyplývající z požadavků pracovníků OPA o objednatel.
	Aopojení grav. zat. stěn a odvodnění - na základě vzhledu k objednatel bude realizováno propojení vzhledu z nábřeží do potrubí k 9 vedle na odvodnění, kde by mohlo být i další náklady poselbina.
	SO 1.76 - doplnění vstupní branky - doplnění vstupní branky pro pěší, která byla projektována - vizum.
	PS04 - viz zápis ze dne 7.2.2014 - doplnění zápatí a zpevnění klopky.
	Nerealizace linky BRO - tech. část - na základě požadavků objednatel nebude realizováno technologické vybavení plánované pro linku BRO.
13-02-14	ZÁPIS "ZS":
	VE DNECH 30-01-14 a 13-02-14 PROBEHLY ZJIŠŤOVACÍ OBCHODNÍKY NĚKTERÝCH SO. OBJEKTOŮ ZA ÚČASTI OBJEDNATELE, ZHOTOVITELE A "ZS". Z NĚCH VÝPLÝVAJÍCÍ "ZÁVADY" SOUPOČTENOVANÝ V PROJEKTOVÁNÍ:
C.1	30/01/14 - SO's: SO 1.72 SO 1.51 SO 1.52 SO 1.53 SO 1.54
C.2	13/02/14 - SO's: SO 1.55 SO 1.60 SO 1.61 (1961) SO 1.63.
	ZHOTOVITEL ZREALIZUJE VEŠKERÉ NOVOE NÁPRÁVNE PRÁCE V SO KILSKRÁŽI 130206 LNOSTE
	J. SKARPIŠEK

Fotodokumentace



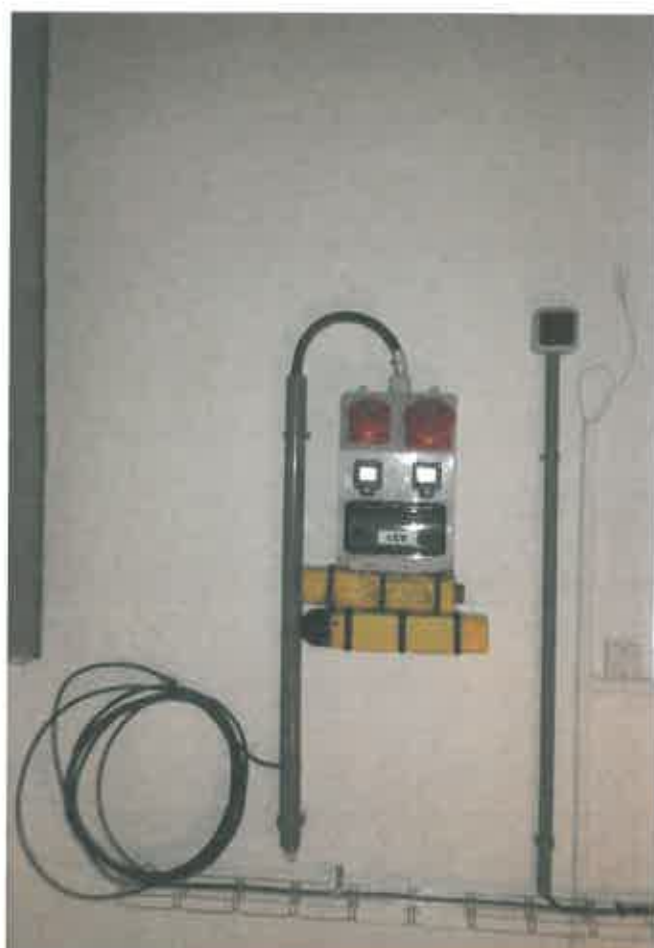

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “		
Změnový list		č.
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY		ZL č.1B-04
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum:
Odesláno/	předáno:	
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.50 – vstupní čerpací stanice
Odkazy:	na specifikaci:	RDS
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny
	na jinou část smlouvy:	
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:		
Důvod změny: Rozdíl mezi ZDS a RDS		
Popis změny:		
V projektu byl předpoklad ponechání skříně stávajícího elektrostavebního rozvaděče včetně původního vystrojení a jeho doplnění novou elektrickou výzbrojí. Po částečné demontáži tohoto rozvaděče bylo zjištěno, že doplnění nové části rozvaděče pro rekonstruované místnosti v soustavě TN-S není technicky proveditelné, neboť rozvaděč vykazoval známky nadměrné koroze. Proto bylo rozhodnuto, že je nutné realizovat nový elektrostavební rozvaděč včetně náhrady stávajícího vyzbrojení a doplnění o nové prvky dle původního projektu. Rozvodna bude mít tedy kompletně novou elektrostavební instalaci. Tato instalace bude provedena v soustavě TN-S.		
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny: Vícepráce 14 256,23 Kč Méněpráce 0,00 Kč Celkem 14 256,23 Kč 2) Fotodokumentace		
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “		
<i>Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.</i>		
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.		
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí <i>„Sdružení pro Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“</i> Datum: <i>22. 7. 2014</i> Pobřeží 667/78 186 00 Praha 8	Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí AQUA PROCON s.r.o. divize Praha Dukelských hrdinů 12 170 00 Praha 7, ČR DIČ: CZ46964371 Datum: <i>2014</i>	
Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí Datum: <i>2014</i>	Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí TEPVOS, spol. s r.o. Třeboušská 18 582 03 Ústí nad Orlicí IČ: 25245792 DIČ: CZ25945792 Datum: <i>2014</i>	

Souhlasí se "ZL": *[Signature]*

Rekapitulace				
--------------	--	--	--	--

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.50 vstupní čerpací stanice	doplnění stavební elektroinstalace	0,00 Kč	14 256,23 Kč	14 256,23 Kč
CELKEM		0,00 Kč	14 256,23 Kč	14 256,23 Kč

Stavební elektroinstalace

SO 1.50			Vstupní čerpací stanice				
SO 1.50			Nová rozvodnice R5				
Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			Rozvodnice na povrch IP65/36M, 12755	ks	1	1 868,53	1 868,53
			S201M-B10 (Jistič modulární 1P f0A char.B, 10kA, 440V)	ks	1	124,34	124,34
			Sada svorek a pomocný spojovací materiál	kpl	1	176,00	176,00
			Propojevací vodiče typu CYA, popisky a kabelové návlečky	kpl	1	440,00	440,00
			3558N-C01510 B (Spínač jednopólový IP 44 (1), ABB řada V)	ks	2	153,95	307,90
			RONDO bílá (předsazené stropní nebo nástěnné kruhové svidlo)	ks	2	191,14	382,28
			CYKY-J 3x1,5	m	35	15,81	553,35
			CYKY-O 3x1,5 (3Ax1,5) (sílový kabel 3x1,5mm dráty)	m	10	29,43	294,30
			LH 15x10 HA (kabelové lišta 15x10mm, 3m)	ks	5	17,06	85,25
			RD 9125 (Odbočná karbice 2,5 mm, 5 pól. Svorkovnice 2,5 m)	ks	2	354,82	709,64
			5518N-C02510 B (Zásuvka IP44, ABB řada Variant)	ks	1	154,84	154,84
			Montážní práce	sada	1	6 160,00	6 160,00
			Projekční činnost pro SO 1.50	sada	1	3 000,00	3 000,00
							14 256,23
Celkem SO 1.50							14 256,23

Fotodokumentace

