

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                            |            |
| Změnový list č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                            | č.         |
| Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                            | ZL č.1B-47 |
| Komu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TEPVOS, spol. s r.o.   | Datum:                                                                                                                                                     | 17.3.2014  |
| Odesláno/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | předáno:               |                                                                                                                                                            |            |
| Stavební objekt (provozní soubor):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | SO 1.64 Budova kalového hospodářství                                                                                                                       |            |
| Odkazy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | na specifikaci:        | RDS                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | na výkresy:            | Projektová dokumentace změny RDS                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | na rozp. podklady:     | Výkaz výměr změny – kalkulace změny                                                                                                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | na jinou část smlouvy: |                                                                                                                                                            |            |
| <b>ZMĚNA – popis změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                            |            |
| <b>Popis změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                            |            |
| Na základě ohledání aktuálního stavu před započítím realizace dílčích prací bylo zjištěno že:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                            |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Degradace částí stávajících obkladů, které měly být v rámci projektu zachovány, dostoupila takové míry, kdy není efektivní jejich zachování a doplňování. Proto bylo rozhodnuto o jejich odstranění a nahrazení novými obklady a výmalbami.</li> <li>Při tvorbě zadávací dokumentace stavby nebylo možno specifikovat konkrétní typy jednotlivých strojních zařízení, ale pouze parametry, které jimi musí být splněny. Po konkretizaci jednotlivých zařízení v rámci realizačního stupně projektové dokumentace bylo nutno přistoupit k dílčím úpravám rozměrových parametrů betonových fundamentů, na kterých jsou zařízení uložena a tras potrubí.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                            |            |
| Součástí oznámení změny je:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                            |            |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rekapitulace kalkulace</li> <li>2) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny – úpravy v objektu</li> <li>3) Dokumentace RDS – SO 1.64 – zakres změny</li> <li>4) Stanovisko HIP</li> <li>5) Zápis v deníku více / méně prací a stavebním deníku</li> <li>6) Fotodokumentace</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                            |            |
| Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                            |            |
| Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                            |            |
| Vyjádření dotčených:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                            |            |
| Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí<br>„Sdružení pro Ústí nad Orlicí –<br>Kanalizace a ČOV“<br>Datum: 17.3.2014<br>Pobřežní 667/78<br>186 00 Praha 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí<br>AQUA<br>PROCON<br>Datum: 17.3.2014<br>divize Praha<br>Dukelských hrdů 152<br>170 00 Praha 7, ČR<br>DIČ: CZ4696437 |            |
| Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí<br>ÚSTÍ NAD ORLICÍ<br>Datum: 17.3.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí<br>TEPVOS, spol. s r.o.<br>Tržborská 237<br>552 03 Ústí nad Orlicí<br>Datum: 17.3.2014                               |            |

souhlasí "2014": /

|                     |
|---------------------|
| <b>Rekapitulace</b> |
|---------------------|

| Název SO                             | Popis kalkulace  | Méněpráce | Vícepráce     | Cena celkem   |
|--------------------------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|
| SO 1.64 Budova kalového hospodářství | Úpravy v objektu | 0,00 Kč   | 573 115,00 Kč | 573 115,00 Kč |
| CELKEM                               |                  | 0,00 Kč   | 573 115,00 Kč | 573 115,00 Kč |

| Kód položky            |    | Objekt  | Popis                                             | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|------------------------|----|---------|---------------------------------------------------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1.                     | 2. | 3.      | 5.                                                | 6. | 5.              | 6.                     | 7.                  |
|                        | -  | SO 1.64 | SO 1.64 BUDOVA KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ              |    |                 |                        | 673 115,00          |
|                        | 1B | SO 1.64 | Vícepráce                                         |    |                 |                        | 673 115,00          |
| SO 1.64                | vp | SO 1.64 | Úprava místnosti 1.12                             |    |                 |                        | 381 375,72          |
| dle SoD - 1.69 - 96126 | vp | SO 1.64 | Bourání obkladu                                   | m2 | 57,040          | 283,30                 | 16 159,43           |
| dle SoD - 1.64 - 61101 | vp | SO 1.64 | Omítka vnitřní                                    | m2 | 43,740          | 489,50                 | 21 410,73           |
| dle SoD - 1.69 - 78101 | vp | SO 1.64 | Obklad keramický                                  | m2 | 56,130          | 862,50                 | 48 412,13           |
| dle SoD - 1.69 - 96107 | vp | SO 1.64 | Bourání keramické dlažby                          | m2 | 109,116         | 283,30                 | 30 912,56           |
| dle SoD - 1.52 - 96104 | vp | SO 1.64 | Vybourání podkladního betonu                      | m3 | 8,608           | 3 489,70               | 30 037,94           |
| dle SoD - 1.64 - 71102 | vp | SO 1.64 | Izolace proti vlhkosti                            | m2 | 139,068         | 278,60                 | 38 744,34           |
| dle SoD - 1.67 - 35103 | vp | SO 1.64 | Pokladní beton (prostý beton)                     | m2 | 11,062          | 6 791,70               | 75 131,14           |
| dle SoD - 1.69 - 77101 | vp | SO 1.64 | Keramická dlažba                                  | m2 | 110,622         | 1 054,90               | 116 695,15          |
| dle SoD - 1.64 - 76709 | vp | SO 1.64 | Dodání a osazení válcovaných profilů na práh vrat | kg | 41,690          | 92,88                  | 3 872,29            |
| SO 1.64                | vp | SO 1.64 | Úprava místnosti 1.13                             |    |                 |                        | 104 983,54          |
| dle SoD - 1.69 - 96126 | vp | SO 1.64 | Bourání obkladu                                   | m2 | 25,900          | 283,30                 | 7 337,47            |
| dle SoD - 1.64 - 61101 | vp | SO 1.64 | Omítka vnitřní                                    | m2 | 25,900          | 489,50                 | 12 678,05           |
| dle SoD - 1.67 - 35103 | vp | SO 1.64 | Pokladní beton (prostý beton)                     | m2 | 1,368           | 6 791,70               | 9 291,05            |
| dle SoD - 1.69 - 77101 | vp | SO 1.64 | Keramická dlažba                                  | m2 | 36,320          | 1 054,90               | 38 313,97           |
| dle SoD - 1.63 - 62103 | vp | SO 1.64 | Nový sokl, včetně odstranění stávajícího soklu    | m  | 23,160          | 1 433,10               | 33 190,60           |
| dle SoD - 1.63 - 78401 | vp | SO 1.64 | Malba vnitřní                                     | m  | 18,870          | 50,40                  | 951,05              |
| dle SoD - 1.64 - 62104 | vp | SO 1.64 | Nátěr vně                                         | m  | 4,800           | 451,10                 | 2 165,28            |
| dle SoD - 1.64 - 76709 | vp | SO 1.64 | Dodání a osazení válcovaných profilů na práh vrat | kg | 11,370          | 92,88                  | 1 056,08            |
| SO 1.64                | vp | SO 1.64 | Úprava místnosti 1.14                             |    |                 |                        | 31 000,92           |
| dle SoD - 1.69 - 96107 | vp | SO 1.64 | Bourání keramické dlažby                          | m2 | 15,990          | 283,30                 | 4 529,97            |
| dle SoD - 1.52 - 96104 | vp | SO 1.64 | Vybourání podkladního betonu                      | m3 | 1,599           | 3 489,70               | 5 580,03            |
| dle SoD - 1.64 - 71102 | vp | SO 1.64 | Izolace proti vlhkosti                            | m2 | 21,450          | 278,60                 | 5 975,97            |
| dle SoD - 1.67 - 35103 | vp | SO 1.64 | Pokladní beton (prostý beton)                     | m2 | 2,145           | 6 791,70               | 14 568,20           |
| dle SoD - 1.63 - 78401 | vp | SO 1.64 | Malba vnitřní                                     | m  | 6,880           | 50,40                  | 346,75              |
| SO 1.64                | vp | SO 1.64 | Úprava místnosti 1.15                             |    |                 |                        | 55 754,82           |
| dle SoD - 1.69 - 96126 | vp | SO 1.64 | Bourání obkladu                                   | m2 | 7,075           | 283,30                 | 2 004,35            |
| dle SoD - 1.64 - 61101 | vp | SO 1.64 | Omítka vnitřní                                    | m2 | 7,075           | 489,50                 | 3 463,21            |
| dle SoD - 1.69 - 78101 | vp | SO 1.64 | Obklad keramický                                  | m2 | 23,438          | 862,50                 | 20 214,84           |
| dle SoD - 1.69 - 96107 | vp | SO 1.64 | Bourání keramické dlažby                          | m2 | 7,215           | 283,30                 | 2 044,01            |
| dle SoD - 1.52 - 96104 | vp | SO 1.64 | Vybourání podkladního betonu                      | m3 | 0,722           | 3 489,70               | 2 517,82            |
| dle SoD - 1.64 - 71102 | vp | SO 1.64 | Izolace proti vlhkosti                            | m2 | 12,675          | 278,60                 | 3 531,26            |
| dle SoD - 1.67 - 35103 | vp | SO 1.64 | Pokladní beton (prostý beton)                     | m2 | 1,268           | 6 791,70               | 8 608,48            |
| dle SoD - 1.69 - 77101 | vp | SO 1.64 | Keramická dlažba                                  | m2 | 12,675          | 1 054,90               | 13 370,86           |

## ČPRAVA NÍSTNOSTI 112

### BOURÁNÍ OBLOUČU:

$$(10,8 + 0,85 + 9,08 + 0,85 + 10,8) \times 1,75 - (1,2 \times 3) \times 0,25 + (1,2 \times 0,25 \times 3) + \\ + (0,25 \times 0,25 \times 6) = 56,665 - 0,9 + 0,9 + 0,375 = 57,04 \text{ m}^2$$

### ONÍTKA V HITEHÍ:

$$(0,25 + 9,25 + 0,85 + 9,08 + 0,6 + 0,75 + 3,4 + 0,6) \times 1,75 - (1,2 \times 3) \times 0,25 + (1,2 \times 0,25 \times 3) + \\ + (0,25 \times 0,25 \times 6) = 43,365 - 0,9 + 0,9 + 0,375 = 43,74 \text{ m}^2$$

### BRÁD KERNICKÝ:

$$43,74 \text{ m}^2 + (9,08 - 2) \times 1,75 = 56,13$$

### BOURÁNÍ KERNICKÉ DŘEVÍ:

$$9,08 \times 14,6 - \cancel{0,4 \times 6,4 \times 4} - 1,4 \times 7,45 \times 2 - 0,46 \times 1,35 \times 2 = 132,568 - 20,86 - 2,542 = \\ = 109,116 \text{ m}^2$$

### VYBOURÁNÍ BETONU:

$$109,116 - 4 \times 0,9 \times 6,4 = 86,076 \text{ m}^2 \cdot 0,1 = 8,6076 \text{ m}^3$$

### ROUCE PROTÍ VLIHĚMÍ:

$$9,08 \times 14,6 + (1 + 4 + 4 + 3 + 1) \times 0,5 = 132,568 + 6,5 = 139,068 \text{ m}^2$$

### PODMADNÍ BETON: ROUSTÍ BETON

$$5,14,4 \times 9,08 - 4 \times 0,9 \times 6,4 - 0,5 \times 6,5 - 0,34 \times 1 = 134,752 - 23,04 - 3,25 - 0,34 + 6,5 = \\ = 110,622 \times 0,1 = 11,0622 \text{ m}^3$$

### KERNICKÉ DŘEVÍ:

$$110,622 \text{ m}^2$$

## Č PRAVA NÍSTNOSTI 1.13

### BOURÁNÍ ODKUDU

$$(4,35 + 3 + 3,1 + 4,35) \times 1,75 = 25,9 \text{ m}^2$$

### OMÍTKA VHNĚNÍ:

$$25,9 \text{ m}^2$$

### BETON PRŮSTŘÍ

$$2 \times 4,35 \times 1,4 \times 2 + 0,5 \times 3 \times 0,1 = 1,218 + 0,15 = 1,368$$

### DVĚŘE

$$4 \times 9,08 = 36,32 \text{ m}^2$$

### KOVÍ SKLÍ

$$0,5 + 9,08 + 4 + 9,08 + 0,5 = 23,16 \text{ m}$$

### PAZBA VHNĚNÍ

$$(\cancel{23,16 - 3}) \times 1,7 = (0,5 + 0,5 + 4 + 3 + 3,1) \times 1,7 = 18,87 \text{ m}^2$$

### PAZBY FASADY

$$0,5 \times (3 + 3,3,2) = 4,8 \text{ m}^2$$

### DODÁNÍ A OSAZENÍ VALL. PROFILŮ NA PRAM VĚST:

$$3 \times 4 + 5 = 3 \text{ m} \times 3,79 = 11,37 \text{ kg}$$

## ÚPRAVA NÍSTHOŠTI 1.14

BOJOVÁNÍ DŘEV

$$3,9 \times (1,55 + 2,55) = 15,49$$

UBOJOVÁNÍ BETONU :

$$15,49 \times 0,1 = 1,549$$

IZOLACE PROTÍ VLNOSTI.

$$3,9 \times 5,5 = 21,45 \text{ m}^2$$

BETON PROSTŘÍ

$$21,45 \times 0,1 = 2,145 \text{ m}^2$$

MAŠTÍ VYHŘÁNÍ

$$\overset{3,9}{\cancel{3}} \times 1,7 + (0,25 \times 0,25 \times 4) = \overset{6,61}{\cancel{6,6}} + 0,25 = \overset{6,86}{\cancel{7,4}} \text{ m}^2$$

## ÚPRAVA NÍŠTOSTI 1.15

BOURNÍ OBYADU:

$$3,9 \times 1,75 + 0,25 \times 0,25 \times 4 = 6,825 + 0,25 = 7,075 \text{ m}^2$$

CHÍTA CHÍTĚNÍ:

$$7,075 \text{ m}^2$$

OBYLAD KSKANICUN :

$$7,075 + (3,25 + 3,9 + 1,1 + 1,1) \times 1,75 = 7,075 + 16,3625 = 23,4375 \text{ m}^2$$

ČÍMÍ OUBĚNÍ:

$$3,9 \times 3,25 - 3,9 \times 1,4 = 12,675 - 5,46 = 7,215 \text{ m}^2$$

ZOVČ PĚTÍ ULHČOŠTÍ

$$3,9 \times 3,25 = 12,675 \text{ m}^2$$

BOURNÍ BETON:

$$7,215 \times 0,1 = 0,7215$$

BETON PROŠTÍ :

$$12,675 \times 0,1 = 1,2675 \text{ m}^2$$


KSKANICUN DUBĚNÁ

$$12,675 \text{ m}^2$$

## LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV - II. ČÁST:



výřákový systém B.p.v. ±0,000 = 328,70

[illegible]

| LEGENDA MÍSTNOSTÍ A PROSTOR |                 | POTVÁŽKA |                         |
|-----------------------------|-----------------|----------|-------------------------|
| ČÍSLO MÍSTNOSTI             | NÁZEV MÍSTNOSTI | PODLAŽÍ  | PROSTOR                 |
| 1,12                        | NOVÝ VÝCHOVATEL | 1.12     | PROSTOR PRO VÝCHOVATELE |
| 1,13                        | NOVÝ ŽÁK        | 1.13     | PROSTOR PRO ŽÁKY        |
| 1,14                        | NOVÝ VÝCHOVATEL | 1.14     | PROSTOR PRO VÝCHOVATELE |
| 1,15                        | NOVÝ ŽÁK        | 1.15     | PROSTOR PRO ŽÁKY        |

[illegible][illegible]

Architectural floor plan of the 'BRO' object, showing a long, narrow building with multiple rooms, corridors, and a central staircase. The plan includes dimensions, room numbers, and a title block at the bottom left.

**OBJEKT "BRO"**  
**VIZ VÝKR. SO 1.66**

Architectural floor plan of the 'BRO' object, showing a long, narrow building with multiple rooms, corridors, and a central staircase. The plan includes dimensions, room numbers, and a title block at the bottom left.

[illegible]

This architectural drawing shows a side elevation of a building. The structure features a gabled roof with a prominent ridge. A large, multi-paned window is located on the left side of the facade. To the right of this window is a smaller, single-paned window. The drawing includes detailed structural elements such as the roof trusses, wall framing, and window frames. Annotations and dimensions are present throughout the drawing, including a vertical dimension of 12'0" on the right side and various smaller measurements and notes in different parts of the drawing.

Podvaky + Stěh

REZ.DIG

**51** **OPERAČNÝ PROGRAM VĚDA, VÝVOJ A INOVACE**  
Opatření 1.1.1. Podpora výzkumu, vývoje a inovací  
podle specifické výzvy MŠMT pro období 2014–2020  
Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro konkurenceschopnost  
a zaměstnanost – I. specifická výzva

**ČISTOPIŠ - 04. 08. 2012**

|                                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                                      | <b>HYDROPROJEKT CZ</b><br>HYDROPROJEKT S.R.O.<br>110 00 Praha 1, Na Příkopě 11, IČO: 252 20 112<br>Tel.: +420 224 311 111, Fax: +420 224 311 112<br>E-mail: hydro@hydroprojekt.cz<br>www.hydroprojekt.cz |                                                                                                      | <b>SWEGOS</b><br>SWEGOS S.p.A.<br>37030 Montebelluna (TV) Italy<br>Tel.: +39 0422 864111, Fax: +39 0422 864112<br>E-mail: info@swegos.com<br>www.swegos.com |                                                                                                      |
| Project: <b>ÚSTI NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV</b><br>18. CRPČKA OPRAVYCH VOD<br>BOLAŘ - Budova technické hospodářství<br>1. úseková vnitřní kanalizace    |                                                                                                      | Prg. 01/01<br>1. úseková vnitřní kanalizace<br>Technická na č. 1864/1, I. úseková vnitřní kanalizace                                                                                                     |                                                                                                      | Prg. 01/01<br>1. úseková vnitřní kanalizace<br>Technická na č. 1864/1, I. úseková vnitřní kanalizace                                                        |                                                                                                      |
| Author: <b>SWEGOS</b><br>Designer: <b>SWEGOS</b><br>Engineer: <b>SWEGOS</b><br>Contractor: <b>SWEGOS</b><br>Approved: <b>SWEGOS</b><br>Date: <b>SWEGOS</b> | Prg. 01/01<br>1. úseková vnitřní kanalizace<br>Technická na č. 1864/1, I. úseková vnitřní kanalizace | Prg. 01/01<br>1. úseková vnitřní kanalizace<br>Technická na č. 1864/1, I. úseková vnitřní kanalizace                                                                                                     | Prg. 01/01<br>1. úseková vnitřní kanalizace<br>Technická na č. 1864/1, I. úseková vnitřní kanalizace | Prg. 01/01<br>1. úseková vnitřní kanalizace<br>Technická na č. 1864/1, I. úseková vnitřní kanalizace                                                        | Prg. 01/01<br>1. úseková vnitřní kanalizace<br>Technická na č. 1864/1, I. úseková vnitřní kanalizace |


## Vyjádření projektanta ke změně

**Podprojekt:** 1B – ČOV  
**SO/PS:** SO 1.64 Budova kalového hospodářství  
**Změna:** Úprava v objektu  
**Datum:**

### Vyjádření projektanta:

Na základě ohledání aktuálního stavu před započítím realizace dílčích prací bylo zjištěno že:

- Degradace částí stávajících obkladů, které měly být v rámci projektu zachovány, dostoupila takové míry, kdy není efektivní jejich zachování a doplňování. Proto bylo rozhodnuto o jejich odstranění a nahrazení novými obklady a výmalbami.
- Při tvorbě zadávací dokumentace stavby nebylo možno specifikovat konkrétní typy jednotlivých strojních zařízení, ale pouze parametry, které jimi musí být splněny. Po konkretizaci jednotlivých zařízení v rámci realizačního stupně projektové dokumentace bylo nutno přistoupit k dílčím úpravám rozměrových parametrů betonových fundamentů, na kterých jsou zařízení uložena a tras potrubí.



## **Deník víceprací a méněprací**

**Stavba : Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV**  
**Ucelená část 1B Čistírna odpadních vod**

**1) Objednatel:**

jméno: TEPVOS, spol s r.o.  
adresa: Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí  
IČ: 25945793  
DIČ: CZ 25945793  
kontakt: Ing. Václav Knejp - 774 673 364  
e-mail: knejp@tepvos.cz  
zastoupená: Ing. Václavem Knejpem – jednatelem společnosti

**2) Projektant:**

jméno: Aqua Procon s.r.o.  
adresa: Palackého tř. 12, 612 00 Brno  
IČ:  
DIČ:  
kontakt: Ing. Daniel Kozický; Ing. Michal Ašer  
e-mail:

**3) Zhotovitel:**

jméno: Sdružení pro stavbu Ústí nad Orlicí  
adresa: SMP CZ a.s., VCES a.s., Hochtief CZ a.s., A.B.V. s.r.o.  
IČ: Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6  
DIČ: 271 951 47  
kontakt: CZ 271 951 47  
e-mail: p. Hána – Tel. 725v594 392  
zastoupená: hana@smp.cz  
Ing. Martin Doksanský, p. Bronislav Hána

**4) Správce stavby:**

jméno: d Plus projektová a inženýrská a.s.  
adresa: Sokolovská 16/45, 186 00 Praha  
kontakt: Ing. Ševčík – 723 780 763  
e-mail:  
zastoupená: Ing. Bohumil Ševčík

Zápis č. 1 – SO 1.69 – provozní budova

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Na základě skutečné skladby střešní konstrukce provozní budovy ČOV Ústí nad Orlicí, která nekorresponduje s původními podklady objednatele a tudíž i s projektovou dokumentací, je nezbytné provést nový návrh řešení střešní konstrukce.

Zhotovitel předloží revizi RPD a změnový list.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 2 – SO 1.69 – provozní budova

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Při bourání stávající dlažby bylo zjištěno, že lokální degradace podkladních vrstev je natolik rozsáhlá, že není možné jejich využití. Na některých místech naopak bylo spojení celé konstrukce takové, že nebylo možné jejich oddělení bez porušení stávající hydroizolace. Proto je nutné provést novou skladbu podlahy vč. hydroizolační vrstvy.

Současně s provedením podlahy bylo nezbytné provedení úpravy prahové části vrat vč. nájezdu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 3 – SO 1.52 – česlovna

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Při bourání stávající dlažby bylo zjištěno, že lokální degradace podkladních vrstev je natolik rozsáhlá, že není možné jejich využití. Na některých místech naopak bylo spojení celé konstrukce takové, že nebylo možné jejich oddělení bez porušení stávající hydroizolace. Proto je nutné provést novou skladbu podlahy vč. hydroizolační vrstvy.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 4 – SO 1.50, 1.52, 1.57, 1.60, 1.63, 1.69 – stavební elektro I. část

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Na základě zjištění pokročilé degradace stávajícího elektro vybavení různých SO, které mělo být dle PD ponecháno a pouze doplněno, bylo rozhodnuto, že musí být realizováno vystrojení zcela nové. Jeho zachování nebylo možné.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 5 – Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Po obnazení stávajícího potrubí bylo zjištěno, není možné provést napojení tak jak předpokládal projekt a bylo nutné využít jiného typu litinového potrubí.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 6 – SO 1.52 – Česlovna

Datum : 18/09/2012

Na žádost : Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatele byla provedena úprava ostění u vrat do česlovny. Zhotovitel předloží ZL kategorie 3 (Neuznatelný náklad)

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 7 – SO 1-50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Provedení nové omítky na ČS město nebylo možné ponechání původní omítky a pouze její doplnění, protože to její stav neumožňoval – budova by byla strukturně nesjednotitelná.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 8 – SO 1.64, 1.67, 1.55 – stavební elektro II. část

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Na základě zjištění pokročilé degradace stávajícího elektro vybavení různých SO, které mělo být dle PD ponecháno a pouze doplněno, bylo rozhodnuto, že musí být realizováno vystrojení zcela nové. Jeho zachování nebylo možné.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 8 – SO 1-57 – Dmýchárna

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Při bourání stávající dlažby bylo zjištěno, že lokální degradace podkladních vrstev je natolik rozsáhlá, že není možné jejich využití. Na některých místech naopak bylo spojení celé konstrukce takové, že nebylo možné jejich oddělení bez porušení stávající hydroizolace. Provedení hydroizolace a podkladního betonu.

Za objednatele :  
p. KnejpZa správce stavby :  
p. ŠevčíkZa zhotovitele :  
p. Pavlič

Zápis č. 9 – SO 1.64 – Budova kalového hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Přesun dveří rozvodny odvodnění kalu na vnější stěnu. Viz zápis s Tepvosem 17.4.2013.

Za objednatele :  
p. KnejpZa správce stavby :  
p. ŠevčíkZa zhotovitele :  
p. Pavlič

Zápis č. 10 – SO 1-50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Provedení nových poklopů nad mokrou jímku ČS město. Stávající poklopy vykazovaly značnou degradaci.

Za objednatele :  
p. KnejpZa správce stavby :  
p. ŠevčíkZa zhotovitele :  
p. Pavlič

Zápis č. 11 – SO 1.65 – Vyhnivací a uskladňovací nádrže

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Vzhledem k pokročilému stádiu degradace stávajícího koridoru k VN bylo nutno provést jeho opravu. Hrozilo zatékání do strojovny.

Za objednatele :  
p. KnejpZa správce stavby :  
p. ŠevčíkZa zhotovitele :  
p. Pavlič

Zápis č. 12 – SO 1.65 – Vyhnivací a uskladňovací nádrže

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Po odkrytí stávajícího opláštění bylo zjištěno, že není možné užít stávajícího uchycení pro opláštění, proto bylo nutné provést novou nosnou konstrukci pro opláštění.

Za objednatele :  
p. KnejpZa správce stavby :  
p. ŠevčíkZa zhotovitele :  
p. Pavlič

Zápis č. 13 – SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Doplnění stavebního elektra na ČS Město, které bylo v havarijním stavu a s jehož výměnou nebylo v rámci projektu počítáno (mělo být zachováno).

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 14 – SO 1.64 – Budova kalového hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele a objednatele

Na základě vyšší degradace obkladů stěn bylo nezbytné provést v místnostech 1.15 a části 1.12 obklad nad rámec předpokladu projektu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 15 – SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Provedení žebříku, který chyběl ve výkazu výměr (ale byl uveden na výkresech).

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 16 SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele a objednatele

S ohledem na pokročilou degradaci stávajícího stavu rampy na ČS město, která nebyla projektem řešena bylo rozhodnuto objednatelem o její rekonstrukci.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 17 – SO 1.66 – objekt BRO

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Změny ve stavební části vyplývající ze změny využití objektu BRO na garáže.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 18 – SO 1.65 – vyhnívací a uskladňovací nádrže

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Na základě změny platné legislativy řešící konstrukční návrhí hromosvodů, bylo nutné přepracovat koncepci ochrany VN a UN.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 19 – SO 1.69 - provozní budova

Datum : 07/03/2013

Na žádost : Objednatele

Na přání objednatele provedení čistící rohože před provozní budovou. Zhotovitel předloží ZL kategorie 3 (neuznatelný náklad)

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 20 – SO 1.81 – Dmýchárna

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu, bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav, neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 21 – SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatele.

Realizace zabezpečovacího zařízení na ČS Město. Dle specifikace objednatele. Zhotovitel předloží ZL kategorie 3 (Neuznatelné náklady).

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 22 – SO 1.76 – Oplocení

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatele

Doplnění vstupní branky pro pěší, která nebyla projektem řešena. Dle specifikace objednatele. Zhotovitel předloží ZL kategorie 3 (Neuznatelné náklady).

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 23 – SO 1.57 – Dmychárna

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávajícího stavu dvou ramp a částí dveří u dmychárny, které nebyla projektem dotčena bylo rozhodnuto objednatelem o jejich rekonstrukci.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 24 – SO 1.60 – Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu, bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav, neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 25 – SO 1.64 – Budova kalového hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav, neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 26 – SO 1.63 – zahuštění kalů

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 27 – SO 1.72 – Propojovací potrubí a žlaby

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatel

Jedná se o výměnu zkorodovaného a nevyhovujícího zakrytí jímky na nátok na ČOV vyplývající z požadavku pracovníce OIP a objednatele.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 28 – PS 04 – kalové hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatele

Na žádost objednatele došlo k nacenění doplnění šoupat před 4ks čerpadel recirkulace VN.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 30 – PS 04 – kalové hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatele

Na základě rozhodnutí objednatele nebude realizováno technologické vstrojení plánované pro linku BRO.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 31 – PS 04 – doplnění zpětné klapky

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Z důvodu zvýšení ochrany výměníku tepla voda – kal bylo navrženo doplnění zpětné klapky DN 150 na potrubní větev 4.64 (výtlačné potrubí ohřevu a přečerpávání kalu), která zajistí oddělení výtlačku čerpadel 4.05 osazených v zahuštění kalu od výměníku. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :  
p. Knejp

Za správce stavby :  
p. Ševčík

Za zhotovitele :  
p. Pavlič

Zápis č. 32 – SO 1.72 – propojení gravitačního zahuštění a odvodnění

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatele o zachování stávající nádrže zahuštění kalu je nutné provést napojení odtahu kalu z této nádrže do nově budovaného potrubí K9 (odtah kalu na odvodnění). Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :  
p. Knejp

Za správce stavby :  
p. Ševčík

Za zhotovitele :  
p. Pavlič

Zápis č. 33 – SO 1.63 – nový žlab stávajícího zahuštění kalu

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Po otryskání konstrukce stávajícího žlabu bylo zjištěno, že míra degradace neumožňuje jeho opětovné využití. Objednatel rozhodl o výměně stávajícího žlabu za nový. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :  
p. Knejp

Za správce stavby :  
p. Ševčík

Za zhotovitele :  
p. Pavlič

Zápis č. 34 – SO 1.64 – změna vytápění

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Při tvorbě zadávací dokumentace stavby nebylo možno specifikovat konkrétní typy jednotlivých strojních zařízení, ale pouze parametry, které jimi musí být splněny. Po konkretizaci jednotlivých zařízení v rámci realizačního stupně projektové dokumentace bylo nutno přistoupit k dílčím úpravám řešení části vytápění. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :  
p. Knejp

Za správce stavby :  
p. Ševčík

Za zhotovitele :  
p. Pavlič

Zápis č. 35 – SO 1.57 – nový hromosvod dmychárny

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Z důvodu kompletně nově zrealizované střechy na objektu (viz zápis č. 20), bylo nutno přistoupit též k realizaci nového hromosvodu. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 36 – SO 1.64 – nový hromosvod kalového hospodářství

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Z důvodu kompletně nově zrealizované střechy na objektu (viz zápis č. 25), bylo nutno přistoupit též k realizaci nového hromosvodu. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 37 – PS 05 – Nerealizace linky BRO

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatele nerealizovat linku BRO, došlo ke změně užívání stávajícího objektu. Zhotovitel předloží revizi PD a návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 38 – PS 05 – Oprava plynojemu

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

V době realizace zadávací dokumentace stavby byl plynojem v plném provozu, a proto nemohlo dojít k prohlídce všech jeho součástí. Po odstavení stávajícího plynojemu bylo zjištěno, že dochází k zasekávání plovoucího stropu v krajních polohách, způsobené špatnou funkcí teleskopu. Pro bezvadnou funkci plynojemu je nutné provést opravu teleskopu. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 39 – SO 1.55 – Stavební změny na objektu regenerace

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Po vyčištění stávající nádrže bylo zjištěno, že má tato nádrže rozdílné řešení systému zábrany proti vyplavání nádrže. Místo pouhého využití studen kolem nádrže, je nádrž vybavena vztlačovými ventily

umožňujícími pronikání vody spodní vody do nádrže v době jejího odstavení z provozu. Tyto skutečnosti nebyly dostatečně zachyceny v dokumentaci skutečného provedení původní stavby a z důvodu plného provozu v době tvorby zadávací dokumentace nebylo možno zjistit skutečný stav ani při prohlídkách stavby. Na základě těchto zjištěných informací je nutno navrhnout i pozměněné řešení stavební části objektu – utěsnění prostupů, jímací studny, řešení dilatací, celoplošná hydroizolace, zatěsnění a čerpaní vody. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :  
p. Knejp

Za správce stavby :  
p. Ševčík

Za zhotovitele :  
p. Pavlíč

Zápis č. 40 – SO 1.64 – Úprava vnitřních prostor objektu

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatele

Na základě ohledání aktuálního stavu před započatím realizace dílčích prací bylo zjištěno že:

- Degradace částí stávajících obkladů, které měly být v rámci projektu zachovány, dostoupila takové míry, kdy není efektivní jejich zachování a doplňování. Proto bylo rozhodnuto o jejich odstranění a nahrazení novými obklady a výmalbami.
- Při tvorbě zadávací dokumentace stavby nebylo možno specifikovat konkrétní typy jednotlivých strojních zařízení, ale pouze parametry, které jimi musí být splněny. Po konkretizaci jednotlivých zařízení v rámci realizačního stupně projektové dokumentace bylo nutno přistoupit k dílčím úpravám rozměrových parametrů betonových fundamentů, na kterých jsou zařízení uložena a tras potrubí.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :  
p. Knejp

Za správce stavby :  
p. Ševčík

Za zhotovitele :  
p. Pavlíč

Zápis č. 41 – SO 1.72 – Změna trasy potrubí O6

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatele


Při výkopových pracích bylo zjištěno, že sklolaminátové potrubí odtoku vyčištěné vody z dosazovací nádrže O6 není možno položit v zamýšlené trase z důvodu výškové kolize se stávajícím potrubím z ČS kalu a shlukem kabelových vedení jdoucím kolem tohoto potrubí. Poloha těchto stávajících konstrukcí nekorespondovala s údaji uvedenými v dokumentaci skutečného provedení původní stavby. Bylo rozhodnuto o změně části trasy potrubí O6, které bylo prodlouženo a doplněno o dvě kolena 90°. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :  
p. Knejp

Za správce stavby :  
p. Ševčík

Za zhotovitele :  
p. Pavlíč

## **Fotodokumentace**

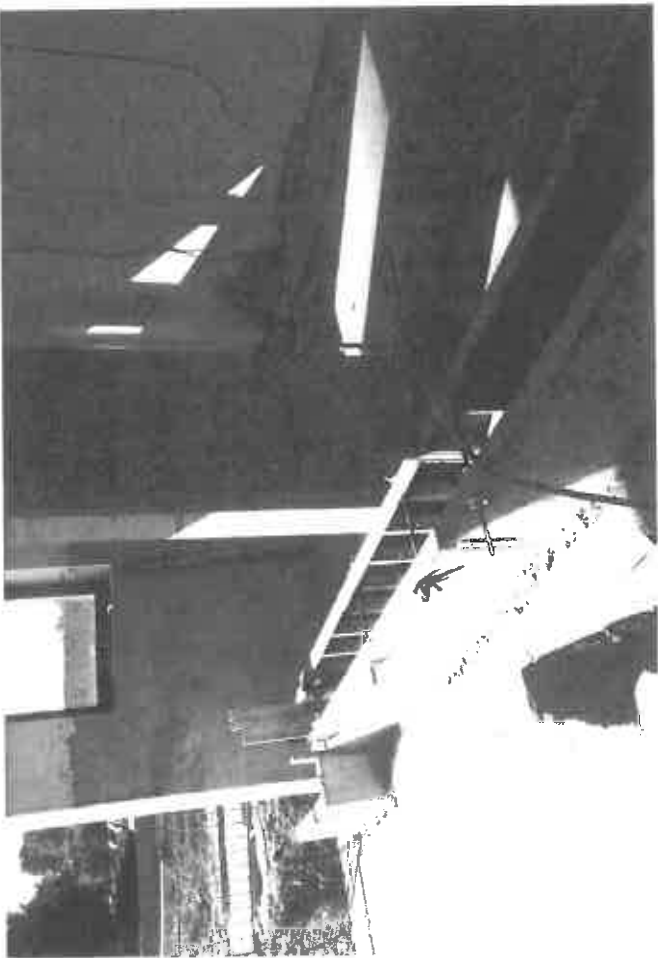

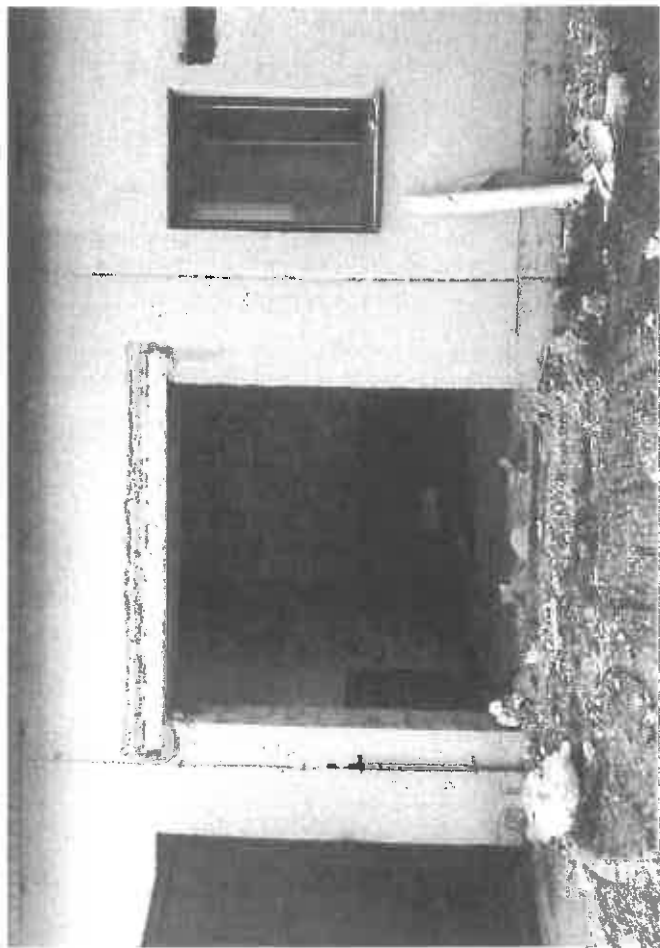

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                               |                                                                       |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| <b>Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                               |                                                                       |                   |  |
| <b>Změnový list</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                               |                                                                       | <b>č.</b>         |  |
| <b>Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                               |                                                                       | <b>ZL č.1B-47</b> |  |
| <b>Komu:</b> TEPVOS, spol. s r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                               | <b>Datum:</b>                                                         |                   |  |
| <b>Odesláno/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>předáno:</b>                                               |                                                                       |                   |  |
| <b>Stavební objekt (provozní soubor):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                               | SO 1.64 Budova kalového hospodářství                                  |                   |  |
| <b>Odkazy:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>na specifikaci:</b> RDS                                    |                                                                       |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>na výkresy:</b> Projektová dokumentace změny RDS           |                                                                       |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>na rozp. podklady:</b> Výkaz výměr změny – kalkulace změny |                                                                       |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>na jinou část smlouvy:</b>                                 |                                                                       |                   |  |
| <b>ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                               |                                                                       |                   |  |
| <b>Důvod změny:</b> Rozdíl mezi ZDS a RDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                               |                                                                       |                   |  |
| <b>Popis změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                               |                                                                       |                   |  |
| Na základě ohledání aktuálního stavu před započítáním realizace dílčích prací bylo zjištěno že:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                               |                                                                       |                   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Degradace částí stávajících obkladů, které měly být v rámci projektu zachovány, dostoupila takové míry, kdy není efektivní jejich zachování a doplňování. Proto bylo rozhodnuto o jejich odstranění a nahrazení novými obklady a výmalbami.</li> <li>Při tvorbě zadávací dokumentace stavby nebylo možno specifikovat konkrétní typy jednotlivých strojních zařízení, ale pouze parametry, které jimi musí být splněny. Po konkretizaci jednotlivých zařízení v rámci realizačního stupně projektové dokumentace bylo nutno přistoupit k dílčím úpravám rozměrových parametrů betonových fundamentů, na kterých jsou zařízení uložena a tras potrubí.</li> </ul> |  |                                                               |                                                                       |                   |  |
| Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                               |                                                                       |                   |  |
| Vícepráce 573 115,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                               |                                                                       |                   |  |
| Méněpráce 0,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                               |                                                                       |                   |  |
| <b>Celkem 573 115,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                               |                                                                       |                   |  |
| 2) Fotodokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                               |                                                                       |                   |  |
| <b>Oznámení vydává:</b> Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                               |                                                                       |                   |  |
| Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                               |                                                                       |                   |  |
| Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                               |                                                                       |                   |  |
| Vyjádření dotčených:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                               |                                                                       |                   |  |
| <b>Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí</b><br>28. 07 2014<br>Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                               | <b>Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí</b><br>28. 07 2014<br>Datum: |                   |  |
| <b>Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí</b><br>28. 07 2014<br>Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                               | <b>Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí</b><br>28. 07 2014<br>Datum: |                   |  |

Souhlas se "ZL" : 

|              |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|
| Rekapitulace |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|

| Název SO                             | Popis kalkulace  | Méněpráce | Vícepráce     | Cena celkem   |
|--------------------------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|
| SO 1.64 Budova kalového hospodářství | Úpravy v objektu | 0,00 Kč   | 573 115,00 Kč | 573 115,00 Kč |
| CELKEM                               |                  | 0,00 Kč   | 573 115,00 Kč | 573 115,00 Kč |

| Kód položky            |    | Objekt  | Popis                                             | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|------------------------|----|---------|---------------------------------------------------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1.                     | 2. | 3.      | 5.                                                | 6. | 5.              | 6.                     | 7.                  |
|                        | -  | SO 1.64 | SO 1.64 BUDOVA KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ              |    |                 |                        | 573 115,00          |
|                        | 1B | SO 1.64 | Vícepráce                                         |    |                 |                        | 573 115,00          |
| SO 1.64                | vp | SO 1.64 | Úprava místnosti 1.12                             |    |                 |                        | 381 375,72          |
| dle SoD - 1.69 - 96126 | vp | SO 1.64 | Bourání obkladu                                   | m2 | 57,040          | 283,30                 | 16 159,43           |
| dle SoD - 1.64 - 61101 | vp | SO 1.64 | Omitka vnitřní                                    | m2 | 43,740          | 489,50                 | 21 410,73           |
| dle SoD - 1.69 - 78101 | vp | SO 1.64 | Obklad keramický                                  | m2 | 56,130          | 862,50                 | 48 412,13           |
| dle SoD - 1.69 - 96107 | vp | SO 1.64 | Bourání keramické dlažby                          | m2 | 109,116         | 283,30                 | 30 912,56           |
| dle SoD - 1.52 - 96104 | vp | SO 1.64 | Vybourání podkladního betonu                      | m3 | 8,608           | 3 489,70               | 30 037,94           |
| dle SoD - 1.64 - 71102 | vp | SO 1.64 | Izolace proti vlhkosti                            | m2 | 139,068         | 278,60                 | 38 744,34           |
| dle SoD - 1.67 - 35103 | vp | SO 1.64 | Pokladní beton (prostý beton)                     | m2 | 11,062          | 6 791,70               | 75 131,14           |
| dle SoD - 1.69 - 77101 | vp | SO 1.64 | Keramická dlažba                                  | m2 | 110,622         | 1 054,90               | 116 695,15          |
| dle SoD - 1.64 - 76709 | vp | SO 1.64 | Dodání a osazení válcovaných profilů na práh vrat | kg | 41,690          | 92,88                  | 3 872,29            |
| SO 1.64                | vp | SO 1.64 | Úprava místnosti 1.13                             |    |                 |                        | 104 983,54          |
| dle SoD - 1.69 - 96126 | vp | SO 1.64 | Bourání obkladu                                   | m2 | 25,900          | 283,30                 | 7 337,47            |
| dle SoD - 1.64 - 61101 | vp | SO 1.64 | Omitka vnitřní                                    | m2 | 25,900          | 489,50                 | 12 678,05           |
| dle SoD - 1.67 - 35103 | vp | SO 1.64 | Pokladní beton (prostý beton)                     | m2 | 1,368           | 6 791,70               | 9 291,05            |
| dle SoD - 1.69 - 77101 | vp | SO 1.64 | Keramická dlažba                                  | m2 | 36,320          | 1 054,90               | 38 313,97           |
| dle SoD - 1.63 - 62103 | vp | SO 1.64 | Nový sokl, včetně odstranění stávajícího soklu    | m  | 23,160          | 1 433,10               | 33 190,60           |
| dle SoD - 1.63 - 78401 | vp | SO 1.64 | Malba vnitřní                                     | m  | 18,870          | 50,40                  | 951,05              |
| dle SoD - 1.64 - 62104 | vp | SO 1.64 | Nátěr vně                                         | m  | 4,800           | 451,10                 | 2 165,28            |
| dle SoD - 1.64 - 76709 | vp | SO 1.64 | Dodání a osazení válcovaných profilů na práh vrat | kg | 11,370          | 92,88                  | 1 056,08            |
| SO 1.64                | vp | SO 1.64 | Úprava místnosti 1.14                             |    |                 |                        | 31 000,92           |
| dle SoD - 1.69 - 96107 | vp | SO 1.64 | Bourání keramické dlažby                          | m2 | 15,990          | 283,30                 | 4 529,97            |
| dle SoD - 1.52 - 96104 | vp | SO 1.64 | Vybourání podkladního betonu                      | m3 | 1,599           | 3 489,70               | 5 580,03            |
| dle SoD - 1.64 - 71102 | vp | SO 1.64 | Izolace proti vlhkosti                            | m2 | 21,450          | 278,60                 | 5 975,97            |
| dle SoD - 1.67 - 35103 | vp | SO 1.64 | Pokladní beton (prostý beton)                     | m2 | 2,145           | 6 791,70               | 14 568,20           |
| dle SoD - 1.63 - 78401 | vp | SO 1.64 | Malba vnitřní                                     | m  | 6,880           | 50,40                  | 346,75              |
| SO 1.64                | vp | SO 1.64 | Úprava místnosti 1.15                             |    |                 |                        | 55 754,82           |
| dle SoD - 1.69 - 96126 | vp | SO 1.64 | Bourání obkladu                                   | m2 | 7,075           | 283,30                 | 2 004,35            |
| dle SoD - 1.64 - 61101 | vp | SO 1.64 | Omitka vnitřní                                    | m2 | 7,075           | 489,50                 | 3 463,21            |
| dle SoD - 1.69 - 78101 | vp | SO 1.64 | Obklad keramický                                  | m2 | 23,438          | 862,50                 | 20 214,84           |
| dle SoD - 1.69 - 96107 | vp | SO 1.64 | Bourání keramické dlažby                          | m2 | 7,215           | 283,30                 | 2 044,01            |
| dle SoD - 1.52 - 96104 | vp | SO 1.64 | Vybourání podkladního betonu                      | m3 | 0,722           | 3 489,70               | 2 517,82            |
| dle SoD - 1.64 - 71102 | vp | SO 1.64 | Izolace proti vlhkosti                            | m2 | 12,675          | 278,60                 | 3 531,26            |
| dle SoD - 1.67 - 35103 | vp | SO 1.64 | Pokladní beton (prostý beton)                     | m2 | 1,268           | 6 791,70               | 8 608,48            |
| dle SoD - 1.69 - 77101 | vp | SO 1.64 | Keramická dlažba                                  | m2 | 12,675          | 1 054,90               | 13 370,86           |

## **Fotodokumentace**

