

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		ZL č. 1A-68	
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY			
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum: 21.5.2013	
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.40 – ČS7	
Odkazy:	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny - RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny: Popis změny: přesun rozvaděče RE k ČS7. Součástí oznámení změny je: 1) Zápis v DVMP 2) Stanovisko projektanta 3) Zákres změn v RDS 4) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny = plus 15 831,88 Kč bez DPH			
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – - Kanalizace a ČOV“ Datum: 21.5.2013 Pobřežní 667/78 186 00 Praha 8		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí AQUA PROCON s.r.o. divize Praha Dvorských hradů 12 170 00 Praha 7, ČR DIČ: CZ46954371 Datum: 21.5.2013	
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí : Datum: 21.5.2013 ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí TEPVOS, spol. s r.o. Třebovská 257 602 00 Brno - předměstí Datum: 21.5.2013	

d plus - projektová a inženýrská s.s.
 Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc

Od: Kujal Martin
Odesláno: 14. května 2014 16:23
Komu: Hruskova Petra
Předmět: změnový list 68

Přeposílám vyjádření projektanta ke změnovému listu ZL 1A-68.

S pozdravem

Martin Kujal
stavbyvedoucí
HOCHTIEF CZ a.s.
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
divize Pozemní stavby Čechy
Mobil:+420 725 573 224
e-mail:martin.kujal@hochtief.cz
www.hochtief.cz

From: Bahor Sana [<mailto:Sana.Bahor@praha.aquaprocon.cz>]
Sent: Wednesday, February 20, 2013 11:04 AM
To: Kujal Martin; Karel Pražák
Subject: FW: Kanalizace Ústí n.O., přípojka nn pro ČS7 Kerhartice

Dobrý den,
Přeposílám vyjádření projektanta elektro ohledně posunutí rozváděče u ČS7.
S. Bahor

From: Ing. Daniel Hajzler [<mailto:dhajzler@seznam.cz>]
Sent: Wednesday, February 20, 2013 11:02 AM
To: Bahor Sana
Subject: Kanalizace Ústí n.O., přípojka nn pro ČS7 Kerhartice

Dobrý den,
na základě Vaší žádosti Vám sděluji, že ČEZ obecně požaduje umístění měření co nejbližší odběrnému bodu. Po konzultaci s pracovníkem ČEZu p. Kovaříkem je možné v tomto případě umístit elektroměrový pilíř RE7 k rozváděči RM7 umístěného přímo u ČS7. Napájecí vedení od sloupu bude provedeno kabelem AYKY 4x16, případně CYKY 4x10. Délka trasy 60m, hl. jistič před elektroměrem B16/3, příkon ČS 1x1.5kW, soudobý příkon 1.5kW.

S pozdravem

ing. Daniel Hajzler
projekce elektro
Sedliště 31
570 01 Litomyšl
tel. 776 113 299
mail: dhajzler@seznam.cz

VENÍK +/- STAVBY NOVÝM - KANALIZACE A ČOV

STR. 1

66. UČS 1A - SO 1.10 STOLY N23, N24

14.5.2013

NA POKYN OBJEDNATELE

NA ZÁKLADĚ ZMĚNY STATISTIK MÍSTNÍ KOMUNIKACE
"ZA VODOU" - ZVÝŠENÍ TONÁŽE PŘÍJEZDOVOSTI UOBÍDEL
JE NEZBYTNÉ PROVEST OSAZENÍ POKLOPŮ ČINOSNOSTI
D 400.

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ ZL

ZA OBJEDNATELE

P. KNEŽP

ZA SPŠ

P. ŠEVOŤE

ZA ZHOTOVITEL

P. PAVLOV

67. UČS 1A - SO 1.60 PŘÍPOJKA NA UČS 07

14.5.2013

POKYN OBJEDNATELE

NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ OBJEDNATELE A ZMĚNY
PARCEL PŘÍPOJNEHO MÍSTA BUDE ELEKTROTEČNÝ
PILÍŘ UMÍSTĚN UČS 7.

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ ZL.

ZA OBJEDNATELE


P. KNEŽP

ZA SPŠ

P. ŠEVOŤE

ZA ZHOTOVITEL

P. PAVLOV





„Sdružení pro Ústí nad Orlicí-kanalizace a ČOV“
Pan Bronislav Hána
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8

Datum: 14.05.2013
 Vyřizuje: Ing. Sana Bahor, 737 206 974

Věc : Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV
1A – Ústí nad Orlicí - kanalizace
Stanovisko projektanta k ZL1A-68
SO 1.40 – Přípojka NN k ČS7

Vážený pane,

na základě Vašeho požadavku Vám sdělujeme stanovisko projektanta ke změnovému listu č. 1A-68. Po zpracování ZDS a RDS bylo zjištěno, že z hlediska provozování bude výhodnější umístit pilíř RE7 u rozváděče RM7 umístěného přímo u ČS7. Přesun elektroměrového pilíře RE7 k rozváděči RM7 neodporoval požadavkům ČEZ. Změnou umístění pilíře dojde k prodloužení přípojky NN k ČS7 o 60m, použít bude kabel CYKY 4BX10. Dále bude provedena chránička PVC DN100 v délce 60m. Výše uvedenou skutečnost nemohl projektant v době zpracování ZDS předvídat.

Z výše uvedených důvodů se změnovým listem č. 1A-68 souhlasíme.

S pozdravem

Ing. Daniel Kozický
 Vě
 Bahor

Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
 Palackého tř. 12, 612 00 Brno
 Tel.: +420 541 426 011
 fax: +420 541 426 012
 e-mail: info@aquaprocon.cz

Divize Praha





AQUA PROCON s.r.o.
 Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha
 Tel.: +420 220 879 819
 fax: +420 226 712 140
 e-mail: info.praha@aquaprocon.cz

IČ: 46964371

DIČ: CZ46964371





Brno-venkov č. ú.: 24301-641/0100

Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

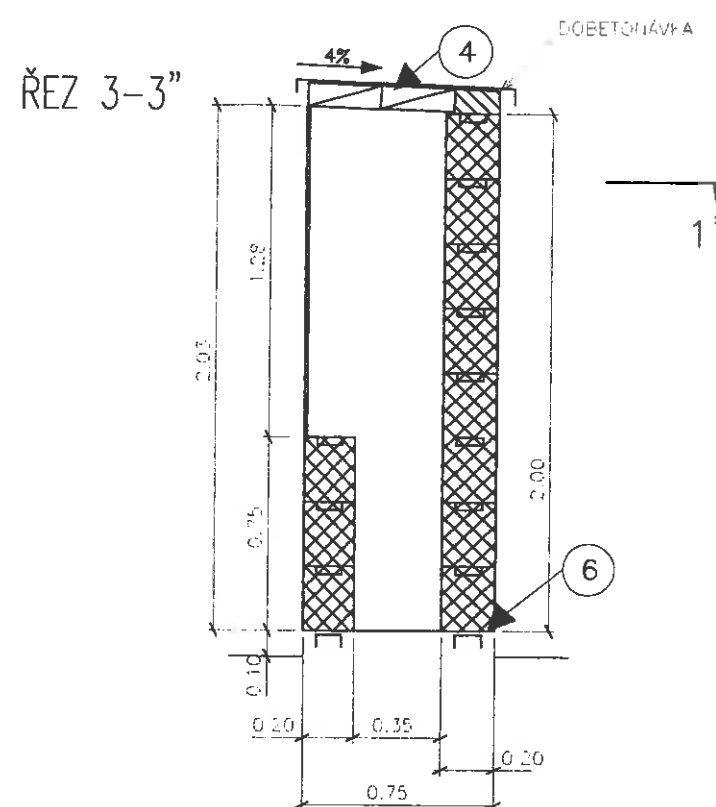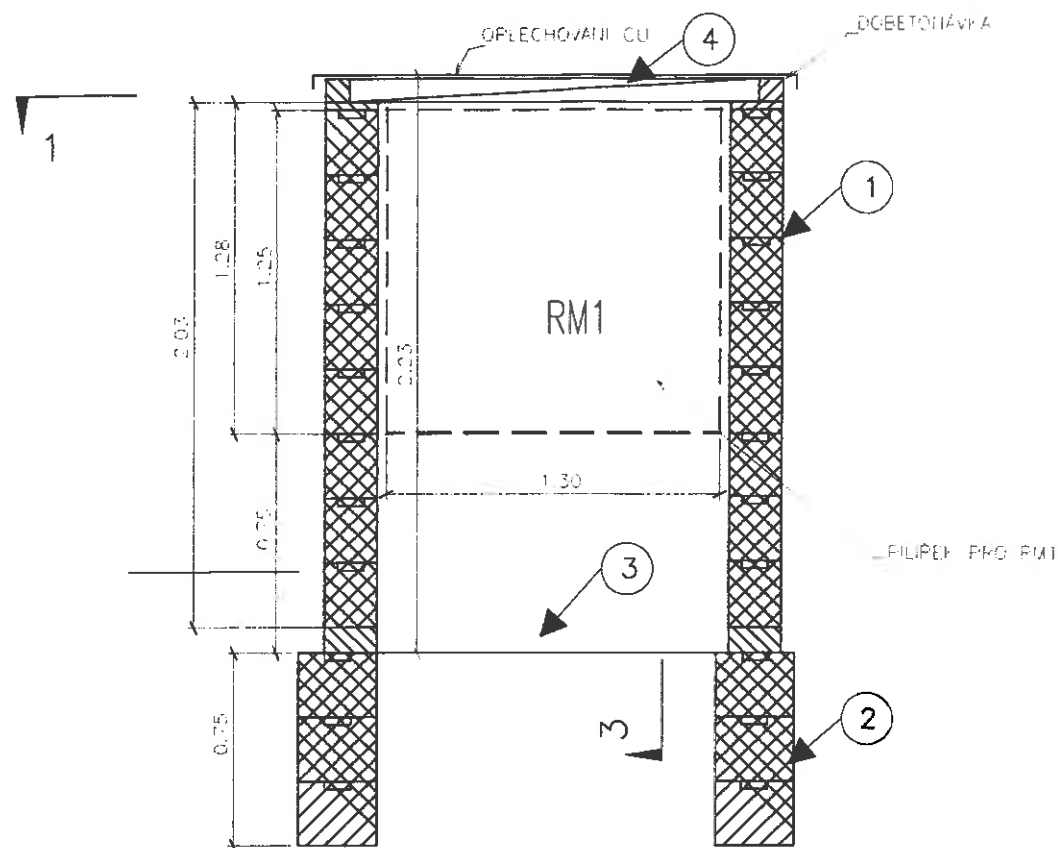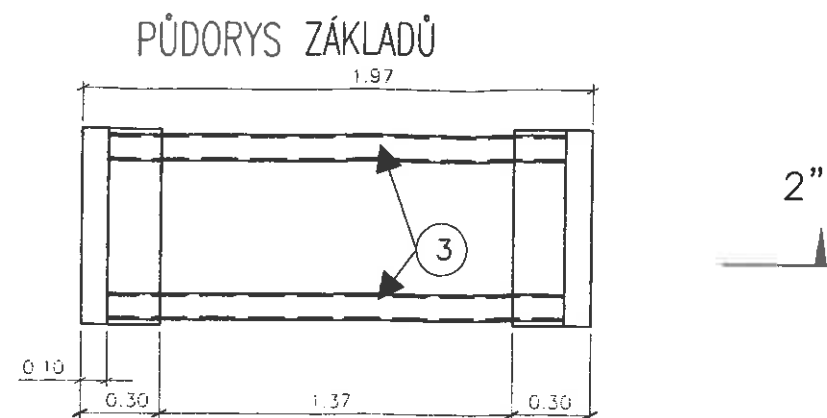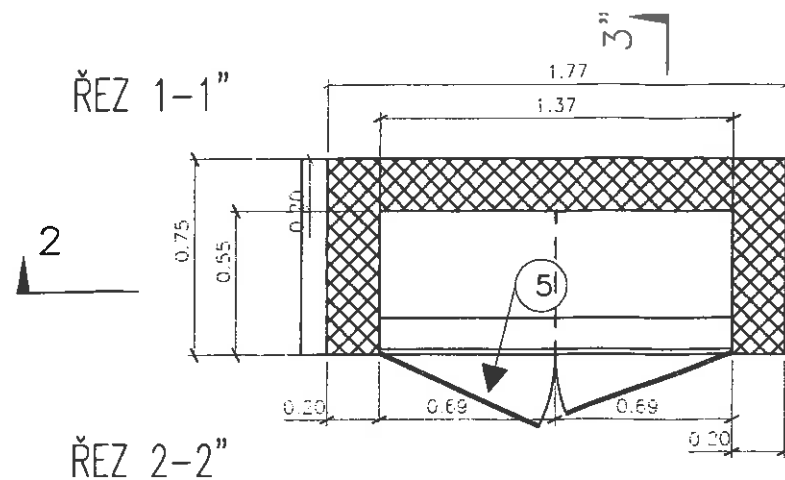


Ozn.	Popis
1	zdivo z tvarovek z prostého vibrolisovaného betonu tl. 200 mm se záhlvkou betonem C 8/10 a svislým proarmováním
2	zdivo z tvarovek z prostého vibrolisovaného betonu tl. 300 mm se záhlvkou betonem C 8/10 a svislým proarmováním
3	tyč tvarovaná U 100x50x2480 – 2 ks
4	stropní deska vylehčená PZD 149/29/9 V3 – 2 ks
5	ocelová dvířka 1200x1125 s rámem (dvoukřídlé)
6	hydroizolační pás MIDA BASE GS 4

AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost - divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 106 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz		Datum revize: _____ Schválil: _____
Vedoucí projektu: Ing. Radovan Hákon CSc. Vedoucí projektu: Ing. Denisa Kozák Odpovědný projektant: Ing. Martina Kozáková, Ing. František Právec Vypracoval: Michal Kostron Kontroloval: Ing. Radovan Hákon CSc. Investor: Těpov spol. s r.o., Třebosická 287, Ústí nad Orlicí Objednatel: Těpov spol. s r.o., Třebosická 287, Ústí nad Orlicí	Projekt: 1206208-18 Služba: ZDS Datum: 06/2010 Soubor: příloha RM.dwg Tiskový soubor: X0060_HP.000 Formát: 3 x A4 Měřítko: 1:25 Průběh: 5.2-3.43-9	Podpis: _____ Pečeť: _____
ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV 3 DLOUHÁ TŘEBOVÁ - KANALIZACE SO, PS SO 3.43 ČERPAČI STANICE SEVER - ELEKTROINSTALACE PŘÍKLAD PROVEDENÍ PÍLIŘKU RM		

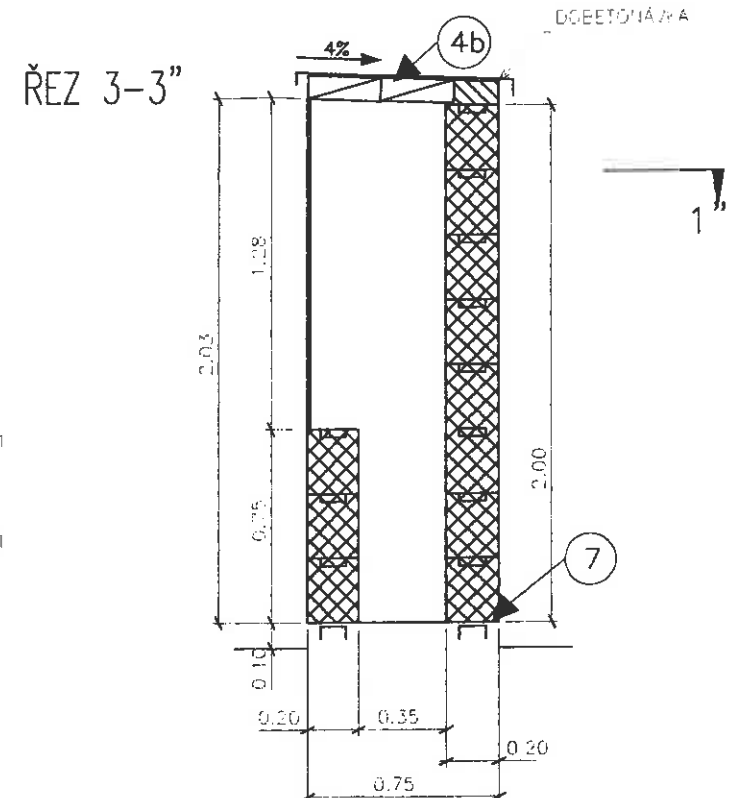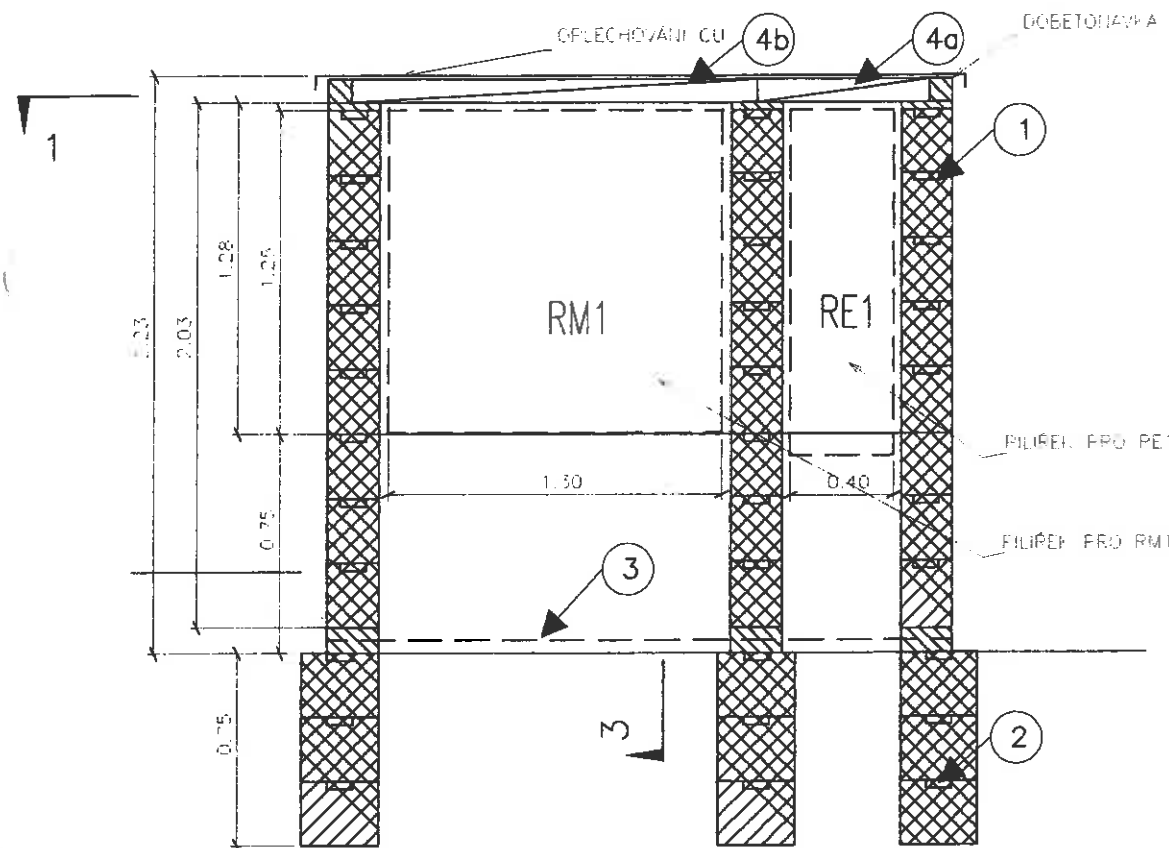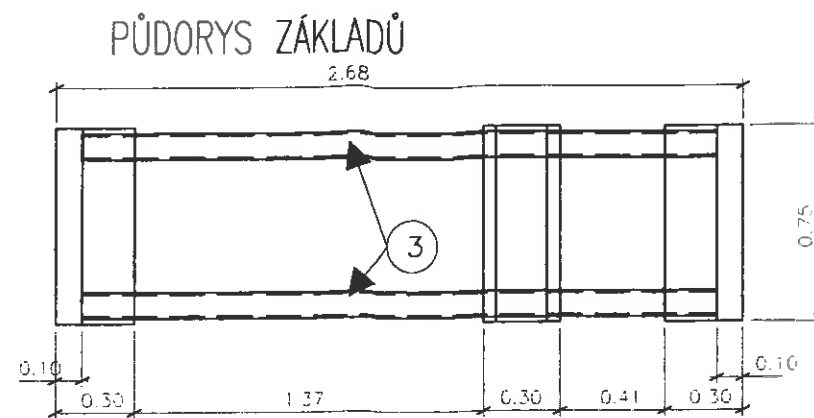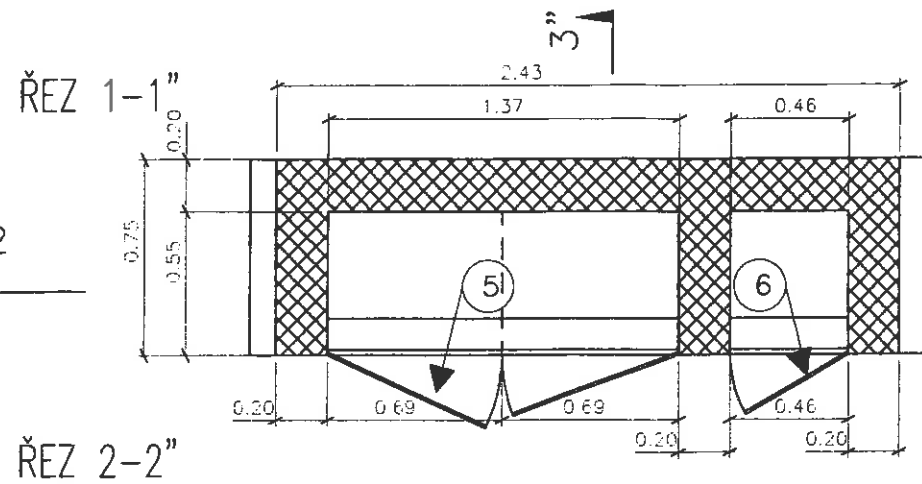

Ozn.	Popis
1	zdivo z tvarovek z prostého vibrolisovaného betonu tl. 200 mm se zdlivkou betonem C 8/10 a svislým proarmováním
2	zdivo z tvarovek z prostého vibrolisovaného betonu tl. 300 mm se zdlivkou betonem C 8/10 a svislým proarmováním
3	tyč tvarovaná U 100x50x2480 – 2 ks
4a	stropní deska vylehčená PZD 59/29/9 V3 – 2 ks
4b	stropní deska vylehčená PZD 149/29/9 V3 – 2 ks
5	ocelová dvířka 1200x1125 s rámem (dvoukřídle)
6	ocelová dvířka 400x1125 s rámem
7	hydroizolační pás MIDA BASE GS 4

AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost - divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 108 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz	
Vedoucí střediska: Ing. Radovan Holouš CSc. Vedoucí projektu: Ing. Daniel Kralický Zastupující projektant: Ing. Martina Kozdělá, Ing. František Pravec Vypracoval: Michal Kozdělá Kontroloval: Ing. Radovan Holouš CSc. Inženýr: Tepvce spol. s r.o., Třebovská 287, Ústí nad Orlicí Objednatel: Tepvce spol. s r.o., Třebovská 287, Ústí nad Orlicí	Datum revize: Schůp Podpis: Jméno: Datum: 06/2010 Soubor: PŘÍKLAD RM+RE.dwg Historický soubor: J00000_HP-000 Formát: 3 x A4 Měřítko: 1:25 Číslo přílohy: 5.2-3.43-8 Revize:
Projekt: ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV Číslo: 3 DLOUHÁ TŘEBOVÁ - KANALIZACE SO, PS: SO 3.43 ČERPACÍ STANICE SEVER - ELEKTROINSTALACE Příloha: Příklad provedení pilířku RM+RE	

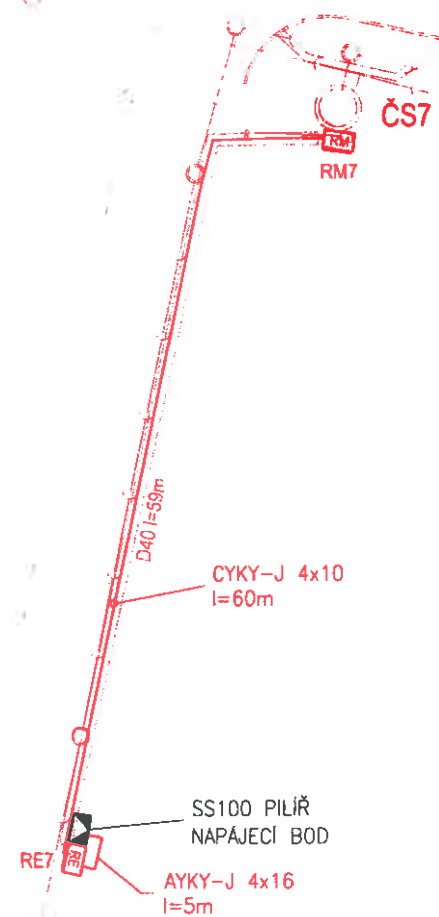

Legenda sítí:

- kabelové vedení nn projekt
- kanalizace projekt
- distribuční síť nn stávající
- síť telefonica O2 stávající
- vodovod stávající
- plynovod stávající

POZNÁMKA:

SYMBOLY SKŘÍNÍ R, RE A RM NEJSOU KRESLENY V MĚŘÍTKU

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN AC 50Hz, 400V/TN-C

OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ČISTOPIS - 4. 8. 2012

Revize	Datum	Schválil	
		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost - divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz	
Vedoucí projektu		Ing. Daniel Kozický	
Zástupce vedoucího projektu		Ing. Sana Bahor	
Zodpovědný projektant		ing. Daniel Hajzler	
Vypracoval		ing. Daniel Hajzler	
Kontroloval		Ing. Radovan Holoun CSc.	
Investor		Tepvos spol. s r.o., Třebovská 287, Ústí nad Orlicí	
Objednatel		"Sdružení pro Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV", Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8	
Projekt: ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV Část 1A KANALIZACE SO/PS SO 1.40 PŘÍPOJKY NN		Zakázkové číslo	1356411-21
		Stupeň	RDS
		Datum	08/2012
		Soubor	
		Tiskový soubor	
		Formát	2 x A4
		Měřítko	1:500
Příloha SITUACE - NAPOJENÍ STANICE ČS7		Číslo přílohy	1.40-7
		Revize	

PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE

VÝTLAK NV-11
PE 160x14,6 - DL.603 90 M

STOKA K-5-1

PP - DN 300 - DL 107.04 M

CS7

VÝTLAK NV7
PE 90x8,2 - DL.2.76 M

**POCHOOD POD TRATÍ ČD
PROVEDENO PROTÁKEM**
POTRUBÍ ULOŽENO V CHRÁNICI
Oceľ, 813x12 5mm, D. 34,00 m
Oceľ, 100-8 mm, D. 34,00 m

SO 1.40 ZL.Č. 1A-68 SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV

Přesun rozvaděčové skříně k ČS7.

Kód položky	Číslo ZL	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
		SO 1.40-PŘÍPOJKY NN				
		PŘÍPOJKA NN PRO ČS7				12 665,50
		Zakládání a stavební práce elektro				12 665,50
1.40 - 113		Zděný pilíř 620x1800x500 pro RE	kus	-1,000	6 899,90	-6 899,90
1.40 - 12		Výkop pro beton.základ pilíře	kus	-1,000	1 260,60	-1 260,60
1.40 - 133		Chránička PVC-100	m	60,000	159,20	9 552,00
220410924		Montáž uzem. páska FeZn - 120 mm2	m	60,000	79,50	4 770,00
1.71 - M5		Uzemnění páskem FeZn 120, v celé délce výkopu	m	60,000	108,40	6 504,00
		ZDĚNÝ PILÍŘ, ZÁKLADY				-18 792,00
		* Zděný pilíř RM		0,000		-18 792,00
3.44 - 188		Zděný pilíř, rozměry dle S.1710mm, v. 2200mm, III. 700mm, tiska pro rozváděč dle 4200mm x 1250mm, hl. 550mm a výsazna a obložení	kus	-1,000	15 120,00	-15 120,00
3.44 - 189		Betonový základ pro pilíř	kus	-1,000	1 620,00	-1 620,00
3.44 - 190		Dozdění pilíře po uložení kabelu	kus	-1,000	432,00	-432,00
3.44 - 191		Betonový základ pro antenní stožar, bez kotvení, stožar, kotvení a chránička je dodatečně položena	kus	-1,000	1 620,00	-1 620,00
		ZDĚNÝ PILÍŘ, ZÁKLADY				18 792,00
		Zděný pilíř RM+RE		0,000		18 792,00
3.44 - 119		Zděný pilíř, rozměry dle S.1710mm, v. 2200mm, III. 700mm, tiska pro rozváděč dle 4200mm x 1250mm, hl. 550mm a výsazna a obložení	kus	1,000	15 120,00	15 120,00
3.44 - 120		Betonový základ pro pilíř	kus	1,000	1 620,00	1 620,00
3.44 - 121		Dozdění pilíře po uložení kabelu	kus	1,000	432,00	432,00
3.44 - 122		Betonový základ pro antenní stožar, bez kotvení, stožar, kotvení a chránička je dodatečně položena	kus	1,000	1 620,00	1 620,00
R		Rezerva pro nepředvídatelné práce	kpl	0,25	12 665,50	3 166,38
						15 631,82

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		ZL č. 1A-68	
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY			
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum:	
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.40 – ČS7	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:			
Důvod změny: Rozdíl mezi ZDS a RDS			
Popis změny: Přesun rozvaděče RE k ČS7.			
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny =			
	Vícepráce	plus 39 934,41 Kč bez DPH	
	Méněpráce	minus 26 925,50 Kč bez DPH	
	Celkem	plus 12 982,41Kč bez DPH	
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
<i>Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.</i>			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí 14.11.2014 <i>„Sdružení pro Ústí nad Orlicí – - Kanalizace a ČOV“</i> Datum: <i>Pobřežní 667/78</i>		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí 14.11.2014 Datum: <i>AQUA PROCON</i> <i>AQUA PROCON s.r.o. divize Trnava Dukelských hrdinů 12 170 00 Praha 7, ČR</i>	
Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí 14.11.2014 <i>ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV</i> <i>d plus - projektová a inženýringová firma</i> Datum: <i>Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc</i>		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí 14.11.2014 <i>TEPVOS</i> Datum: <i>TEPVOS, spol. s r. o. Třesbovská 287 562 03 Ústí nad Orlicí</i> <i>IC: 28945793 DIČ: CZ25945793</i>	

SO 1.40 ZL.Č. 1A-68 SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí - kanalizace a čov

Přesun rozvaděčové skříně k ČS7.

Kód položky	Číslo ZL	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
		SO 1.40 PŘÍPOJKY NN				
		PŘÍPOJKA NN PRO ČS7				12 665,50
		Zemní a stavební práce elektro				12 665,50
1.40 - 113		Zděný pilíř 620x1800x500 pro RE	kus	-1,000	6 899,90	-6 899,90
1.40 - 12		Výkop pro beton.základ pilíře	kus	-1,000	1 260,60	-1 260,60
1.40 - 133		Chránička PVC-100	m	60,000	159,20	9 552,00
220410924		Montáž uzem. páska FeZn - 120 mm2	m	60,000	79,50	4 770,00
1.71 - M5		Uzemnění páskem FeZn 120, v celé délce výkopu	m	60,000	108,40	6 504,00
		ZDĚNÝ PILÍŘ, ZÁKLADY				-18 792,00
		* Zděný pilíř RM		0,000		-18 792,00
3.44 - 188		Zděný pilíř, rozměry cca: š.1770mm, v. 2230mm, hl. 750mm, nika pro	kus	-1,000	15 120,00	-15 120,00
3.44 - 189		Betonový základ pro pilíř	kus	-1,000	1 620,00	-1 620,00
3.44 - 190		Dozdění pilíře po uložení kabelu	kus	-1,000	432,00	-432,00
3.44 - 191		Betonový základ pro anténní stožár, bez kotvení, stožár, kotvení a	kus	-1,000	1 620,00	-1 620,00
		ZDĚNÝ PILÍŘ, ZÁKLADY				18 792,00
		Zděný pilíř RM+RE		0,000		18 792,00
3.44 - 119		Zděný pilíř, rozměry cca: š.2430mm, v. 2230mm, hl. 750mm, nika pro	kus	1,000	15 120,00	15 120,00
3.44 - 120		Betonový základ pro pilíř	kus	1,000	1 620,00	1 620,00
3.44 - 121		Dozdění pilíře po uložení kabelu	kus	1,000	432,00	432,00
3.44 - 122		Betonový základ pro anténní stožár, bez kotvení, stožár, kotvení a	kus	1,000	1 620,00	1 620,00
		Všeobecné položky				316,91
3.44 - 3		Realizační dokumentace	kpl	0,01	19 134,66	242,34
3.44 - 11		Dokumentace skutečného provedení	kpl	0,01	5 887,59	74,57
						12 982,41
