

Změnový list

ZL č.1A-38

Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY

Komu: TEPVOS, spol. s r.o.

Datum: 21.11.2012

Odesláno/

předáno:

Stavební objekt (provozní soubor): SO 1. 09 – Stoky N-20, N-22

Odkazy: na specifikaci:

na výkresy: Projektová dokumentace změny - RDS

na rozp. podklady: Výkaz výměr změny

na jinou část smlouvy:

ZMĚNA – popis změny:

Popis změny: SO 1. 09 – Stoky N-20, N-22 – z důvodu výškové kolize se stávající dešťovou stokou DN500 bude nutné upravit podélný profil stoky N-22 zvýšením nivelety stoky od místa kolize do konce stoky a přidat šachtu se spadištěm na stoku v úseku mezi šachtami N47d - N48d.

Součástí oznámení změny je: 1) Zápis v DVMP
2) Sdělení projektanta
3) Záписы ze SD
4) Zákres změn do PD
5) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny =
plus 3 739,29 Kč bez DPH

Oznámení vydává: Sdružení „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“

Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.

Vyjádření dotčených:

Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí :

Sdružení „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“

Pobřeží 667/78

186 00 Praha 8

Datum: 21.11.2012

Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí

AQUA PROCON s.r.o.

divize Praha

Dělníkův hrdinů 12

170 00 Praha 7, ČR

DIČ: CZ00004371

Datum:

Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí :

Datum: 21.11.2012

Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí

Datum:

DEKLE +/- STRUŽKY LISTI N/O - kanalizace A ČOV

SD. č. 1
STR. 18

82. ČAST 1A - SO 1.09 STOKA NR2

1.11.2012

NA ŽÁDOST ZHOTOVITELE

NA ZÁKLADĚ PRO KOLÍK A PŘÍČNÉ LAMOU
STÁVAJÍCÍ K ČISTOVSOU KANALIZACI DN 500
JE NUTNÉ VYPRACOVAT PODÉLNÝ PROFIL STOKY
NR2 MEZI RŠ N47d - N480V

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽ. ZL.

ZA OBJEDNATELE

ZA SPSE

ZA ZHOTOVITELE

P. KNEŽP

P. ŠEVOČE

P. PAULČE

M K

83. ČAST 1A - SO 1.10 STOKY U2, NR3

1.11.2012

NA ŽÁDOST OBJEDNATELE

Z DŮVODU ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉ HLOUBKY STÁVAJÍCÍ
KANALIZAČNÍ KOTVINY OD Č.P. 586 UL. SADOVA BLUD
PROVEDENO ZAKLADNÍ STOKY U2 A NR3.

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽ. ZL A OPRÁVENÝ PODELNÝ
PROFIL STOK.

ZA OBJEDNATELE

ZA SPSE

ZA ZHOTOVITELE

P. KNEŽP

P. ŠEVOČE

P. PAULČE

M K



**„Sdružení pro Ústí nad Orlicí-kanalizace a ČOV“
Pan Bronislav Hána
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8**

Datum: 15.11.2012
Vyřizuje: Ing. Sana Bahor, 737 206 974

**Věc : Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV
1A – Ústí nad Orlicí - kanalizace
Stanovisko projektanta k ZL1A-38
SO 1.09 – Stoka N-22**

Vážený pane,

na základě Vašeho požadavku Vám sdělujeme stanovisko projektanta ke stoce N-22.

Při zahájení stavebních prací na stoce N-22 byla zjištěna výšková kolize se stávající dešťovou stokou DN500.

Z tohoto důvodu bude nutno na stoce N-22 přidat další šachtu a upravit niveletu stoky v úseku N47d – N48d.

Zpracovatel ZDS ani RDS nemohl předpokládat uložení stávající kanalizace odlišně od poskytnutých podkladů.

Z výše uvedených důvodů s výše uvedenou změnou souhlasíme.

S pozdravem


Ing. Daniel Kozický

Sídlo **Brno**

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 426 011
fax: +420 541 426 012
e mail: info@aquaprocon.cz

Divize **Praha**

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha
Tel.: +420 220 879 819
fax: +420 226 712 140
e mail: info.praha@aquaprocon.cz

IČ: 46964371

DIČ: CZ46964371

Brno-venkov č. ú.: 24301-641/0100

Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

ÚST. W.O.

KANALIZACE 1A

Denní záznamy stavby

SD č. 4 / strana č. 21

Datum: 7.11.12

ZÁPIS ZKONTROLA - ODPověď NA ZÁPIS TDI Z 2.11.12:
POŘADAVEK - SPRÁVCE STAVBY NA PŘEDNOSTNÍ PRO-
VEDENÍ STOK, Ø 4" (ÚSEK ØK4 - ØS(2) A B" I ZS
SPUŠTĚNÍ ZA PŘEDPOKLADU POVOLENÍ ZÁSAHU DO
STÁVNÍ KOMUNIKACE ZE STRANY ŘSD A DALŠÍ PO
PROVEDENÍ PŘELOŽKY KABELU VN ZE STRANY ČS2 a.s.

PROSTĚ NEJDE TO

ZÁPIS ZKONTROLA:

Z DŮVODU KOLIZE ZURČOVANÉ STOKY H-22 S STÁ-
VNÍMI ŽELEZNOU KANALIZACÍ DN 500 KČZ ČAOUTAČI
N470 A N480 V ULICI PIVOVARSKÁ BYLO DOKONČENO
S. G. ZÁKLADNÍM PROJEKTEM VLOŽENÍ NOVÉ SÁCHTY
ZA MÍSTO KOLIZE A PŘIZVODNÝ ČLÉB STOKY NAD TÍMTO
MÍSTEM DO ŠLÁDU 5°.

NA VŘESLENO

VŘESLENO

7.11.12

POČASÍ: ZATÁŽENO, DÉŽ, 5-9°C

POČET PRACOVNÍKŮ:

- SDRUŽENÍ: HANA HONZÁK, KVAL
- A.B. 18, VČS 13, HŘIVÍRA 15

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

Mechanizace:

- KOLÉČK. BAGR 6x, PÁSOVÝ BAGR 2x, TRAKTOR BAGR 1x
- UNO-1x, TATRA 10x, VIBRAČNÍ TĚCUNKA

PROVÁZENÉ PRÁCE:

STOKA C (C13-C14)

- ČERPAŇÍ VODY

STOKA C-0 (C25-C27)

- FINÁLNÍ OPRAVA POVŘENOU KOMUNIKACE

- OPRAVA ULOŽNÍ ÚPUSN POD VADUKTEM

STOKA C (C18-C19)

- HROUBENÍ RYH PÁSEK

- LOŽNÍ 23 ITP POKLADKA FORMULI Z TRUB SKL DN 1100

- ČISTĚ FORMULI, ZÁSTP RYH S ČIŠTĚNÍM

STOKA V12 (V12-V13)

- ZÁSTP RYH S ČIŠTĚNÍM

ÚST. N.O.

KANALIZACE 1A

Denní záznamy stavby

SD č. 4 / strana č. 30

Datum:

15.11.2012

- z důvodu vyššího kolize stavby stoky DN 100 a manžerů stoky N-22 v úseku N48d a N49d bylo nutno vložit novou šachtu tak aby bylo možné přitrdnout kabeletu stoky a (vykř.) zt se se stavby stoky DN 100 v nové šachtě tude stoka N22 přitrdnuta o 30 cm, dále tude stoka vedena až ke konci v jednotném spádu 5‰.

za APP: Balu

15.11.12

Počasí: POLOJASNO, 0-6°C

Počet pracovníků:

- SDRUŽENÍ: KANAL, MRAZEK, KUJAL

- A.B.V. 15, V.E.S. 13, MARIŠKAU 15

Mechanizace: KOLON, BAGR 6X, PRÁDNÍ BAGR 2X, TATRA 10

Pracovní doba: 7⁰⁰-16⁰⁰

Provedení práce:

STOKA C

- BĚŽNÁ STĚNA ŠACHTY C7

- HŘ. PRŮPUSK C13-C16

- HŘ. POTRUBÍ SKL DN 1100, C13-C19

STOKA BG

- POKLADKA POTRUBÍ SKL DN 800, BG 6-BG 7

STOKA N-5 (N51-N52)

- HŘ. ŠACHTY N51, POKLADKA POTRUBÍ PRŮR. DN 500

- OBŠÍP POTRUBÍ, ZAKR. RYH SŽ ZAPUŠTĚN

STOKA N-6 (N57-N58)

- KLOUBENÍ RYH, BOURÁNÍ BĚŽ. KC. VŠ VÝKOPU

- HŘ. PRŮPUSK ŠACHTY N57

STOKA N-22 (N48d-N49d)

- HŘ. PRŮPUSKOVANÉ ŠACHTY N48d

- KLOUBENÍ RYH, OBŠÍP POTRUBÍ, ZAKR. SŽ ZAPUŠTĚN

STOKA N-7


- HŘ. PRŮPUSK - POTRUBÍ PRŮR. DN 160, 200


- OBŠÍP POTRUBÍ, ZAKR. RYH SŽ ZAPUŠTĚN

STOKA D-10

- PROVEDENÍ PROTLAKU POD ŽELEZNICÍ DRAHOU

[Signature]

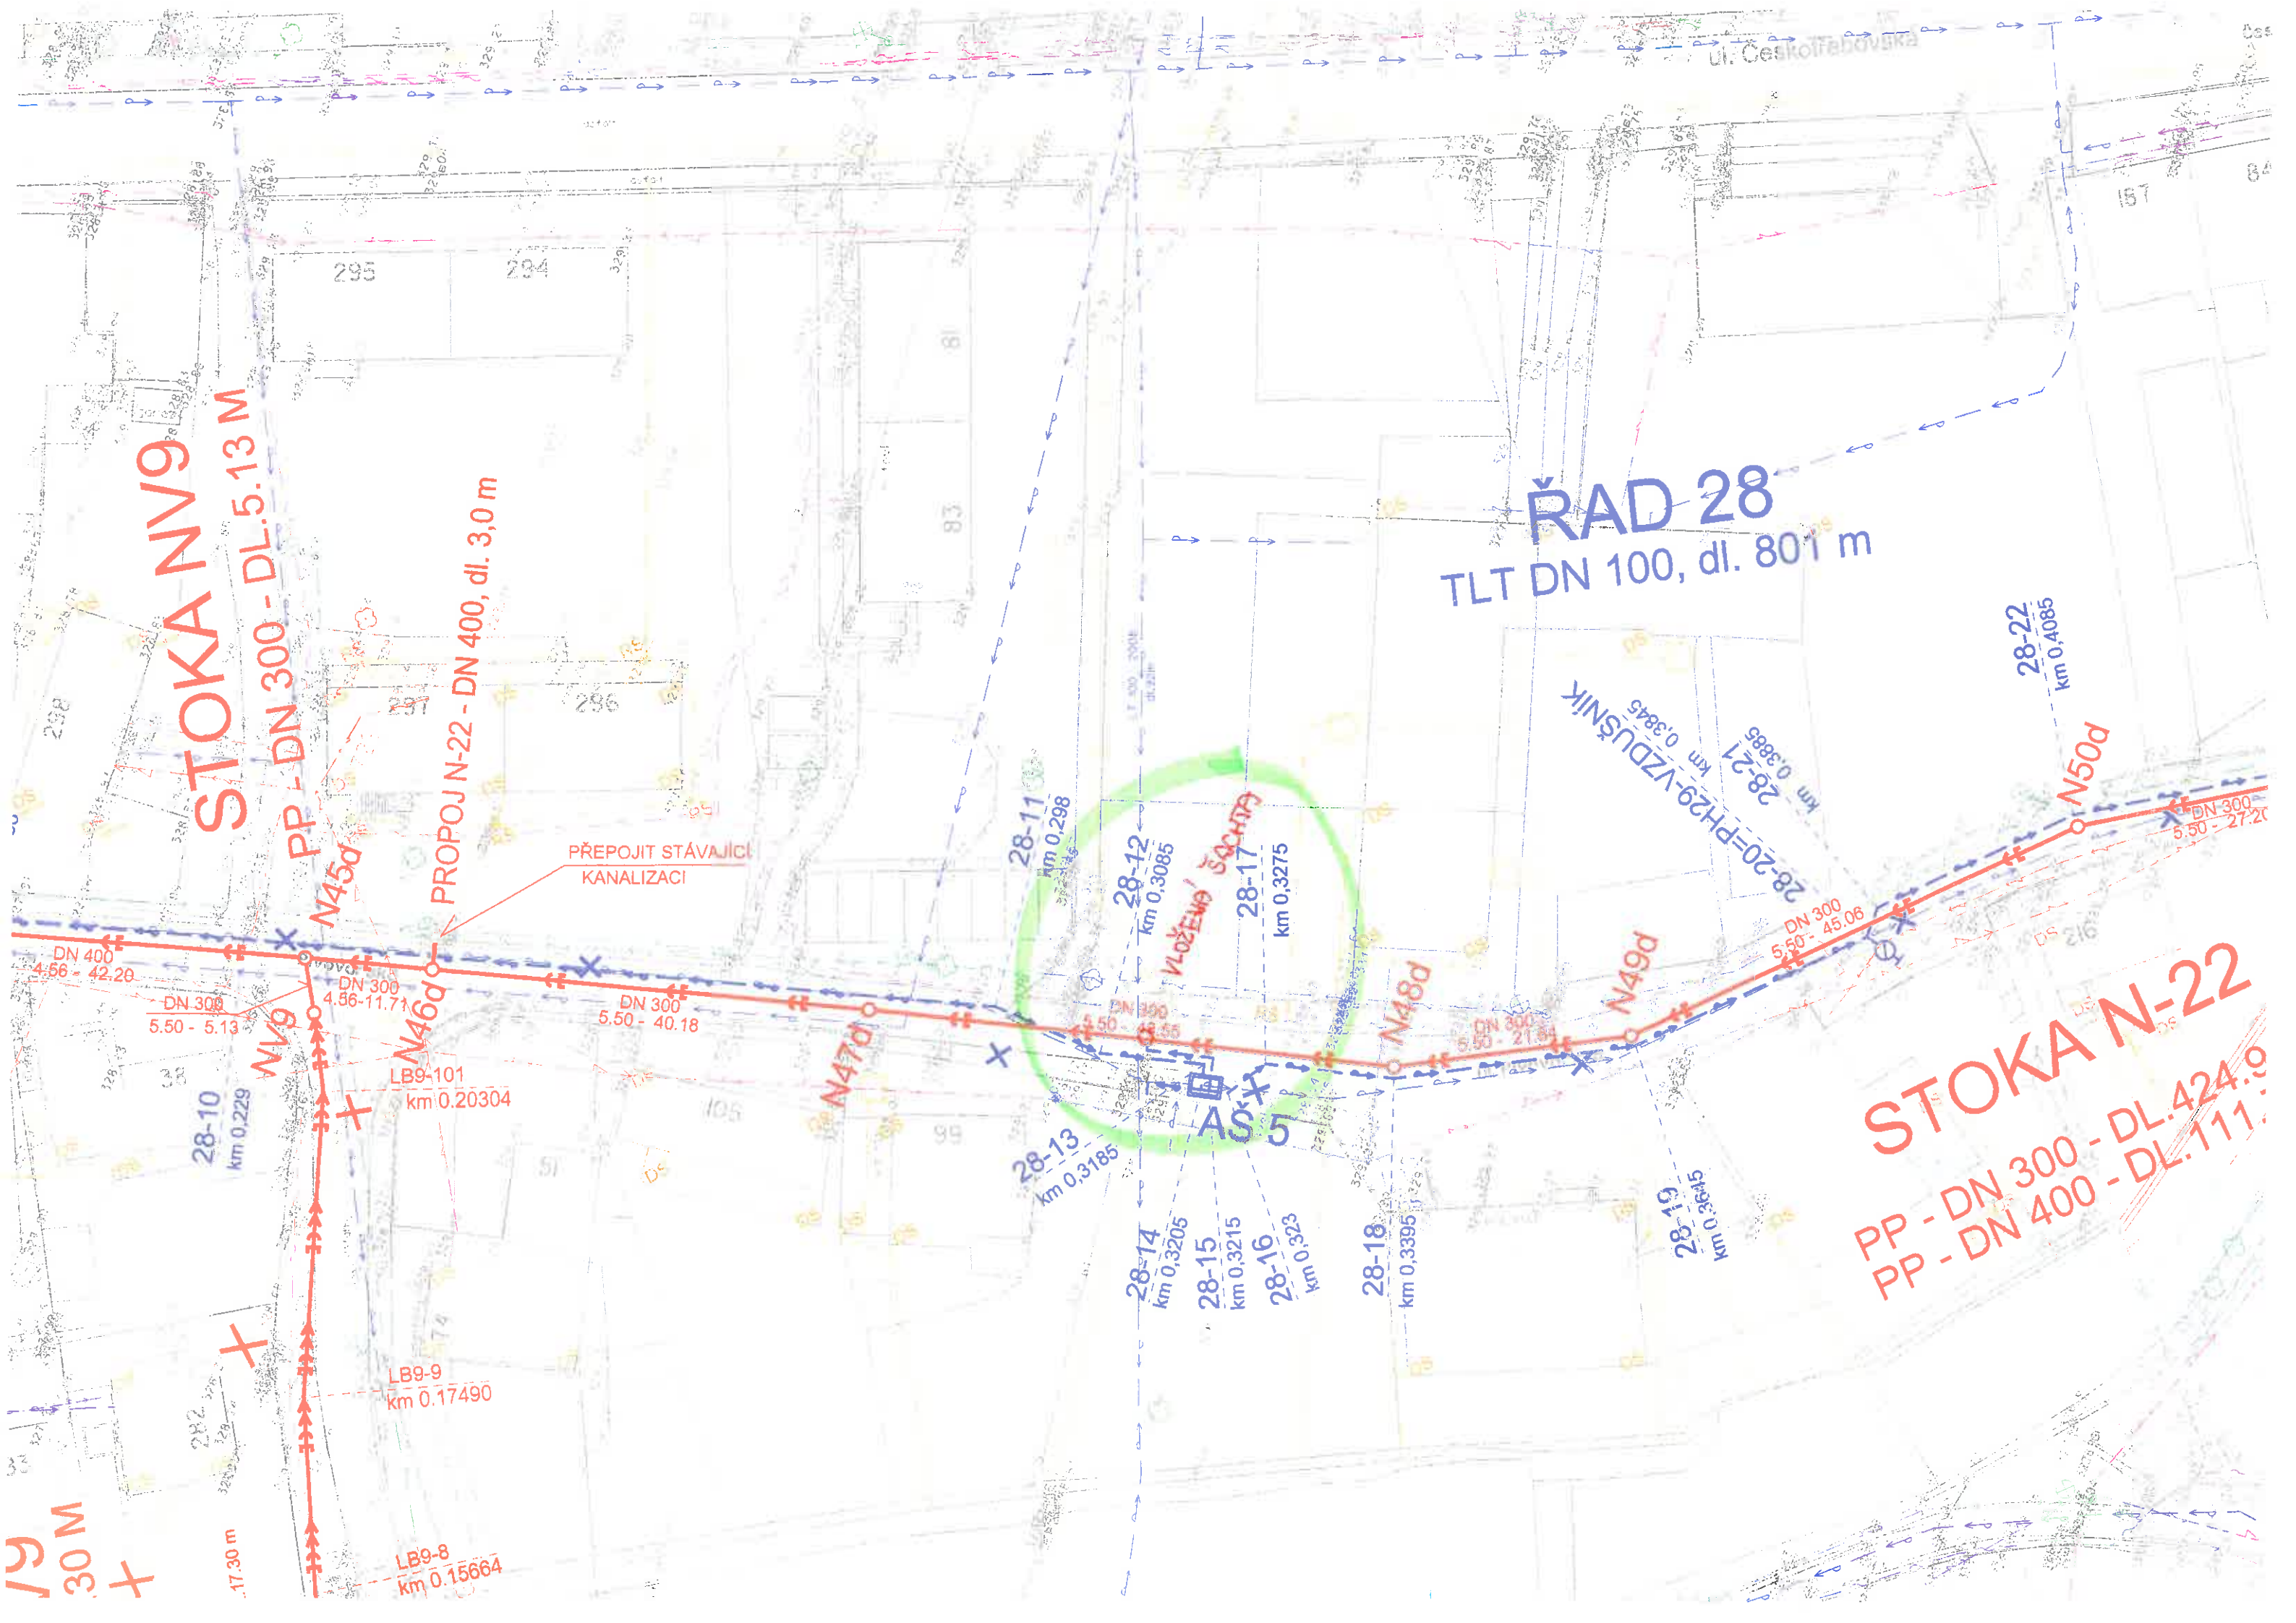


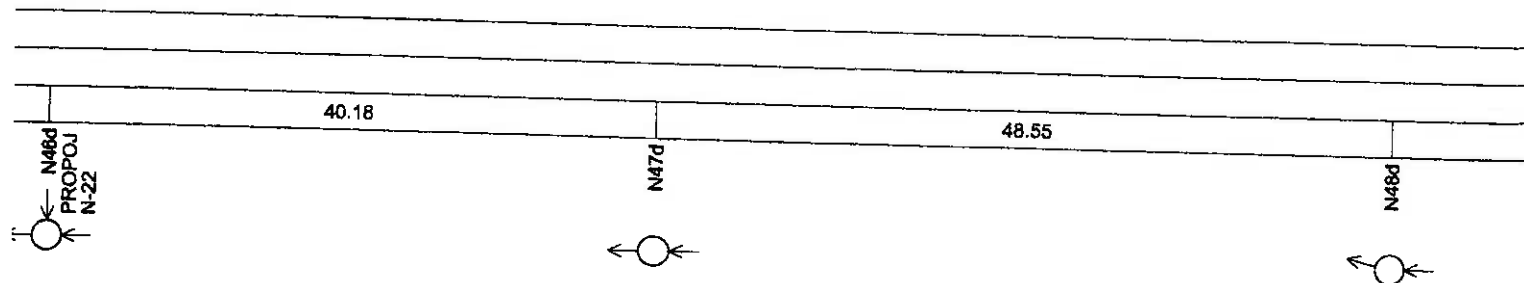


ČÍSLOMIS 04.06.2012


PODELNÝ PROFIL STOKY H-22

úč. 1.09-2

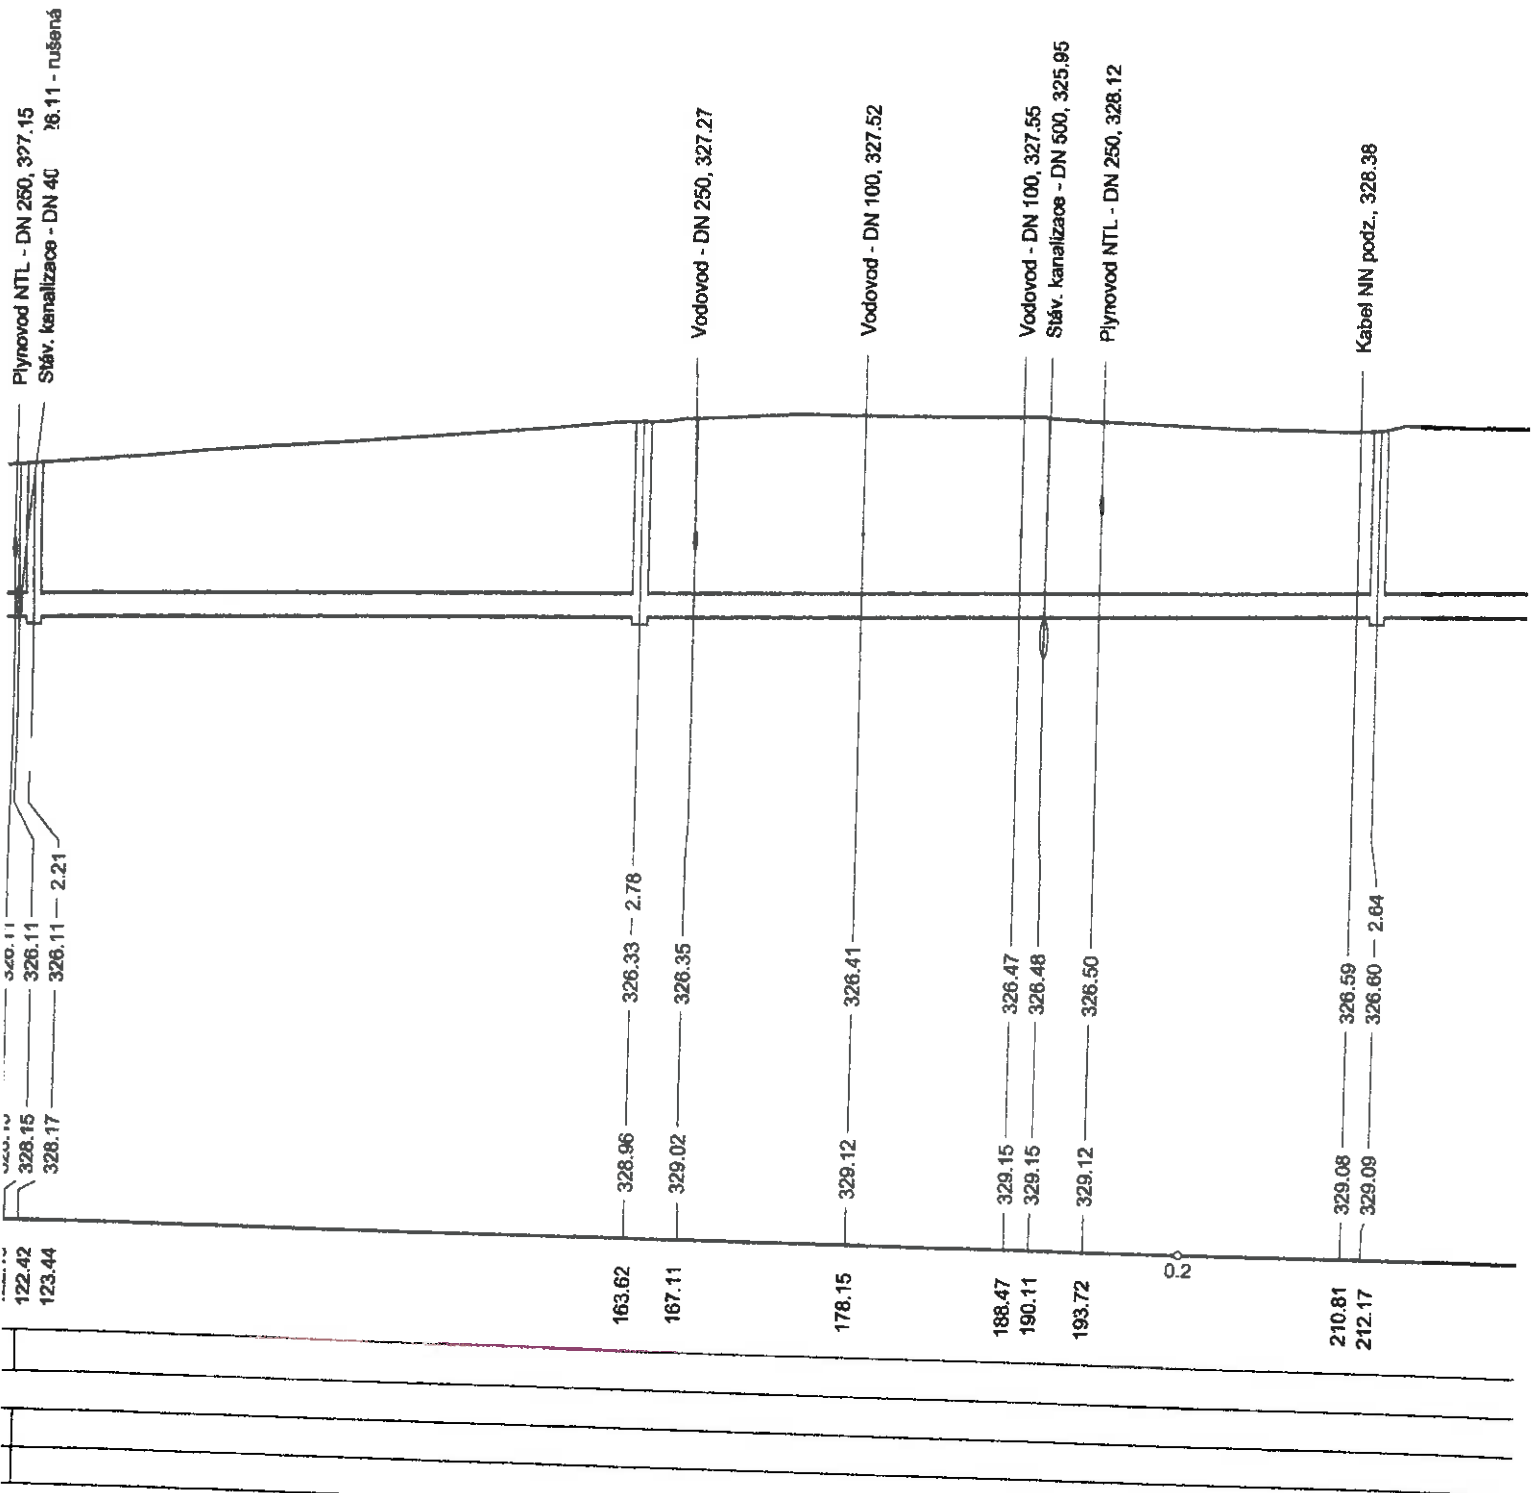

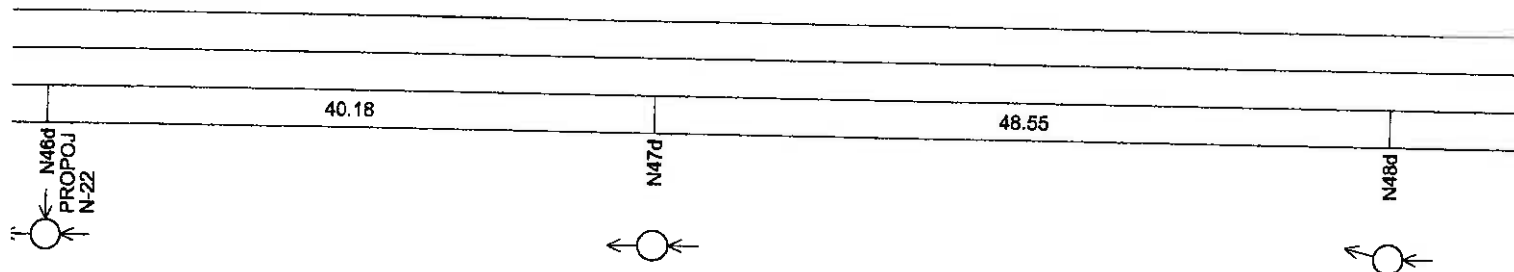

ZMĚNA 15.11.2012
UPRAVENÝ PODELNÝ PROFIL STOKY N-22
 v.č. 1.09-2

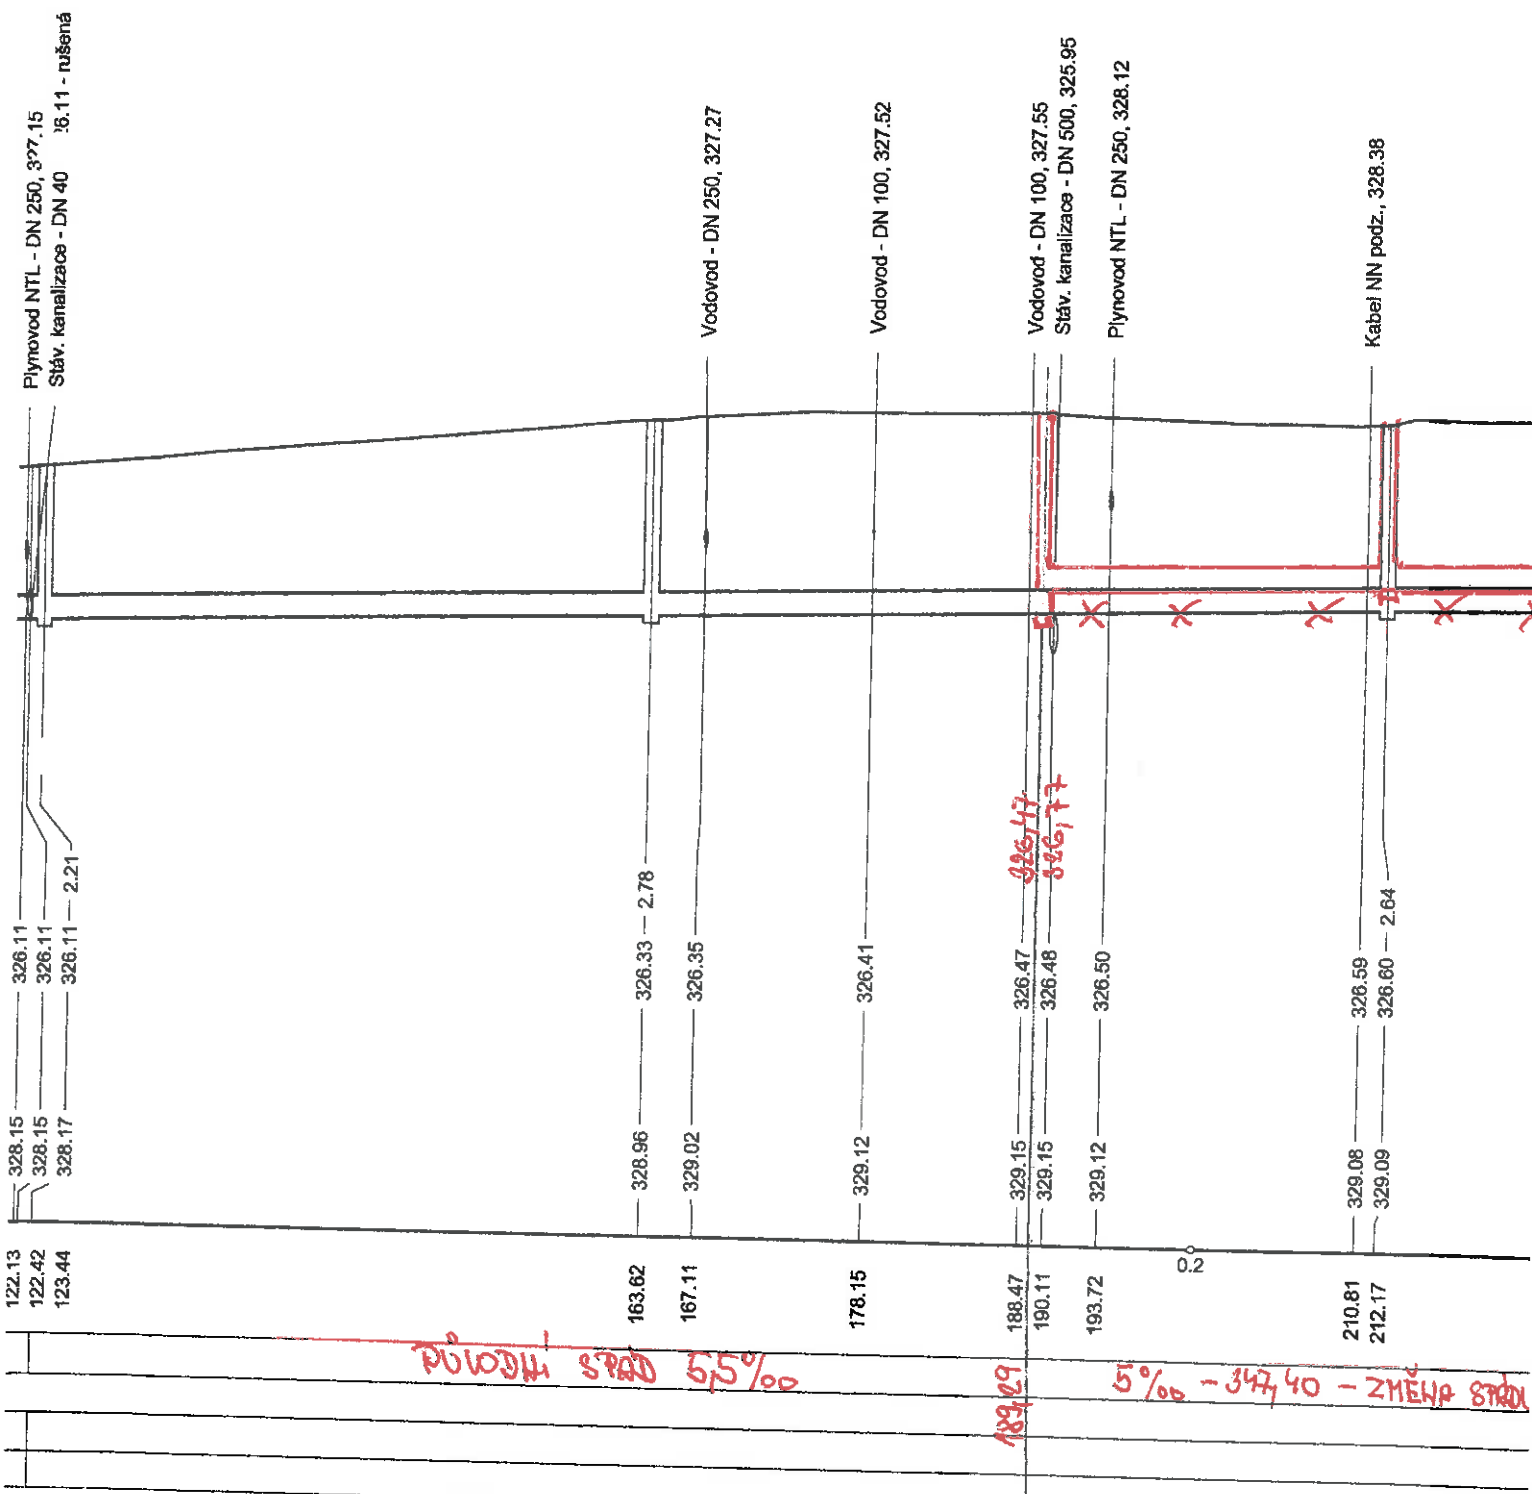

					SO 1.09 STOKA N-22 - změna nivelety potrubí mezi šachtami N47d a N48d vložení štachty N47da se skluzem				Celkem Kč
					STOKY				3 739,29
				Zemní práce				-19 824,57	
1.08 - 12			m3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s		m3	-53,673	102,20	-5 485,38
1.08 - 15			m2	Praženi a rozeprání stěn rýh hl. do 4m		m2	-97,588	33,20	-3 239,92
1.08 - 17			m2	Odstanění paženi stěn rýh hl. do 4 m		m2	-97,588	9,30	-907,57
1.08 - 19			m3	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m		m3	-29,520	2,70	-79,70
1.08 - 22			m3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč.naložení		m3	-53,673	79,60	-4 272,37
1.08 - 25			m3	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3	-53,673	108,80	-5 839,62
				Trubní vedení					23 563,86
1.08 - 84			kus	Šachta z betonových dílců pro DN 300 a DN 400 výška vstupu 3,0 m s		kus	1,000	22 816,00	22 816,00
R			kpl	Rezerva pro nepředvídatelné práce		kpl	0,25	2991,43	747,86

		SO 1.09 STOKA N-22 - změna nivelety potrubí mezi šachtami N47d a N48d vložení šachty N47da se skluzem					Celkem Kč
		STOKY					3 739,29
		Zemní práce					-19 824,57
1.09 - 7		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s	m3	-53,673		102,20	-5 485,38
1.09 - 9		Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	-97,588		33,20	-3 239,92
1.09 - 10		Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-97,588		9,30	-907,57
1.09 - 11		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-29,520		2,70	-79,70
1.09 - 15		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč.naložení	m3	-53,673		79,60	-4 272,37
1.09 - 19		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-53,673		108,80	-5 839,62
		Trubní vedení					23 563,86
1.09 - 54		Šachta z betonových dílců pro DN 300 a DN 400 výška vstupu 3,0 m s	kus	1,000		22 816,00	22 816,00
R		Rezerva pro nepředvídatelné práce	kpl	0,25		2991,43	747,86

Změnový list		ZL č.1A-38	
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY			
Komu: TEPVOS, spol. s r.o.		Datum: 30.5.2014	
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1. 09 – Stoky N-20, N-22	
Odkazy:	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny: <u>Důvod změny:</u> Změna RDS <u>Popis změny:</u> SO 1. 09 – Stoky N-20, N-22 – z důvodu výškové kolize se stávající dešťovou stokou DN500 bylo nutno upravit podélný profil stoky N-22 zvýšením nivelety stoky od místa kolize do konce stoky a přidat šachtu se spadištěm na stoku v úseku N47d - N48d. Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny = Vícepráce plus 22 816,00 Kč bez DPH Méněpráce minus 19 824,57 Kč bez DPH Celkem plus 2 991,43 Kč bez DPH			
Oznámení vydává: Sdružení „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ <i>Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.</i> Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí <i>Sdružení pro Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV Pobřežní 667/78 186 00 Praha 8</i> Datum: 30.5.2014		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 30.5.2014 <i>Bah</i>	
Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí <i>ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV plus - vícepráce a méněpráce Ing. Petr Hájek, ředitel Teplovos, spol. s r.o.</i> Datum: 30.5.2014		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí <i>TEPVOŠ</i> Datum: 30.5.2014 <i>Y'</i>	

[illegible]



Skutečná pozice dešťové kanalizace DN 400



Skutečná pozice dešťové kanalizace DN 400



Vybudovaná spádlišťová šachta pro podchycení výškové změny nivelety stoky
