

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “					
Změnový list				ZL č.1A-77	
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY					
Komu: TEPVOS, spol. s r.o.			Datum: 6.12.2013		
Odesláno/					
	předáno:				
Stavební objekt (provozní soubor):			SO 1.11.1. – stoka K4,K-4-1		
Odkazy:		na specifikaci:			
		na výkresy:	Projektová dokumentace změny - RDS		
		na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny		
		na jinou část smlouvy:			
ZMĚNA – popis změny: Popis změny: Provizorní úprava povrchu. Součástí oznámení změny je: 1) Zápis v DVMP 2) Stanovisko projektanta 3) Zákres změn v RDS 4) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny = plus 198 307,41 Kč bez DPH					
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “ Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny. Vyjádření dotčených:					
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – - Kanalizace a ČOV“ Datum: 6.12.2013 Praha 8			Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 6.12.2013		
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí : Datum: 6.12.2013			Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 6.12.2013		

Ž. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ NÁVRH ZČ.

ZA OBJEDNATELE

P. KNEŽP.

[Signature]

ZA SPS

P. ŠENČÍK

[Signature]

ZA ZHOTOVITEL

P. PRAVČO

[Signature]

MR. SÚS NA SO 1.03 STOKA BE
ŽÁDOST OBJEDNATELE

23.5.20

NA ZÁKLADĚ ZAPLACOVÁNÍ STAVBY STOKY V UL. ČSADNADY
PO NÁPOJENÍ STOKY BE Z UL. TG.M. BYLA PROVEDENA
KONTROLA ÚSEKU STAVBY KANALIZACE V UL.
ŽILEMNIČSKÉHO, KDE BYLO ZJIŠTĚNO COKÁLNÍ
SEŠKRCENÍ PROFILU POTRUBÍ NA DN 600.

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
A NÁVRH ZČ.

ZA OBJEDNATELE

P. KNEŽP.

[Signature]

ZA SPS

P. ŠENČÍK

[Signature]

ZA ZHOTOVITEL

P. PRAVČO

[Signature]

MR. ÚČS NA - SO 1.01, SO 1.02, SO 1.04 - KOMUNIKACE

23.5.2013

1) LAŽENŠKÁ STOKA VA2, ČO

4) PRAŽSKÁ UL-1, UL

2) J. HAŠKA STOKA N2

3) LETOHRADSKÁ STOKA BC 1. a 2. ČÁST

MR. ŠTEPANIKA STOKA BA

ŽÁDOST OBJEDNATELE

NA ZÁKLADĚ ZMĚNY POŘADÁVKY SPRÁVCE KOMUNIKACE
DOCHÁZÍ K TĚMTO ZMĚNÁM OPROTI RPD:

1) UL LAŽENŠKÁ - SPRÁVCE KOMUNIKACE, Tedy SÚS

→

b) 78:

POŽADUJE PROVEDENÍ ODLIŠNÉ SLADBY KOMUNIKACE
A TO, PŘIDÁNÍ VRSTVY BETONOVÉ STABILIZACE T2.20cm.

DÁLE SPRÁVCE KOMUNIKACE POŽADUJE PROVEDENÍ ~~PRŮVODNÍ~~
PRŮVODNÍ VRSTVY ŽIVICE TL. 5cm PO DOBU ŽIVNÍHO
OBDOBÍ, KTERÁ BUDE PŘED FINÁLNÍM POUKUTEM
PŘEPŘEROVÁNÍ A NAKRAŽENA CELOPLOŠNOU OPRAVOU,
KTERÁ JE POŘADOVÁNA TAKÉ NA DĚLEČ RPD.

2) UL. J. HASKA - SPRÁVCE KOMUNIKACE POŽADUJE
OPRAVU JEDNOHO ŽIVNÍHO PRŮVODNÍ V DĚLEČE OCA 50cm,
NA STOLE N2, KTERÉ NEBUDOU REALIZOVÁNY NA
ZÁKLADĚ KOORDINACE V LÁNCI PRACÍ AČE
„REKONSTRUKCE ŽEC. ÚZLU ÚSTNÍ N/0“.

3) UL. LETOHRADSKÁ, 17. LISTOPADU A M.R. ŠTEPÁNKOVA -
SPRÁVCE KOMUNIKACE POŽADUJE DLE DOPRAVNÍHO
ROZHODNUTÍ PRŮVODNÍ OPRAVU KOMUNIKACE
ŽIVNÍM ÚKUTEM TL. 5cm, KTERÁ BUDE
PŘED FINÁLNÍ OPRAVOU ODSTRANĚNÝ PŘEPŘEROVÁNÍM
A POTÉ NAKRAŽEN FINÁLNÍ KONSTRUKCÍ.

DANÝ POŽADAVEK BYL VVEDEN Z DŮVODU VYSOKÉHO
ZATÍŽENÍ KOMUNIKACÍ. DOPRAVOU.

4) UL. PRŮVODNÍ - K4-1 A K4 - VIZ. ODS. 3.

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ KVALITNÍ ZČ A REVIZI RPD.

ZA OBJEDNATELE

P. KNEŽP

10/

ZA SP. S

P. ŠEDIVÝ

11/11/07

ZA ZHOTOVITEL

P. PAVLÍČEK

11/11/07



**„Sdružení pro Ústí nad Orlicí-kanalizace a ČOV“
Pan Bronislav Hána
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8**

Datum: 30.5.2013
Vyřizuje: Ing. Sana Bahor, 737 206 974

**Věc : Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV
1A – Ústí nad Orlicí - kanalizace
Stanovisko projektanta k ZL1A-77
SO 1.11.1 Stoka K-4, K-4-1 – provizorní úprava povrchu**

Vážený pane,

na základě Vašeho požadavku Vám zasiláme stanovisko projektanta k provizorní úpravě povrchu místní komunikace v trase stok K-4, K-4-1.


Dle dodatečného požadavku správce komunikace bude provedena provizorní úprava povrchu místní komunikace v ul. Pražská živičným povrchem tl. 70mm, který bude před finální opravou odstraněn frézováním a poté nahrazen finální konstrukcí. Celková plocha provizorní opravy je 287m².

Zpracovatel ZDS ani RDS nemohl předvidat dodatečný požadavek správce komunikace.

Z výše uvedených důvodů projektant souhlasí s navrženými změnami.

S pozdravem

Ing. Daniel Kozický



Sídlo **Brno**

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 426 011
fax: +420 541 426 012
e-mail: info@aquaprocon.cz

Divize **Praha**


AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha
Tel.: +420 220 879 819
fax: +420 226 712 140
e-mail: info.praha@aquaprocon.cz


IČ: 46964371

DIČ: CZ46964371

Brno venkov č. ú.: 21301-641/0100

Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

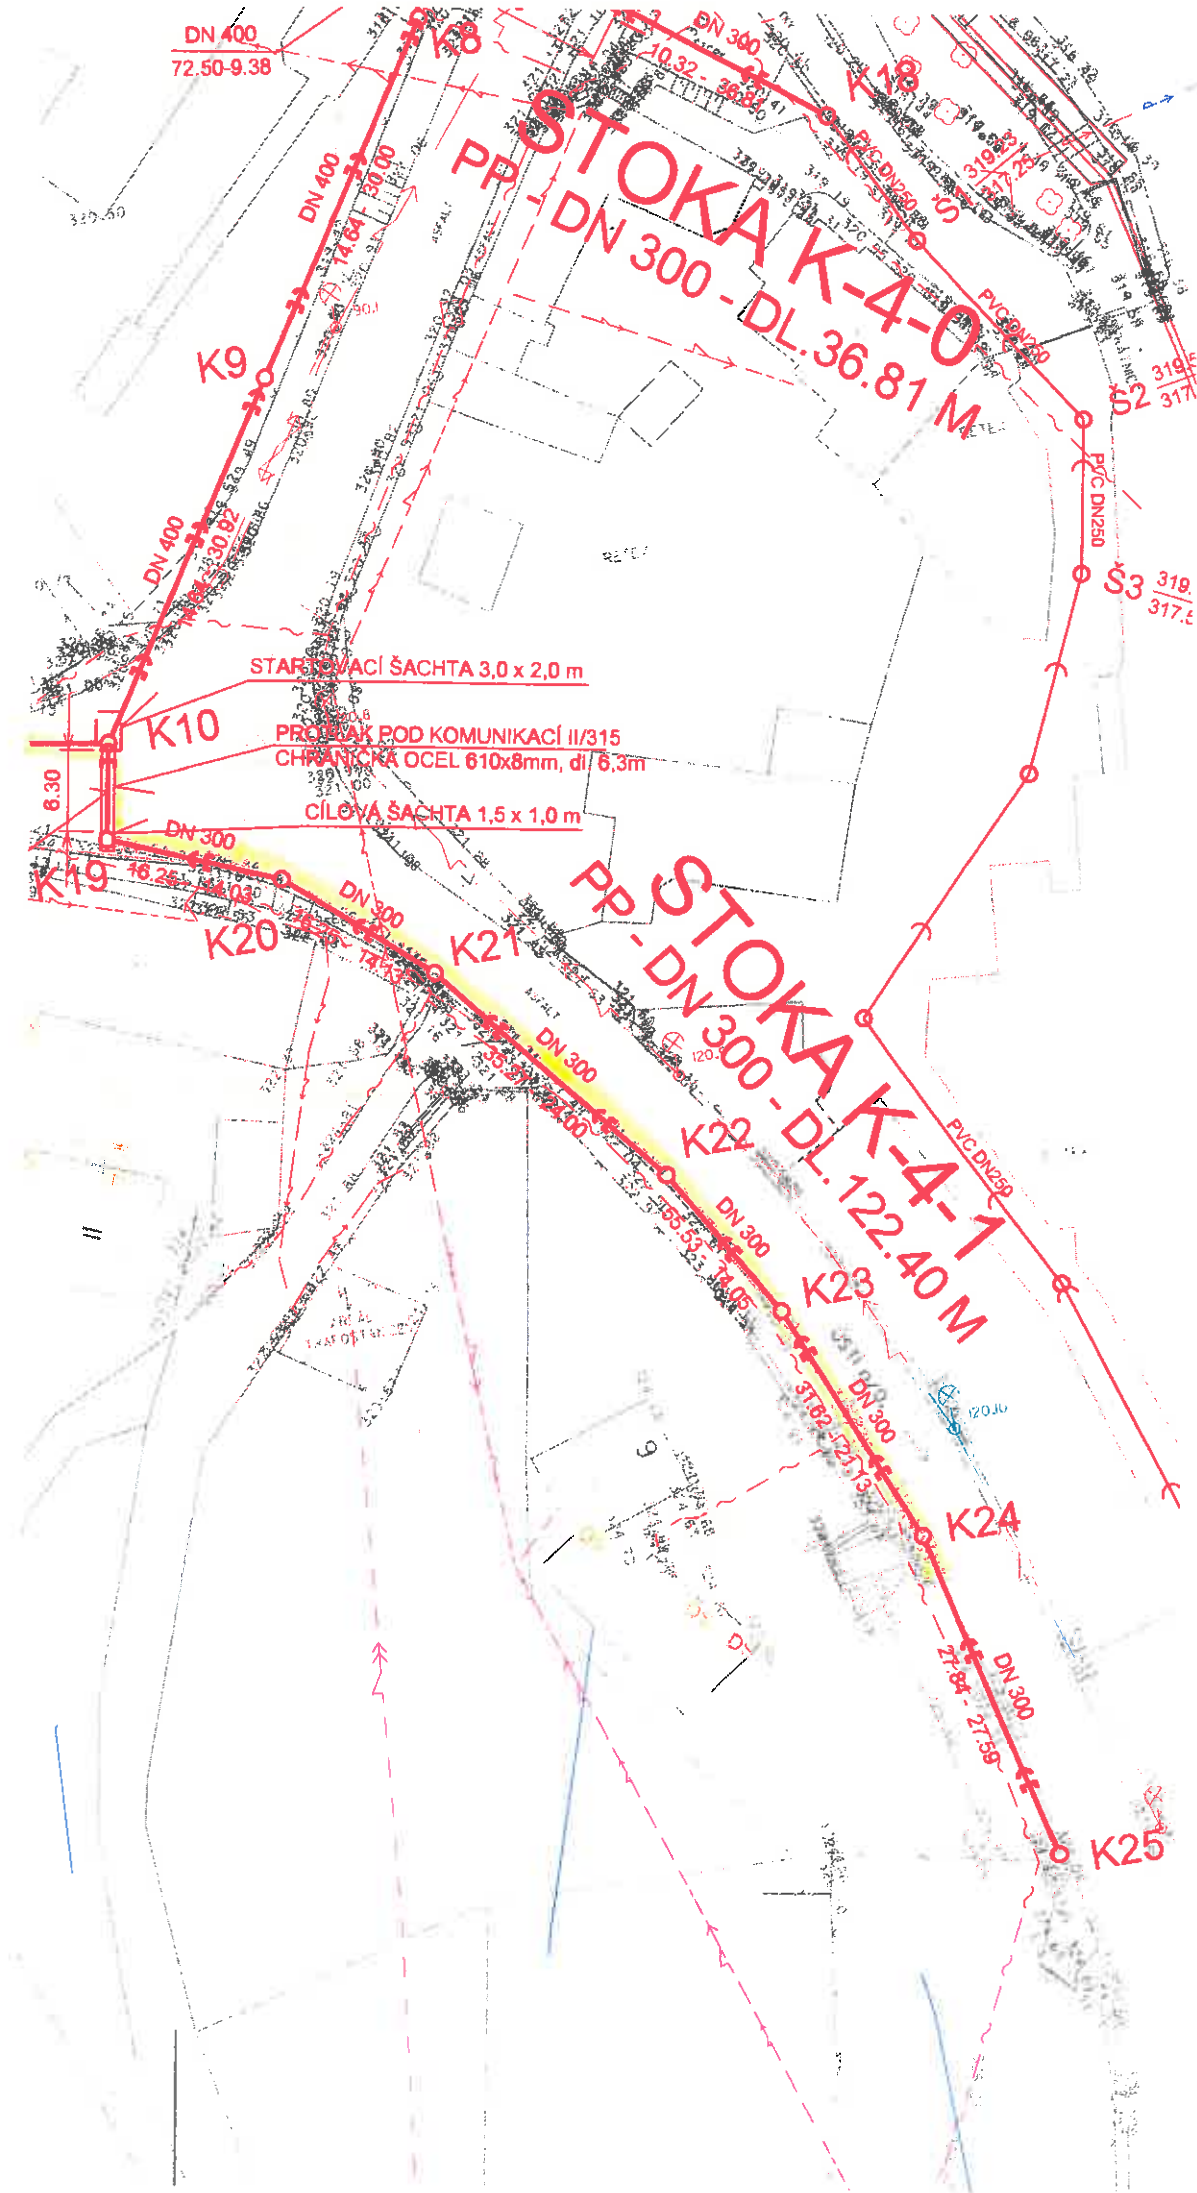

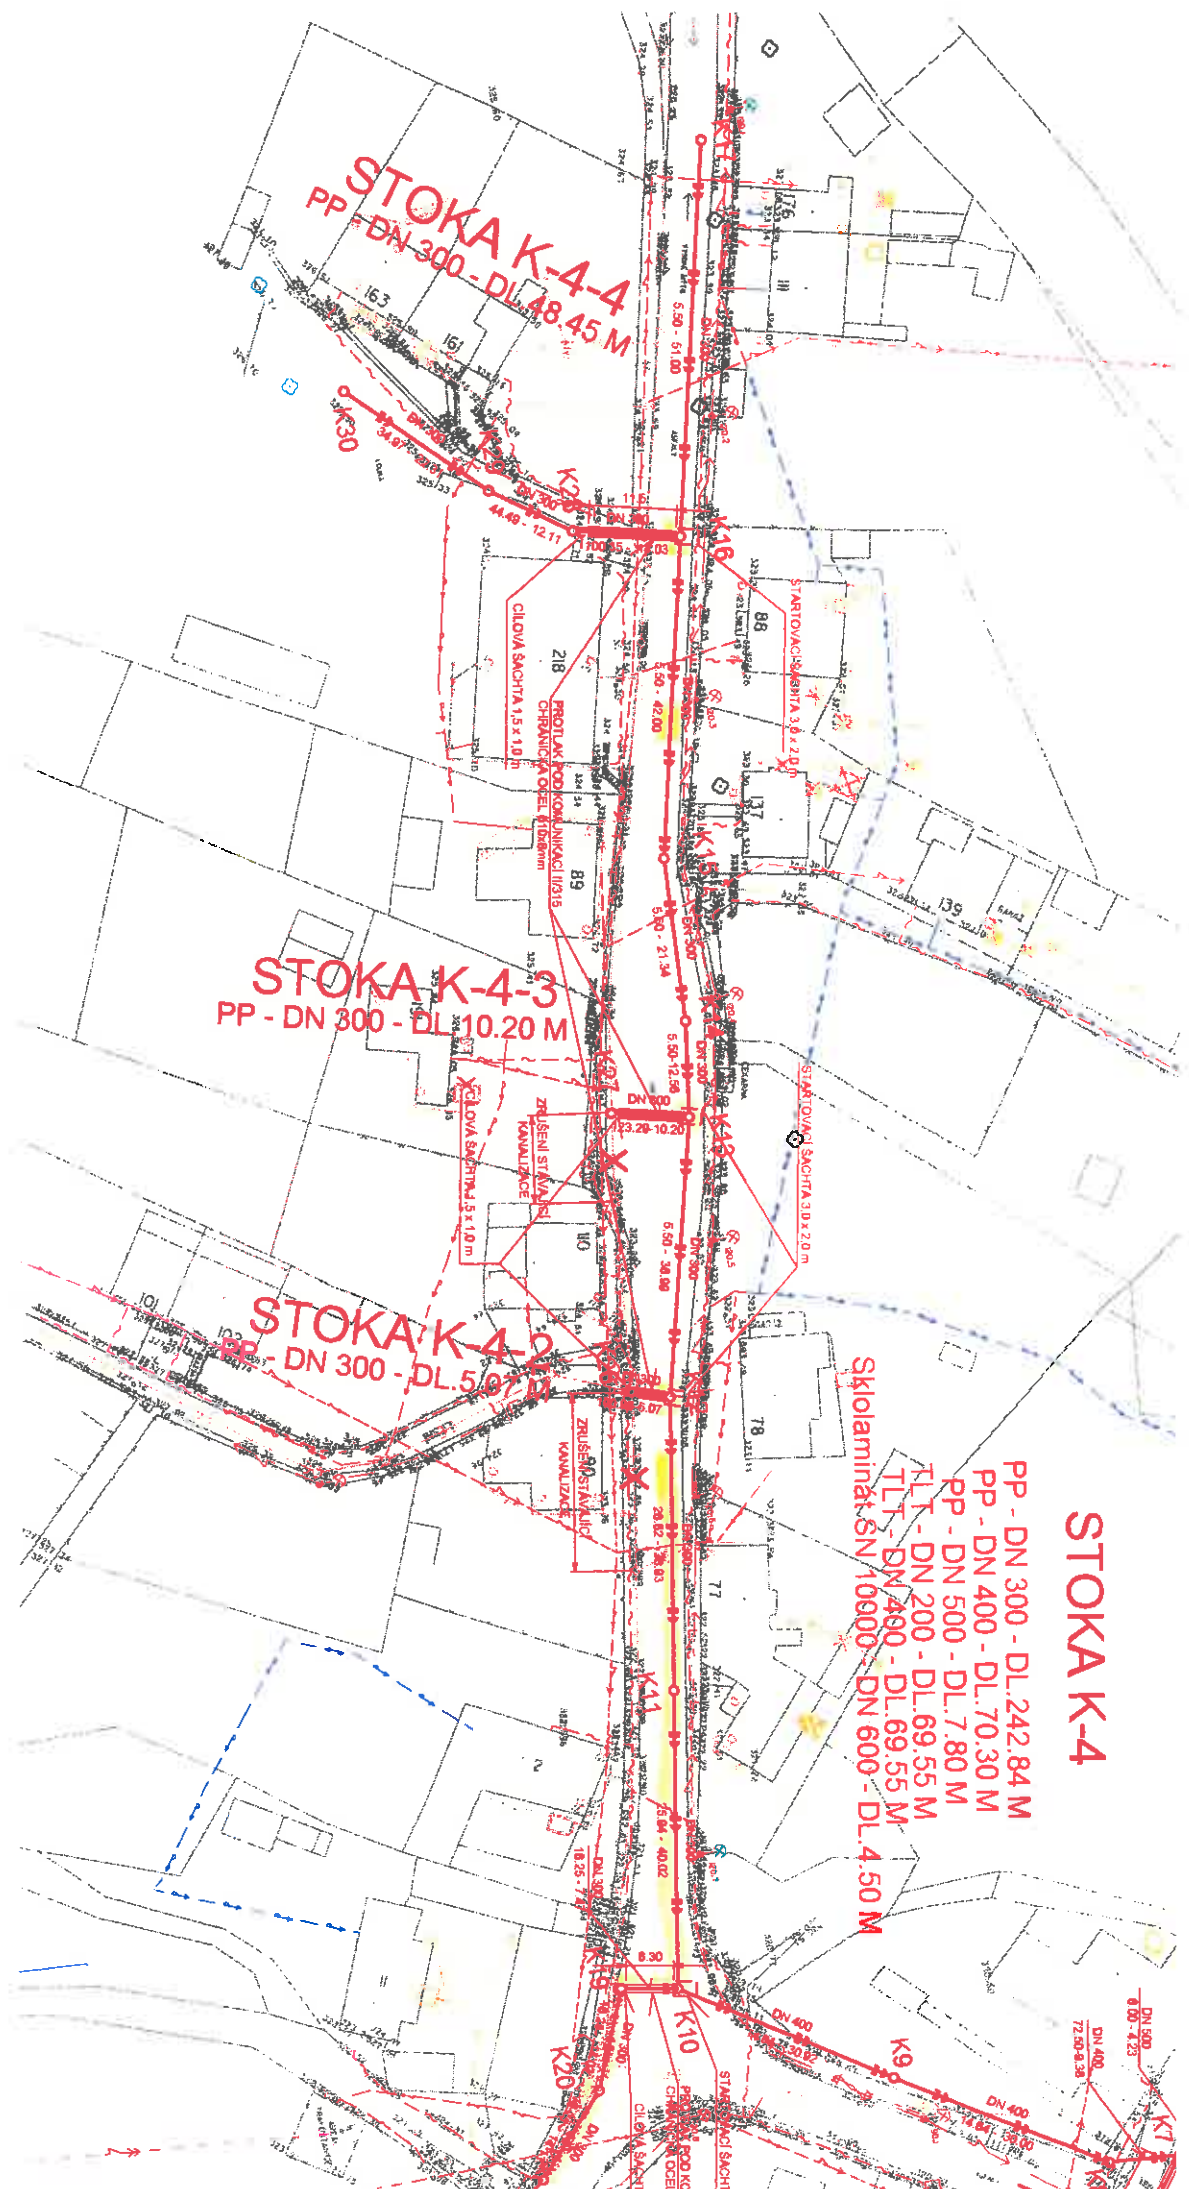

SO 1.11.1.1 - ZL.Č.1A-77 - SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV

Provizorní úprava povrchu K-4,K-4-1

Kód položky	Číslo ZL	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		SO 1.11.1 STOKY K-3, K-4				
		Přípravné a přidružené práce - živice				41 957,47
N 1A-77-1		Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.7 cm	m2	287,000	102,20	29 331,40
1.11.1 - 160		Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	51,430	139,30	7 164,20
1.11.1 - 161		Poplatek za recyklaci	t	51,430	106,20	5 461,87
		Komunikace				116 688,46
1.11.1 - 166		Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	287,000	26,50	7 605,50
1.11.1 - 187		Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 7 cm	m2	287,000	380,08	109 082,96
R		Rezerva pro nepředvídatelné práce	kpl	0,25	158 645,93	39 661,48
						198 307,41

ZL 8. 1A-77 - 80 1. m. 1

KOLNICE POLODA

Pol: H 1A-77-1 - FREZOVANÍ ŽIVOUŘETU TL. 70mm

Pol. 1. m. 1-157 - FREZ. KRATU $\varnothing_{min} \Rightarrow 73 \text{ kG/m}^2$

Pol. 70mm $\Rightarrow 73 \cdot \frac{70}{60} = \underline{\underline{102,20 \text{ kG/m}^2}}$



Správa a údržba silnic

Pardubického kraje

Ing. Ivetta Bouchalová
úsek majetkové správy
silniční správní technik

A.B.V. spol. s.r.o.
Vbová 655
562 01 Ústí nad Orlicí



V Ústí nad Orlicí dne 6.12.2013
Č.j. SÚSPK/2013/MS-ÚO/2311

vyřizuje: ivetta.bouchalova@suspk.cz

Věc: II/315 Kerhartice - Žádost k provizorní úpravě provedenou asfaltobetonem

Žádáme o provedení provizorní úpravy krytu vozovky po výkopu kanalizace v ulici Pražská, Kerhartice v potřebné tloušťce (5,0 – 7,0 cm) před zimním obdobím z důvodu bezpečnosti provozu na silnici – provést neprodleně.

S pozdravem

Ing. Ivetta Bouchalová
silniční správní technik



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031




(28)

Kontakní adresa:

Třebovská 333/II, 562 03 Ústí nad Orlicí

tel.: 465 500 722, 602 581 846, fax: 465 500 718



Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		ZL č. 1A-77	
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY			
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum:	
Odesláno/			
	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.11.1. – stoka K4,K-4-1	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:			
Důvod změny: Změna RDS			
Popis změny: Provizorní úprava povrchu – ul. Pražská.			
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny:			
	Vícepráce	156 855,05 Kč	
	Méněpráce	0,00 Kč	
	Celkem	156 855,05 Kč	
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí 10.11.2014 Datum:  156 00 Praha 8		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí 10.11.2014 Datum:  AQUA-PROCON s.r.o. divize Praha Dukelských hrdinů 12 170 00 Praha 7, ČR IČO: CZ460951	
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí 10.11.2014 Datum:  ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY d plus - projektová a inženýrská s.s. Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí 10.11.2014 Datum:  AQUA-PROCON s.r.o. divize Praha Dukelských hrdinů 12 170 00 Praha 7, ČR IČO: CZ460951	

SO 1.11.1 - ZL.Č.1A-77 - SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV

Provizorní úprava povrchu K-4,K-4-1

Kód položky	Číslo ZL	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	Vícepráce	Méněpráce
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SO 1.11.1 STOKY K-3, K-4						
		Přípravné a příslušné práce - živice						
1.11.1 - 157		Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.7 cm	m2	287,000	95,96	20 166,59	40 166,59	0,00
1.11.1 - 160		Vodorovná doprava suťi po suchu na skládku vč.uložení	t	51,430	139,30	27 540,52	27 540,52	0,00
1.11.1 - 161		Poplatek za recyklaci	t	51,430	106,20	7 164,20	7 164,20	0,00
		Komunikace						
1.11.1 - 186		Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	287,000	26,50	5 461,87	5 461,87	0,00
1.11.1 - 187		Betón asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 7 cm	m2	287,000	380,08	116 630,46	116 630,46	0,00
						7 605,50	7 605,50	0,00
						109 082,96	109 082,96	0,00
						156 855,05	156 855,05	0,00
