


Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list			ZL č. 1A-105
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY			
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.		Datum: 22.10.2014
Odesláno/			
předáno:			
Stavební objekt (provozní soubor):	SO 1.10 – Stoky N-23, N-24, N-25, V-1		
Odkazy:	na specifikaci:		
	na výkresy: Projektová dokumentace změny - RDS		
	na rozp. podklady: Výkaz výměr změny		
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny:			
Popis změny: Stoky N-23, N-24, N-25, V-1 – Na základě zjištěné skutečné hloubky kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 386, Sadová ul., bude nezbytné osadit šachtu se zpětnou klapkou na veřejnou část kanalizačního odbočení k zabránění případných škod vzduším odpadních vod do soukromého majetku p. Jiráska			
Součástí oznámení změny je: 1) Zápis v DVMP 2) Stanovisko projektanta 3) Zákres změn do PD 4) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny = plus 32 932,00 Kč bez DPH			
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : Datum:  22.10.2014		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí  Datum: 22.10.2014	
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí : ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY d plus - projektová a inženýrská s.s. Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc Datum: 22.10.2014		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 22.10.2014	

MO. UČS 1A ZS 1.30, 1.31, 1.32 - SDRUŽENÉ FILTRÉ PRO TECHNOLOGICKOU
A STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACI K ČS

ZÁDOST ZHOTOVITELE

Z DŮVODU PROSTOROVÝCH POŽADAVKŮ A JOPAZU NA KLADNICKÁ PRÁVA BUDĚ
PROVEDENO UVEDENÍ ROZVADĚČE PŘÍPOJKY NA/ A ROZVADĚČE RM
PRO TECHNOLOGICKOU INSTALACI SO JEDNOHO ODPUŠTĚNÉHO FILTRÉ. TÝKA SE
VŠECH ČERPAČÍCH STANIC V UČS 1A.

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ DENÍK PD A NÁVRH SHŘEDNĚNÉHO LISTU.

ZA OBJEDNATELE

ZA ČS ST

ZA ZHOTOVITELE

P. KNEP

P. ŠEDIVÝ

P. PAULÍČ

101. UČS 1A SO 1.10 - STOKA V-2

4.3.2014

ZÁDOST OBJEDNATELE

1) SKUTEČNOST - NA ZÁKLADĚ OBAM P. JIRÁSKA ŽE ZAPLATOVÁNÍ JEHO SLEDOVÁNÍ
PROSTOR PŘÍPADNĚ VEDENÍ VODY Z JINÝCH NEFUNKČNÍ ČERPAČÍ STANIC ČS
OBJEDNATEL OBJEDNAL UMÍSTĚNÍ DENÍKŮ ŠACHTY SE PŘÍPOJOU KLAPKOU NA
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY P. JIRÁSKA.

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ NÁVRH - NA ZÁKLADĚ ZUŠTĚDŮ SKUTEČNĚ VEDENÍ KANALIZAČNÍ
K UMÍSTOVNOSTI P. JIRÁSKA SADOVA OP. 3.66 JE NEZBYTNÉ OADIT PŘÍPOJOU KLAPKOU
NA VEDENÍM PŘÍP. KANALIZAČNÍHO OPOČENÍ A TUDĚ ZABRÁNĚNÍ PŘÍPADNĚ
POŠKOZENÍ NADSTĚHU 3. OSOBY.

2) Z DŮVODU SLEDOVÁNÍ OPRAVOVÝCH PRÁV A PŘÍKLADNĚ PRÁV V STAVADNÍ
KANALIZACI V UL. NA STRANĚ 1.30, JE NUTNÉ PROVEDENÍ ÚPRAV NA NOVĚ ZALOŽENOU
KANALIZACI STOKY V-2 VLOŽENÍM NOVÉ STADIŠTĚVÉ ŠACHTY.

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ NÁVRH SHŘEDNĚNÉHO LISTU.

ZA OBJEDNATELE

ZA ČS ST

ZA ZHOTOVITELE

P. KNEP

P. ŠEDIVÝ

P. PAULÍČ



**„Sdružení pro Ústí nad Orlicí-kanalizace a ČOV“
Ing. Pavel Kužela
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8**

Datum: 11.03.2014
Vyřizuje: Ing. Sana Bahor, 737 206 974

**Věc : Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV
1A – Ústí nad Orlicí - kanalizace
Stanovisko projektanta k ZL1A-105
SO 1.10 – Odbočka k č.p. 386**

Vážený pane,

na základě Vašeho požadavku Vám sdělujeme stanovisko projektanta k osazení zpětné klapky na odbočce k č.p. 386.


V průběhu provádění stavebních prací na stoce V-2 byla zjištěna skutečná hloubka uložení kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 386 v ul. Sadová odlišná od předpokládané hloubky, kterou v průběhu zpracování RDS měl projektant k dispozici na základě podkladu od majitele nemovitosti. Vzhledem k zjištění skutečné hloubky uložení kanalizační přípojky projevil majitel nemovitosti obavy ze zaplavování jeho sklepních prostorů zpětným vzdutím vody z ČS3 v případě její eventuální nefunkčnosti z důvodu výpadku el. energie nebo poruchy čerpadel na delší dobu.

Vzhledem k nově zjištěné skutečnosti bude nezbytné nutné osazení zpětné klapky na odbočce k č.p. 386 a tudíž zabránění případnému poškození majetku třetí osoby. Zpětná klapka bude umístěna v revizní šachtě na odbočce.

Zpracovatel ZDS ani RDS nemohl předpokládat odlišné uložení stávající přípojky od předpokladu.

Z výše uvedených důvodů s výše uvedenou změnou souhlasíme.


S pozdravem



AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 426 011
fax: +420 541 426 012
e-mail: info@aquaprocon.cz

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha
Tel.: +420 220 879 819
fax: +420 226 712 140
e-mail: info.praha@aquaprocon.cz

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
Brno-venkov č. ú.: 24301 641/0100
Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

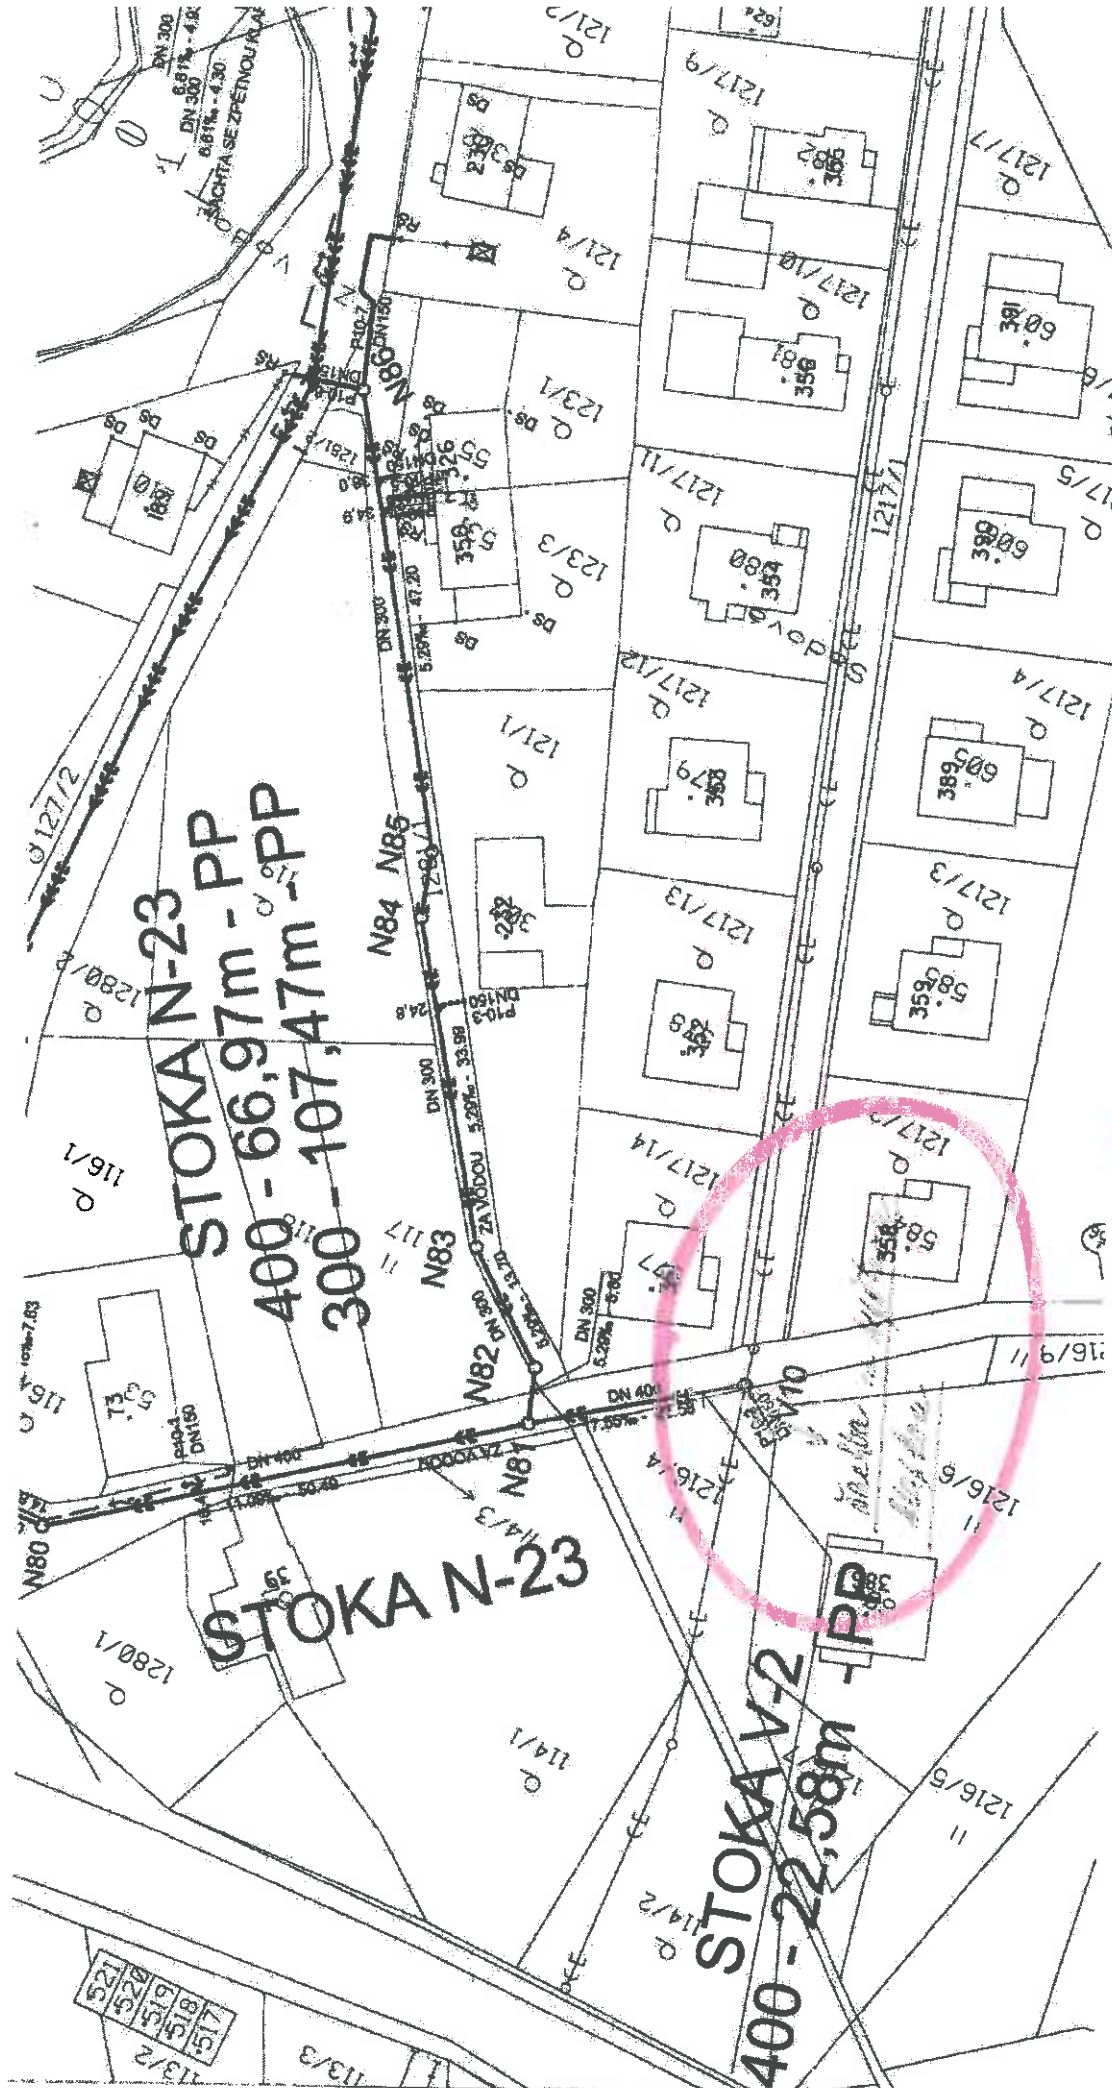

ZMĚNA RDS

VLOŽENÍ ŠACHTY SE ZPĚTNOU KUPKOU

ZL č. 1A-105 SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV

Šachta se zpětnou klapkou na kanalizační přípoje P10-2

Kód položky	Číslo ZL	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
		SO 1.10 STOKY N-23, N-24, N-25, V-1				32 932,00
		Šachty				32 932,00
		Trubní vedení				32 932,00
1.07 - 72		Šachta z betonových dílců pro DN 300 a DN 400 výška vstupu 2,1 m s monolitickým dnem vč. úpravy zhlaví šachty, na nátok do šachty je osazena zpětná klapka PE-HD se svislým talířem DN200	kus	1,000	26 345,60	26 345,60
R		Rezerva pro nepředvídatelné práce	kpl	0,250	26 345,60	6 586,40

Změnový list

ZL č. 1A-105

Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY

Komu: TEPVOS, spol. s r.o.

Datum:

Odesláno/

předáno:

Stavební objekt (provozní soubor): SO 1.10 – Stoky N-23, N-24, N-25, V-1

Odkazy:

na specifikaci:

na výkresy:

Projektová dokumentace změny - RDS

na rozp. podklady:

Výkaz výměr změny – kalkulace změny

na jinou část smlouvy:

ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:

Důvod změny: Změna RDS

Popis změny: Stoky N-23, N-24, N-25, V-1 – Na základě zjištěné skutečné hloubky kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 386, Sadová ul., bylo nezbytně nutné osadit šachtu se zpětnou klapkou na veřejnou část kanalizačního odbočení k zabránění případných škod vzduším odpadních vod do soukromého majetku p. Jiráska

Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny =
 Vícepráce plus 27 027,98 Kč bez DPH
 Méněpráce minus 0,00 Kč bez DPH
 Celkem plus 27 027,98 Kč bez DPH

Oznámení vydává: Sdružení „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“

Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.

Vyjádření dotčených:

Za zhotovitele: Souhlasí – nesouhlasí :

14. 11. 2014

Datum:

- Kanalizace a ČOV
 Poblíž 562 03
 186 00 Praha

Za projektanta: Souhlasí – nesouhlasí :

14. 11. 2014

Datum:

AQUA PROCON
 1

AQUA PROCON s.r.o.
 divize Praha
 Dukelských hrdinů 12
 170 00 Praha 7, ČR
 DIČ: CZ46964371

Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí :

14. 11. 2014

Datum:

ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV
 SPRÁVCE STAVBY

d plus - projektová a inženýrská s.s.
 Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc

Za objednatele: Souhlasí – nesouhlasí :

14. 11. 2014

Datum:

TEPVOS
 Třebotvská 287
 562 03 Ústí nad Orlicí 3
 IČ: 28944704 DIČ: CZ28944702

Stavba: Ústí nad Orlicí - kanalizace a čov

Stavba: Ústí nad Orlicí - kanalizace a čov

Změna šachty na spadišťovou

[illegible]
