

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		ZL č. 1A-19	
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY			
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum: 21.9. 2012	
Odesláno/			
	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.02 – Stoky B-1,BA, BB, BC, C	
Odkazy:	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny – provizorní úprava komunikace mezi C 17 a C 25	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny	
	na jinou část smlouvy:		

ZMĚNA – popis změny:

Popis změny: Stoky B-1,BA, BB, BC, C – provizorní úprava komunikace mezi C 17 a C 25

- Součástí oznámení změny je:
- 1) Zápis v deníku více a méněprací str.11, 6.9.2012
 - 2) Zápis o požadované změně z 19.9. 2012
 - 3) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny =
plus 88 471,52 Kč bez DPH
 - 4) Zákres v PD

Oznámení vydává: Sdružení „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“

Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.

Vyjádření dotčených:

Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – - Kanalizace a ČOV“ Datum: Pobřežní 667/78 186 00 Praha 8	Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 21.9.2012 AQUA PROCON s.r.o. divize Praha Dukelský hrdina 12 170 00 Praha 7 IČ: 0246964371
Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí : ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY d plus - projektová a inženýrská s.r.o. Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc Datum: 21.9.2012	Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 21.9.2012

ZL Č. 1A-19 - SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV

Kód položky	Číslo ZL	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.	2	SO 1.02 STOKA C-0 - Provizorní úprava komunikace	4.	5.	6.	7.
		STOKY				88 471,52
		Přípravné a příslušené práce				19 534,72
1.02 - 32	ZL č. 1A-19	Odstranění podkladu pl. 200 m2 kam. drčené tl. 20 cm	m2	51,500	23,90	1 230,85
1.02 - 33	ZL č. 1A-19	Odstranění podkladu nad 200 m2 kam. těžené tl. 20 cm	m2	51,500	19,90	1 024,85
1.02 - 36	ZL č. 1A-19	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	34,505	139,30	4 806,55
1.02 - 37	ZL č. 1A-19	Poplatek za skládku stavební suti	t	34,505	63,70	2 197,97
		Surf - živice				5 150,25
1.02 - 38	ZL č. 1A-19	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	51,500	99,50	5 124,25
1.02 - 40	ZL č. 1A-19	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 5 cm	m2	51,500	73,00	3 759,50
1.02 - 43	ZL č. 1A-19	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	5,665	139,30	789,13
1.02 - 44	ZL č. 1A-19	Poplatek za recyklaci	t	5,665	106,20	601,62
		OPRAVY STÁTNÍCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH				68 936,80
		Komunikace				68 936,80
1.02 - 190	ZL č. 1A-19	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	51,500	119,40	6 149,10
1.02 - 191	ZL č. 1A-19	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	51,500	159,20	8 198,80
1.02 - 192	ZL č. 1A-19	Podklad kamen. obal. asfaltem tl. 1 do 3 m, tl. 10 cm	m2	51,500	411,30	21 181,95
1.02 - 194	ZL č. 1A-19	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	51,500	26,50	1 364,75
1.02 - 195	ZL č. 1A-19	Beton asfalt. ABJ, ABS, ABH tl. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	51,500	278,60	14 347,90
R		Rezerva na nepředvídané práce				17 694,30

Stavba:

Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV

Ucelená část díla:

1A – kanalizace Ústí nad Orlicí

ZMĚNOVÝ LIST

Evidenční číslo:

ZL č.: 1A-19

Navrhovatel změny: zhotovitel

Objekt/úsek: SO 1.02

Odůvodnění:

SO 1.02 – stoka C

Z důvodu existence stávajícího vodovodu v profilu stoky C, jehož přeložka bude realizována až 04-05/2013, byla pro nemožnost dokončení rekonstrukce stoky C mezi šachtami C17 a C25 provedena provizorní oprava skladby komunikace.

Finanční dopad změny:

navýšení

úspora

bez finanč. vazby

Vyčíslení fin dopadu změny:

Vícepráce: + 70.777,22 Kč

Méněpráce: 0

Rozdíl: + 70.777,22 Kč

Náklady investora: + 70.777,22 Kč

Schvalovací proces: organizace/datum/jméno/doklad

Správce stavby:

Správce stavby se změnou souhlasí



Datum: 4.3.2013

Za správce stavby: Ing. Petr Očenášek

Manažer projektu/objednatel:

Se změnou souhlasím.

Datum:

Za manažera projektu: Ing. Václav Knejp

Datum konečného odsouhlasení:

Termín realizace: v průběhu realizace stavby

- Přílohy:
- návrh změnového listu
 - deník VMP – zápis č.18
 - kalkulace změny
 - výkresová část

Tato změna byla průběžně prověřována a aktualizována, po kompletaci řádně projednána. Po schválení jejích jednotlivých částí byla předána Zhotoviteli k fakturaci.

Datum:

Za Správce stavby : Ing. Petr Očenášek

Za zhotovitele stavby: Ing. Bronislav Hána

Stavba:

Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV

Ucelená část díla:

1A – kanalizace Ústí nad Orlicí

ZMĚNOVÝ LIST

Evidenční číslo:

ZL č.: 1A-19

Navrhovatel změny: zhotovitel

Objekt/úsek: SO 1.02

Odůvodnění:

SO 1.02 – stoka C

Z důvodu existence stávajícího vodovodu v profilu stoky C, jehož přeložka bude realizována až 04-05/2013, byla pro nemožnost dokončení rekonstrukce stoky C mezi šachtami C17 a C25 provedena provizorní oprava skladby komunikace.

Finanční dopad změny:

navýšení

úspora

bez finanč. vazby

Vyčíslení fin dopadu změny:

Vícepráce: + 70.777,22 Kč

Méněpráce: 0

Rozdíl: + 70.777,22 Kč

Náklady investora: + 70.777,22 Kč

Schvalovací proces: organizace/datum/jméno/doklad

Správce stavby:

Správce stavby se změnou souhlasí



Datum: 4.3.2013

Za správce stavby: Ing. Petr Očenášek

Manažer projektu/objednatel::

Se změnou souhlasím.

Datum:

Za manažera projektu: Ing. Václav Knejp

Datum konečného odsouhlasení:

Termín realizace: v průběhu realizace stavby

- Přílohy:
- návrh změnového listu
 - deník VMP – zápis č.18
 - kalkulace změny
 - výkresová část

Tato změna byla průběžně prověřována a aktualizována, po kompletaci řádně projednána. Po schválení jejích jednotlivých částí byla předána Zhotoviteli k fakturaci.

Datum:

Za Správce stavby : Ing. Petr Očenášek

Za zhotovitele stavby: Ing. Bronislav Hána

Stavba:

Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV

Ucelená část díla:

1A – kanalizace Ústí nad Orlicí

ZMĚNOVÝ LIST

Evidenční číslo:

ZL č.: 1A-19

Navrhovatel změny: zhotovitel

Objekt/úsek: SO 1.02

Odůvodnění:

SO 1.02 – stoka C

Z důvodu existence stávajícího vodovodu v profilu stoky C, jehož přeložka bude realizována až 04-05/2013, byla pro nemožnost dokončení rekonstrukce stoky C mezi šachtami C17 a C25 provedena provizorní oprava skladby komunikace.

Finanční dopad změny:

navýšení

úspora

bez finanč. vazby

Vyčíslení fin dopadu změny:

Vícepráce: + 70.777,22 Kč

Méněpráce: 0

Rozdíl: + 70.777,22 Kč

Náklady investora: + 70.777,22 Kč

Schvalovací proces: organizace/datum/jméno/doklad

Správce stavby:

Správce stavby se změnou souhlasí



Datum: 4.3.2013

Za správce stavby: Ing. Petr Očenášek

Manažer projektu/objednatel:

Se změnou souhlasím.

Datum:

Za manažera projektu: Ing. Václav Knejp

Datum konečného odsouhlasení:

Termín realizace: v průběhu realizace stavby

- Přílohy:
- návrh změnového listu
 - deník VMP – zápis č.18
 - kalkulace změny
 - výkresová část

Tato změna byla průběžně prověřována a aktualizována, po kompletaci řádně projednána. Po schválení jejich jednotlivých částí byla předána Zhotoviteli k fakturaci.

Datum:

Za Správce stavby : Ing. Petr Očenášek

Za zhotovitele stavby: Ing. Bronislav Hána

Příloha č.2 ZL

Kalkulace změny

ZL Č. 1A-19 - SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV

Kód položky	Číslo ZL	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	Více práce celkem Kč	Méně práce celkem Kč
1.02 - 32	ZL Č. 1A-19	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	51,500	23,90	1 230,85	1 230,85	0,00
1.02 - 33	ZL Č. 1A-19	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm	m2	51,500	19,90	1 024,85	1 024,85	0,00
1.02 - 36	ZL Č. 1A-19	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	34,505	139,30	4 806,55	4 806,55	0,00
1.02 - 37	ZL Č. 1A-19	Poplatek za skládku stavební suti	t	34,505	63,70	2 197,97	2 197,97	0,00
1.02 - 38	ZL Č. 1A-19	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	51,500	99,50	5 124,25	5 124,25	0,00
1.02 - 40	ZL Č. 1A-19	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 5 cm	m2	51,500	73,00	3 759,50	3 759,50	0,00
1.02 - 43	ZL Č. 1A-19	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	5,665	139,30	789,13	789,13	0,00
1.02 - 44	ZL Č. 1A-19	Poplatek za recyklaci	t	5,665	106,20	601,62	601,62	0,00
1.02 - 190	ZL Č. 1A-19	OPRAVY STÁTNÍCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH				51 242,50	51 242,50	0,00
1.02 - 191	ZL Č. 1A-19	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	51,500	119,40	6 149,10	6 149,10	0,00
1.02 - 192	ZL Č. 1A-19	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	51,500	159,20	8 198,80	8 198,80	0,00
1.02 - 194	ZL Č. 1A-19	Podklad kamen. obal. asfaltem tl. 1 do 3 m, tl. 10 cm	m2	51,500	411,30	21 181,95	21 181,95	0,00
1.02 - 195	ZL Č. 1A-19	Postřik živitný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	51,500	26,50	1 364,75	1 364,75	0,00
		Beton asfalt. ABJ, ABS, ABH tl. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	51,500	278,60	14 347,90	14 347,90	0,00

ZMĚNOVÝ LIST		Datum předložení	29.11.2012
Ev.č.	ZL č.1A-19 Zápis v DVMP č. 18 Zápis o úpravě povrchu	Datum schválení	
Objednatel	TEPVOS, spol. s r.o. (Třebovská 287, Ústí nad Orlicí)		
Správce stavby	d plus – projektová a inženýrská a.s. (Sokolovská 16/45, 186 00 Praha)		
Zhotovitel	„Sdružení pro Ústí nad Orlicí – kanalizace ČOV“		

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Část/ Objekt :	1A/SO 1.02	
Specifikace změny: Aktualizace výkazu výměr dle úprav provedených při tvorbě RDS		
Zdůvodnění změny: Viz příloha č.1		
Vícepráce obsažené v ZL:	70 777,22 Kč	
Méněpráce obsažené v ZL:	0 Kč	
Celkem rozdíl v rámci ZL:	70 777,22 Kč	

Přílohy:	Příloha č.1 – Zdůvodnění změny Příloha č.2 – Kalkulace změny Příloha č.3 – Výkresová část
----------	---

Podpis a razítko zhotovitele
..... Bronislav Hána
Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		Datum předložení	29.11.2012
Ev.č.	ZL č.1A-19 Zápis v DVMP č. 18 Zápis o úpravě povrchu	Datum schválení	
Objednatel	TEPVOS, spol. s r.o. (Třebovská 287, Ústí nad Orlicí)		
Správce stavby	d plus – projektová a inženýrská a.s. (Sokolovská 16/45, 186 00 Praha)		
Zhotovitel	„Sdružení pro Ústí nad Orlicí – kanalizace ČOV“		

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Část/ Objekt :	1A/SO 1.02	
Specifikace změny: Aktualizace výkazu výměr dle úprav provedených při tvorbě RDS		
Zdůvodnění změny: Viz příloha č.1		
Vícepráce obsažené v ZL:	70 777,22 Kč	
Méněpráce obsažené v ZL:	0 Kč	
Celkem rozdíl v rámci ZL:	70 777,22 Kč	

Přílohy:	Příloha č.1 – Zdůvodnění změny Příloha č.2 – Kalkulace změny Příloha č.3 – Výkresová část
----------	---

Podpis a razítko zhotovitele
..... Bronislav Hána
Datum:

Příloha č.1 ZL

Zdůvodnění změny

DENÍK +/- STAVBY ÚSTÍ N/0 - kanalizace A C

SD C. 1
STR. 11

18. ČÁST 1A - OBJEKT SO 1.02 - STOKA C
ŽÁDOST ZHOTOVITELE

0.9.12

Z DŮVODU EXISTENCE VODOVODNÍCH POTRUBÍ V
PŘÍTOČNÉM PROFILU STOKY C V ÚSEKU K KROKOVÁNÍ
KČ C 17 - KČ C 48 JE NUTNÉ STAVAT VODOVODY
DN 400, DN 250 A DN 80 NUTNO PŘELOŽIT.

ZHOTOVITEL KONSTATUJE, ŽE DANE PŘELOŽKY NEJSÚ
TECHNICKY SCHOPEN PROVÉST V ROCE DO KONCE
10/2012 (Z DŮVODU CUKACE VE STÁTNÍ KOMUNIKACI
III) A PRÁCE BUDE PROVÁDĚT AŽ V ROCE
2013/04/05.

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ REVIZI RPD A RL.

ZA OBJEDNATELE

P. KNEŽP

ZA SP. SE

P. ŠEODŮK

ZA ZHOTOVITELE

P. PAULIO

19. ČÁST 1A - OBJEKT SO 1.15 - OK 4 - SPADNÍ ŠAKA. 0.9.12
ŽÁDOST OBJEDNATELE:

NA ŽÁDOST OBJEDNATELE A Z DŮVODU NUTNOSTI
PROVEDENÍ PŘELOŽEK VN KABERU BUDE ROZVEDEN
KČ 1 SMĚREM K OK 4.

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ REVIZI RPD A RL.

ZA OBJEDNATELE

P. KNEŽP

ZA SP. SE

P. ŠEODŮK

ZA ZHOTOVITELE

P. PAULIO

ZÁPIS O ÚPRAVĚ POVRCHU V ULICI LÁZEŇSKÁ
Na základě místního šetření konaného dne 19.9.2012 v místě samém

Vzhledem k nemožnosti dokončení stoky C-0 mezi šachtami C17 a C25 v ulici Lázeňská v letošním roce bylo dohodnuto z důvodu kolize stoky se třemi vodovodními řadami DN65, DN250 a DN400 bude provedena provizorní oprava skladby komunikace v tomto složení:

- 5cm ABS
- 10cm OK
- 20cm DK 32-63
- 20cm ŠTP

Konečná úprava povrchu komunikace bude v tomto úseku provedena příští rok v měsíci dubnu nebo květnu (dle klimatických podmínek), tj. okamžitě po provedení přeložek výše uvedených vodovodních řadů.

Ve zbývající části ulice Lázeňská bude provedena konečná úprava povrchu komunikace do konce října letošního roku dle stávajících podmínek SÚS.

Níže uvedení účastníci s tímto řešením souhlasí.

SÚS Pardubického kraje: Radek Soukup, vedoucí odd. Ústí nad Orlicí

TEPVOS s.r.o. : Karel Pražák, investice

D-PLUS a.s. : Bohumil Ševčík, správce stavby

Sdružení Ústí nad Orlicí : Vlastimil Mrázek, hl. inženýr projektu

Martin Kujal, stavbyvedoucí

V Ústí nad Orlicí 2.10.2012



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dobruška 93
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

(29)

NA ÚSTÍM PŘISUZAL ZA F. KUBERTRAU ING. MIKULČEK

Příloha č.2 ZL

Kalkulace změny


ZL č. 1A-19 - SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV

Kód položky	Číslo ZL	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	Vícepráce celkem Kč	Méněpráce celkem Kč
1.02 - 32	ZL č. 1A-19	SO 1.02 STOKA C-0 - Provizorní úprava komunikace	m2	51,500	23,90	1 230,85	1 230,85	0,00
1.02 - 33	ZL č. 1A-19	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	51,500	19,90	1 024,85	1 024,85	0,00
1.02 - 36	ZL č. 1A-19	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm	t	34,505	139,30	4 806,55	4 806,55	0,00
1.02 - 37	ZL č. 1A-19	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	34,505	63,70	2 197,97	2 197,97	0,00
1.02 - 38	ZL č. 1A-19	Poplatek za skládku stavební suti						
1.02 - 40	ZL č. 1A-19	Surf - živice	m2	51,500	99,50	5 124,25	5 124,25	0,00
1.02 - 43	ZL č. 1A-19	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	51,500	73,00	3 759,50	3 759,50	0,00
1.02 - 44	ZL č. 1A-19	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 5 cm	t	5,665	139,30	789,13	789,13	0,00
		Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	5,665	106,20	601,62	601,62	0,00
		Poplatek za recyklaci						
1.02 - 190	ZL č. 1A-19	OPRAVY STÁTNÍCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH				51 242,50	51 242,50	0,00
1.02 - 191	ZL č. 1A-19	Komunikace				51 242,50	51 242,50	0,00
1.02 - 192	ZL č. 1A-19	Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	51,500	119,40	6 149,10	6 149,10	0,00
1.02 - 194	ZL č. 1A-19	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	51,500	159,20	8 198,80	8 198,80	0,00
1.02 - 195	ZL č. 1A-19	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl. 10 cm	m2	51,500	411,30	21 181,95	21 181,95	0,00
		Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	51,500	26,50	1 364,75	1 364,75	0,00
		Beton asfalt. ABJ, ABS, ABH tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	51,500	278,60	14 347,90	14 347,90	0,00

Příloha č.3 ZL

Výkresová část změny

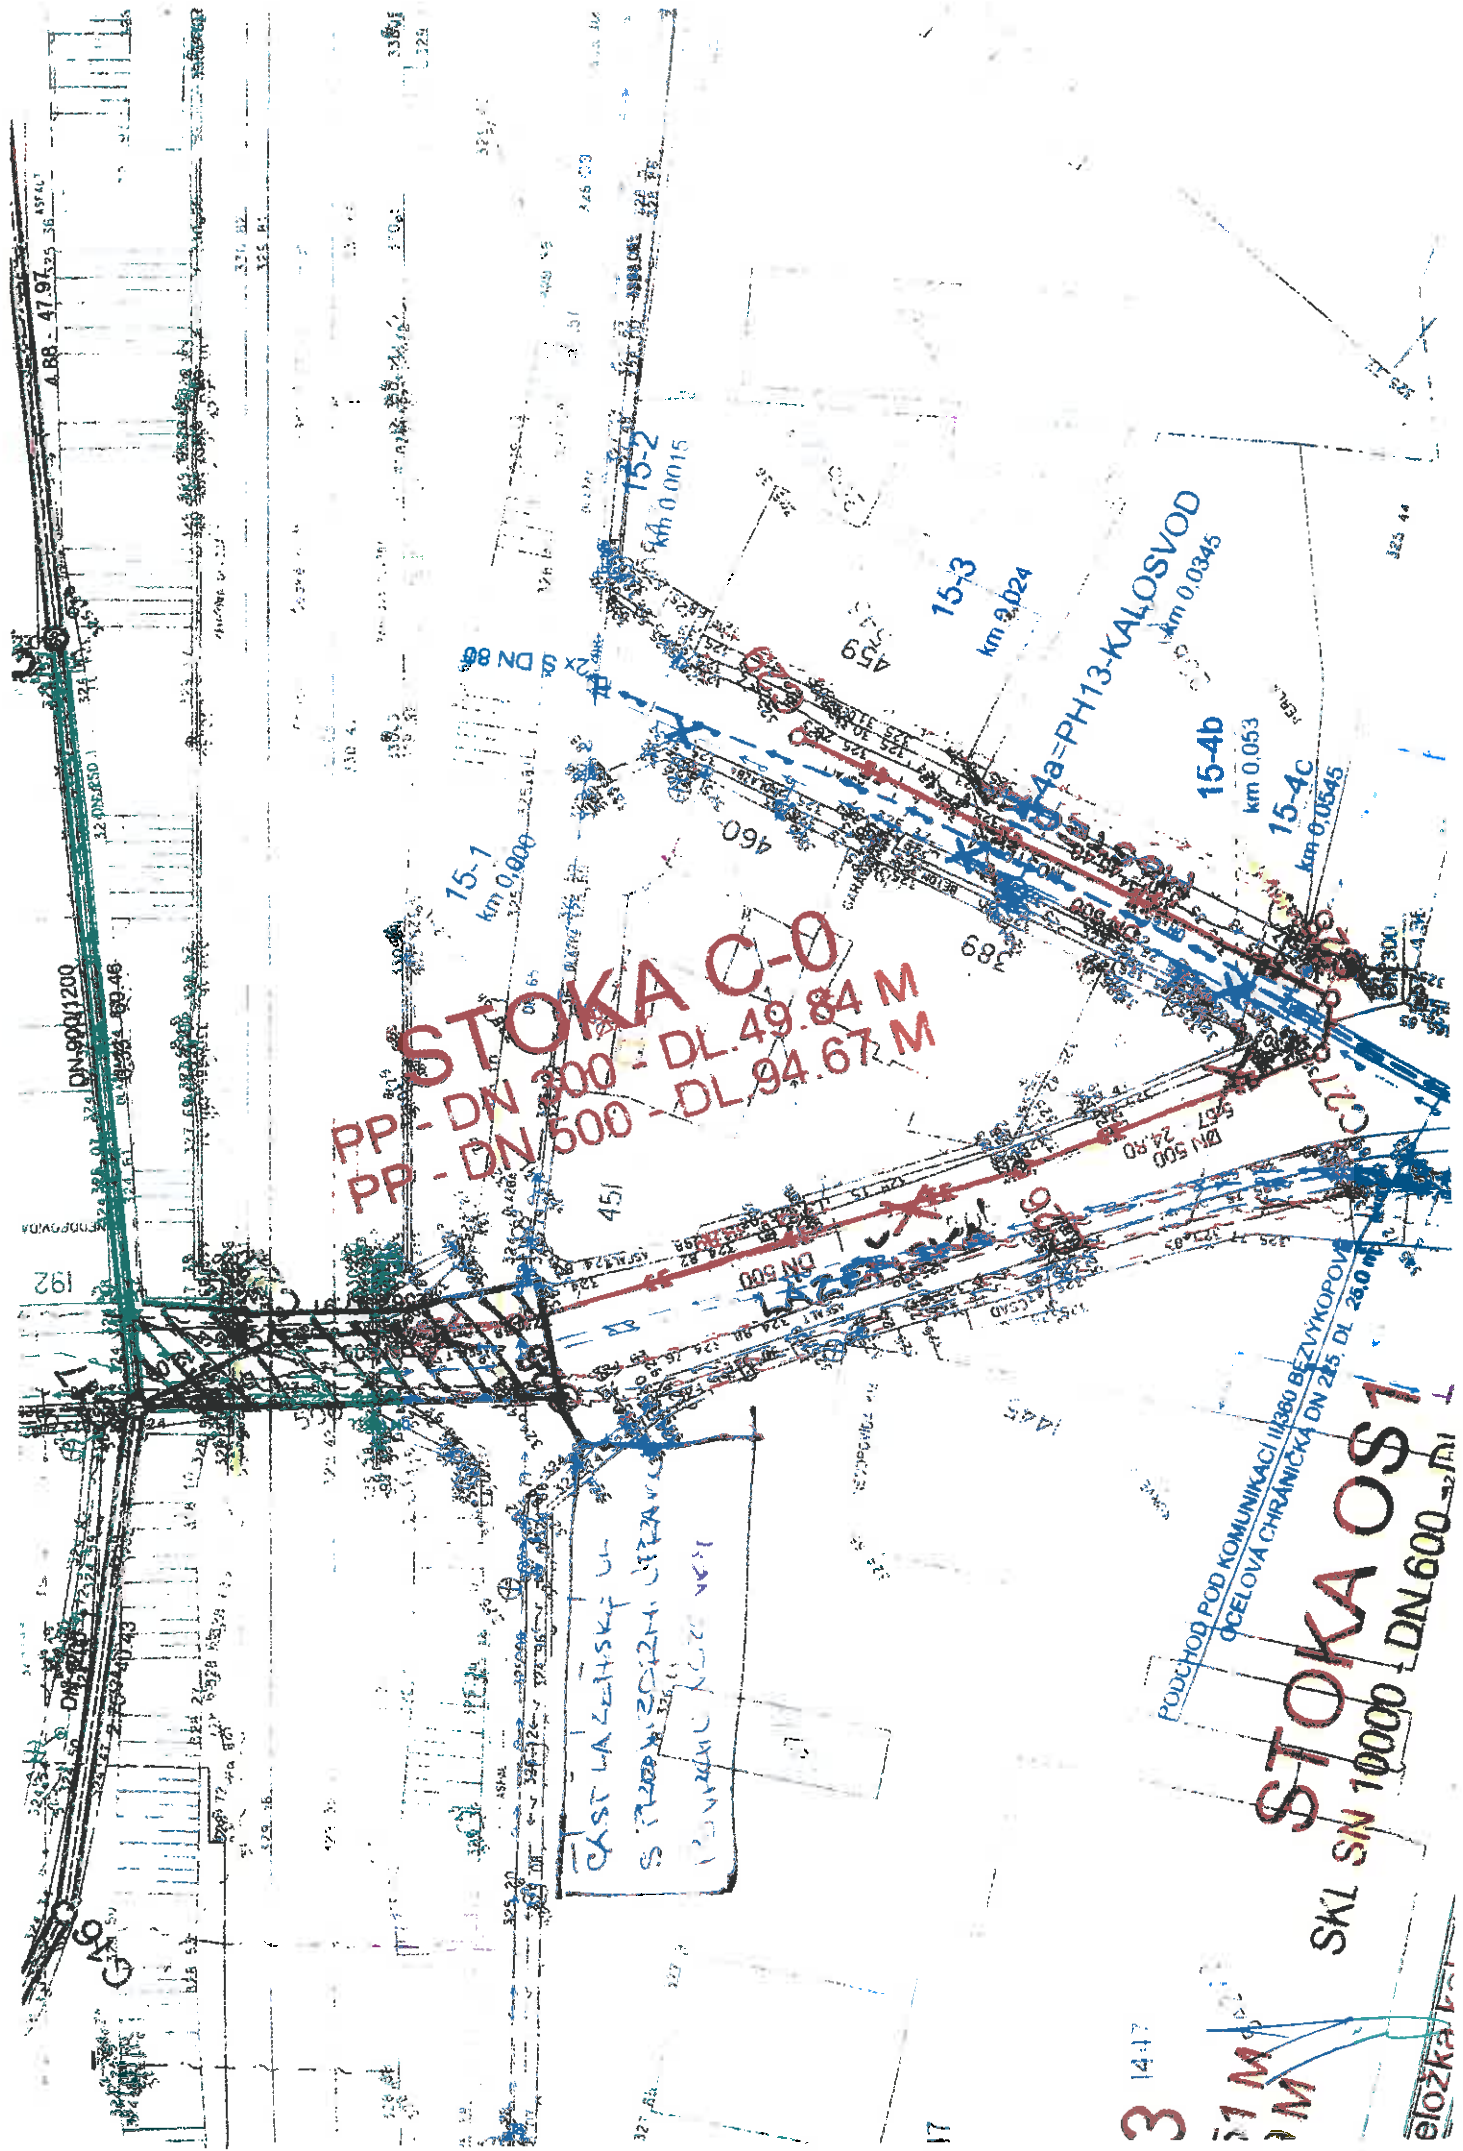

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		ZL č. 1A-19	
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY			
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum:	
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.02 – Stoky B-1,BA, BB, BC, C	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:			
Důvod změny: Rozdíl mezi ZDS a RDS			
Popis změny: Stoky B-1,BA, BB, BC, C – provizorní úprava komunikace mezi C 17 a C 25.			
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny =			
	Vícepráce	plus 70 777,22 Kč bez DPH	
	Méněpráce	0,00 Kč bez DPH	
	Celkem	plus 70 777,22 Kč bez DPH	
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
<i>Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.</i>			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí 14. 11. 2014 „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ Pobřežní 667/78 186 00 Praha 8		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí 14. 11. 2014 Datum:	
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY 14. 11. 2014 Datum: d plus - projektová a inženýrská s.s. Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí 14. 11. 2014 Datum:	

ZL č. 1A-19 - SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kód položky	Číslo ZL	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
		SO 1.02 STOKA C-0 - Provizorní úprava komunikace				70 777,22
		STOKY				19 534,72
		Přípravné a přidružené práce				9 260,22
1.02 - 32	ZL č. 1A-19	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam, drcené tl.20 cm	m2	51,500	23,90	1 230,85
1.02 - 33	ZL č. 1A-19	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam,těžené tl.20 cm	m2	51,500	19,90	1 024,85
1.02 - 36	ZL č. 1A-19	Vodorovná doprava suří po suchu na skládku vč. uložení	t	34,505	139,30	4 806,55
1.02 - 37	ZL č. 1A-19	Poplatek za skládku stavební suří	t	34,505	63,70	2 197,97
		Suť - živice				10 274,50
1.02 - 38	ZL č. 1A-19	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	51,500	99,50	5 124,25
1.02 - 40	ZL č. 1A-19	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	51,500	73,00	3 759,50
1.02 - 43	ZL č. 1A-19	Vodorovná doprava suří po suchu na skládku vč. uložení	t	5,665	139,30	789,13
1.02 - 44	ZL č. 1A-19	Poplatek za recyklaci	t	5,665	106,20	601,62
		OPRAVY STÁTNÍCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH				51 242,50
		Komunikace				51 242,50
1.02 - 190	ZL č. 1A-19	Podklad ze štěrku pl. po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	51,500	119,40	6 149,10
1.02 - 191	ZL č. 1A-19	Podklad ze štěrku tl. po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	51,500	159,20	8 198,80
1.02 - 192	ZL č. 1A-19	Podklad kamen. obal. asfaltem tl. 1 do 3 m,tl.10 cm	m2	51,500	411,30	21 181,95
1.02 - 194	ZL č. 1A-19	Posítk živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	51,500	26,50	1 364,75
1.02 - 195	ZL č. 1A-19	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tl. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	51,500	278,60	14 347,90
