

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “		
Změnový list č.		č.
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY		ZL č.1A-110
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum: -2. 09 2014
Odesláno/	předáno:	
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.15 stoky B, OS4, odlehčovací komora OK4
Odkazy:	na specifikaci:	RDS
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny
	na jinou část smlouvy:	
ZMĚNA – popis změny:		
Popis změny:		
SO 1.15 stoky B, OS4, odlehčovací komora OK4 – v průběhu realizace došlo k následujícím vícepracím:		
- Zajištění kabelů ČEZ při výkopových pracích podél OK4, RK1 a SP1 - Bourání septiku a dopojení kanalizace u vodovodního řadu 27 - Tlaková přípojka čp. 224 - Přeložka kabelu ČD u š.OS12 - Přeložka kabelu VO u š.OS12 - Oprava chodníku a komunikace u š.OS12 - Dopojení kanalizace u šachty OS12 - Bourání betonového základu (základ sloupu) - st.0,016 km - Bourání teplovodního kanálu u VÚB - st.0,129-0,135 km - Dešťová kanalizace pro čp. 224 + obnova kolizního místa na daném místě - st.0.076-0.132		
Nejvyšší cenový dopad změny: 1 175 728,66 Kč		
Součástí oznámení změny je:		
1) Rekapitulace kalkulace 2) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny 3) Stanovisko HIP 4) Zápis v deníku více / méně prací a stavebním deníku 5) Situace 6) Fotodokumentace		
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “		
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.		
Vydání dotčených:		
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí -2. 09 2014 Datum: „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – - Kanalizace a ČOV“ Febřežní 567/78 186 00 Praha 8	Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí -2. 09 2014 Datum: 	
Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí -2. 09 2014 Datum: d plus - projektová a inženýrská s.s. Jeremiášova 28, 700 00 Olomouc	Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí -2. 09 2014 Datum: 	

Rekapitulace

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.15 stoky B, OS4, odlehčovací komora OK4	ZL 1A-110	0,00 Kč	1 175 728,66 Kč	1 175 728,66 Kč
CELKEM		0,00 Kč	1 175 728,66 Kč	1 175 728,66 Kč

Pol.	vp / mp	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena rozdílu Kč
						1 175 728,66 Kč
SO 1.15 STOKY B, OS-4, ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4 - Zajištění kabelů ČEZ při výkopových pracích podél OK4, RK1 a SP1						49 936,76 Kč
	vp	Zemní práce				30 157,52 Kč
1.45.5 - 8	vp	VYTÝČENÍ TRATI KABELVEDENÍ Podél silnice	km	0,047	6 634,50	311,82 Kč
1.45.5 - 9	vp	SEJMUTÍ DRNU Nářez drnu, naložení, odvoz	m2	37,600	57,10	2 146,96 Kč
1.19001422	vp	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	47,000	240,00	11 280,00 Kč
1.15-7	vp	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	22,560	39,80	897,89 Kč
1.45.5 - 15	vp	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře 500mm, hloubka 800mm	m	47,000	132,70	6 236,90 Kč
1.45.5 - 17	vp	ZŘÍZENÍ KABELOVÉ Z PROSÁTÉ ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ Šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	47,000	37,20	1 748,40 Kč
1.45.5 - 18	vp	FOLIE VÝSTRAŽNÁ z PVC Šířka 33cm	m	47,000	15,90	747,30 Kč
1.45.5 - 20	vp	ZÁHOZ KABEL RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm, hloubka 700mm	m	47,000	66,30	3 116,10 Kč
1.45.5 - 21	vp	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	2,260	39,80	89,85 Kč
1.45.5 - 22	vp	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	11,300	21,20	239,56 Kč
1.45.5 - 23	vp	ÚPRAVA POVRCHU Položení drnu	m2	37,600	59,70	2 244,72 Kč
1.45.5 - 24	vp	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ Zemina třídy 3	m2	37,600	29,20	1 097,92 Kč
	vp	Přípravné a přídržné práce				6 995,25 Kč
1.15 - 35	vp	Vytrhání obrub chodníkůvých včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	47,000	119,40	5 611,80 Kč
1.15 - 36	vp	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	6,815	139,30	949,33 Kč
1.15 - 37	vp	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,815	63,70	434,12 Kč
	vp	Komunikace				12 784,00 Kč
1.15 - 115	vp	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	47,000	192,40	9 042,80 Kč
1.15 - 116	vp	Očištění výbour. obrubníků všech loží a výpíní	m	47,000	79,60	3 741,20 Kč
SO 1.15 STOKY B, OS-4, ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4 - Bourání septiku a dopojení kanalizace u vod. řadu 27						24 452,78 Kč
	vp	Bourání ve výkopu				14 900,03 Kč
1.15 - 45	vp	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	6,944	1 658,60	11 517,32 Kč
1.15 - 46	vp	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	3,472	4,00	13,89 Kč
1.15 - 47	vp	Vodorovné přemístění suti skládku vč. uložení	m3	6,944	345,00	2 395,68 Kč
1.15 - 48	vp	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,277	63,70	973,14 Kč
	vp	Dopojení kanalizace u vod. řadu 27 - st. 0.024-0,030 km				9 552,75 Kč
1.15 - 7	vp	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	1,200	39,80	47,76 Kč
1.15 - 10	vp	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	5,076	102,20	518,77 Kč
1.15 - 11	vp	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,324	942,10	305,24 Kč
1.15 - 16	vp	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	2,538	2,70	6,85 Kč
1.15 - 17	vp	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	0,162	4,00	0,65 Kč
1.15 - 21	vp	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	5,076	345,00	1 751,22 Kč
1.15 - 22	vp	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	0,324	345,00	111,78 Kč
1.15 - 23	vp	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,700	108,80	293,76 Kč
1.15 - 24	vp	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,700	106,20	286,74 Kč
1.15 - 25	vp	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	5,400	8,00	43,20 Kč
1.15 - 27	vp	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146, vhodné vytříděné zeminy z výkopů a recyklátů dle TP146	t	4,860	159,20	773,71 Kč
1.15 - 28	vp	Štěrkošek frakce 8-16	t	5,130	205,70	1 055,24 Kč
1.15 - 50	vp	Lože pod potrubí ze štěrkošku do 63 mm	m3	0,540	477,70	257,96 Kč
3.53 - 27	vp	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	6,000	42,50	255,00 Kč
3.53 - 30	vp	Montáž tvarovek jednos. z PVC a PP gum. kroužek DN 200	kus	2,000	272,00	544,00 Kč
3.53 - 40	vp	Kanalizační potrubí PVC DN 200 SN 8	m	6,558	456,50	2 993,73 Kč
3.53 - 43	vp	Koleno kanalizační PVC DN 200/90°	kus	2,030	151,30	307,14 Kč
	vp	SO 1.15 STOKY B, OS-4, ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4 - Přeložka ČEZ				163 487,38 Kč
Faktura Tepvos	vp	Přeložka realizovaná společností ČEZ	kpi	1,000	163 487,38	163 487,38 Kč
SO 1.15 STOKY B, OS-4, ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4 - Tlaková přípojka čp. 224						131 765,45 Kč
	vp	Zemní práce				50 933,35 Kč
1.15 - 4	vp	Dočasné zajištění potrubí	m	1,200	311,80	374,16 Kč
1.15 - 5	vp	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,200	252,10	302,52 Kč
1.15 - 6	vp	Sejmутí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,650	59,70	98,51 Kč
1.15 - 7	vp	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	11,230	39,80	446,95 Kč
1.15 - 10	vp	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	47,340	102,20	4 838,15 Kč
1.15 - 11	vp	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,020	942,10	2 845,14 Kč
1.15 - 12	vp	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	106,250	33,20	3 527,50 Kč
1.15 - 14	vp	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	106,250	9,30	988,13 Kč
1.15 - 16	vp	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	47,340	2,70	127,82 Kč
1.15 - 17	vp	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	3,020	4,00	12,08 Kč
1.15 - 19	vp	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	1,650	33,20	54,78 Kč
1.15 - 20	vp	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. naložení	m3	5,170	79,60	411,53 Kč
1.15 - 21	vp	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	42,180	345,00	14 552,10 Kč
1.15 - 22	vp	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	3,020	345,00	1 041,90 Kč
1.15 - 23	vp	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	35,390	108,80	3 850,43 Kč
1.15 - 24	vp	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	10,050	106,20	1 067,31 Kč
1.15 - 25	vp	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	16,500	8,00	132,00 Kč
1.15 - 26	vp	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osetí travním semenem	m2	16,500	37,20	613,80 Kč
1.15 - 27	vp	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146, vhodné vytříděné zeminy z výkopů a recyklátů dle TP146	T	31,900	159,20	5 078,48 Kč
1.15 - 28	vp	Štěrkošek frakce 8-16	T	18,650	205,70	3 836,31 Kč
1.15 - 29	vp	Štěrkoš, kamenivo 0-63	T	24,170	278,60	6 733,76 Kč

	vp	Přípravné a přidružené práce					3 514,04 Kč
1.15 - 31	vp	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	26,050	14,60		380,33 Kč
1.15 - 32	vp	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.dřené tl.20 cm	m2	26,050	23,90		622,60 Kč
1.15 - 36	vp	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	12,370	139,30		1 723,14 Kč
1.15 - 37	vp	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,370	63,70		787,97 Kč
	vp	Přípravné a přidružené práce - živice					14 719,99 Kč
1.15 - 39	vp	Odstanění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	26,050	73,00		1 901,65 Kč
1.15 - 40	vp	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	47,760	73,00		3 486,48 Kč
1.15 - 42	vp	Řezání stávajícího živického krytu tl. do 5 cm zalití styč.spar asfaltovou závlkou a posypem	m	43,420	92,90		4 033,72 Kč
1.15 - 41	vp	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	43,420	73,00		3 169,66 Kč
1.15 - 43	vp	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	8,670	139,30		1 207,73 Kč
1.15 - 44	vp	Poplatek za recyklaci	t	8,670	106,20		920,75 Kč
	vp	Podkladní a vedlejší konstrukce					7 356,21 Kč
1.15 - 50	vp	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	4,450	477,70		2 125,77 Kč
1.15 - 51	vp	Bloky pod potrubí B 12,5	m	0,450	3 264,20		1 468,89 Kč
2.07 - 42	vp	Bednění bloků pod potrubí	m	4,500	835,90		3 761,55 Kč
	vp	Trubní vedení					23 990,01 Kč
1.17 - 62	vp	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 40 mm vč.tvarovek	m	58,640	45,10		2 644,66 Kč
1.17 - 63	vp	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80 vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách	m	58,640	17,20		1 008,61 Kč
2.01 - 54	vp	Napojení do revizní šachty PŠ1, kompletní provedení	kus	1,000	9 222,00		9 222,00 Kč
2.03 - 44	vp	Napojení na stávající přípojku univerzální mechanickou spojkou min.PN10	kus	1,000	9 222,00		9 222,00 Kč
1.17 - 66	vp	Trubka tlaková PE HD (PE 100 RC) d 40 x 3,7 mm vč.tvarovek	m	59,520	31,80		1 892,74 Kč
	vp	Elektromontáže					1 477,73 Kč
2.01 - 62	vp	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 4	m	58,640	25,20		1 477,73 Kč
	vp	Zemní práce při montážích					932,38 Kč
2.01 - 63	vp	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	58,640	15,90		932,38 Kč
	vp	Komunikace					28 841,76 Kč
1.15 - 106	vp	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	26,050	119,40		3 110,37 Kč
1.15 - 108	vp	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	26,050	159,20		4 147,16 Kč
1.15 - 109	vp	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	26,050	252,10		6 567,21 Kč
1.15 - 110	vp	Postřik živický infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	26,050	29,20		760,66 Kč
1.15 - 111	vp	Postřik živický spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	47,760	26,50		1 265,64 Kč
15 - 112	vp	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	47,760	272,00		12 990,72 Kč
	vp	SO 1.15 STOKY B, OS-4, ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4 - Přeložka kabelu ČD u š.OS12					93 998,00 Kč
	vp	Zemní práce					79 932,00 Kč
1.05 - 5	vp	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	20,000	252,10		5 042,00 Kč
1.45.1 - 1	vp	Výkop a zához kabel.rýhy (původní trasa)	m	20,000	769,60		15 392,00 Kč
1.45.1 - 2	vp	Výkop a zához kabel.rýhy (nová trasa)	m	20,000	557,30		11 146,00 Kč
1.45.1 - 4	vp	Přenesení DK do nové trasy	m	20,000	849,20		16 984,00 Kč
1.45.1 - 5	vp	Položení žabové trasy	m	20,000	1 247,30		24 946,00 Kč
1.45.1 - 6	vp	Krytí výstražnou folií	m	20,000	321,10		6 422,00 Kč
	vp	Komunikace			15,90		14 066,00 Kč
1.45.1 - 10	vp	Kabelový žlab K2 13	m	20,000	703,30		14 066,00 Kč
	vp	SO 1.15 STOKY B, OS-4, ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4 - Přeložka kabelu VO u š.OS12					10 894,38 Kč
1.45.5 - 8	vp	VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ Podél silnice	km	0,021	6 634,50		139,32 Kč
1.05 - 5	vp	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	21,000	252,10		5 294,10 Kč
1.45.5 - 15	vp	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘIDY 3 Šíře 500mm hloubka 800mm	m	21,000	132,70		2 786,70 Kč
1.45.5 - 17	vp	ZŘÍZENÍ KABEL.ŁOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ Šíře do 65cm,tloušťka 5cm	m	21,000	37,20		781,20 Kč
1.45.5 - 18	vp	FOLIE VÝSTRAŽNÁ z PVC šířka 33cm	m	21,000	15,90		333,90 Kč
1.45.5 - 20	vp	ZÁHOZ KABEL. RÝHY-ZEMINA TŘ.3 Šíře 500mm,hloubka 700mm	m	21,000	66,30		1 392,30 Kč
1.45.5 - 21	vp	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	2,100	39,80		83,58 Kč
1.45.5 - 22	vp	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	10,500	21,20		222,60 Kč
	vp	SO 1.15 STOKY B, OS-4, ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4 - Oprava chodníku a komunikace u š.OS12					75 365,48 Kč
	vp	Zemní práce					23 172,28 Kč
113106152	vp	Rozebrání vozovky do 50m2 velké kostky	m2	41,250	58,30		2 404,88 Kč
113107131	vp	Odstanění podkladu pl.do 50 m2, bet.prostý tl. 15 cm	m2	45,900	442,00		20 287,80 Kč
113202111	vp	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	11,000	43,60		479,50 Kč
	vp	Komunikace					30 297,75 Kč
113114112	vp	Podkladový beton tř.P8J tl.100 mm	m2	41,250	297,00		12 251,25 Kč
1141111	vp	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	34,050	530,00		18 046,50 Kč
	vp	Doplňující práce na komunikaci					11 572,45 Kč
916111113	vp	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou (dvojlínka)	m	36,000	139,00		5 004,00 Kč
917461111	vp	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	263,00		2 893,00 Kč
919735113	vp	Řezání stávajícího živického krytu tl. 10 - 15 cm	m	18,000	95,20		1 713,60 Kč
979024442	vp	Očištění vybouraných chodníkových obrubníků	m	11,000	20,10		221,10 Kč
979071112	vp	Očištění vybour. kostek velkých s výplní MC	m2	41,250	42,20		1 740,75 Kč
	vp	Staveništní přesun hmot					3 664,60 Kč
998223011	vp	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	25,100	146,00		3 664,60 Kč
	vp	Přesuny suti a vybouraných hmot					6 658,40 Kč
1.15 - 90	vp	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na skládku vč.uložení	t	32,800	139,30		4 569,04 Kč
1.15 - 91	vp	Poplatek za skládkovné suti	t	32,800	63,70		2 089,36 Kč
	vp	SO 1.15 STOKY B, OS-4, ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4 - Doprojení kanalizace u šachty OS12					17 453,83 Kč
	vp	Zemní práce					6 953,85 Kč
1.15 - 23	vp	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,800	108,80		1 175,04 Kč
1.15 - 24	vp	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,400	106,20		573,48 Kč
1.15 - 27	vp	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146, vhodné vytyčičné zeminy z výkopů a recyklátů dle TP146	T	19,440	159,20		3 094,85 Kč
1.15 - 28	vp	Šterkopisek frakce B-16	T	10,260	205,70		2 110,48 Kč
	vp	Podkladní a vedlejší konstrukce					515,92 Kč
1.15 - 50	vp	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	1,080	477,70		515,92 Kč
	vp	Trubní vedení					9 984,06 Kč
3.53 - 27	vp	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	12,000	42,50		510,00 Kč
3.53 - 30	vp	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 200	kus	1,000	272,00		272,00 Kč
3.53 - 40	vp	Kanalizační potrubí PVC DN 200 SN 8	m	13,116	456,50		5 987,45 Kč
N 1A-6-9	vp	Koleno kanalizační PVC DN 200/45°	kus	1,015	3 167,10		3 214,61 Kč
	vp	SO 1.15 STOKY B, OS-4, ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4 -Bourání bet.základu (žb základ sloupů) - st.0,016 km					26 611,44 Kč
	vp	Bourání ve výkopu					26 611,44 Kč

1.15 - 45	vp	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	12,402	1 658,60	20 569,96 Kč
1.15 - 46	vp	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	6,201	4,00	24,80 Kč
1.15 - 47	vp	Vodorovné přemístění suti skládku vč. uložení	m3	12,402	345,00	4 278,69 Kč
1.15 - 48	vp	Poplatek za skládku stavební suti	t	27,284	63,70	1 737,99 Kč
	vp	SO 1.15 STOKY B, OS-4, ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4 - Bourání teplovodního kanálu u VÚB - st.0,129-0,135 km				7 507,26 Kč
	vp	Bourání ve výkopu				5 407,26 Kč
1.15 - 45	vp	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	2,520	1 658,60	4 179,67 Kč
1.15 - 46	vp	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	1,260	4,00	5,04 Kč
1.15 - 47	vp	Vodorovné přemístění suti skládku vč. uložení	m3	2,520	345,00	869,40 Kč
1.15 - 48	vp	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,544	63,70	353,15 Kč
	vp	Ostatní práce - odstranění stáv.potrubí				2 100,00 Kč
N1A-110-1	vp	HZS - dělník	hod	6,000	350,00	2 100,00 Kč
	vp	SO 1.15 STOKY B, OS-4, ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4 - Dešťová kanalizace pro čp.224 + obnova kolizního místa na daném místě - st.0.076-0.132 km				320 512,03 Kč
	vp	SO 1.15 STOKY B, OS-4, ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4 - Bourání bet.základu - st.0,016 km				228 827,88 Kč
	vp	Zemní práce				52 078,84 Kč
1.15 - 10	vp	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	51,648	102,20	5 278,43 Kč
1.15 - 11	vp	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,297	942,10	3 106,10 Kč
1.15 - 16	vp	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	25,824	2,70	69,72 Kč
1.15 - 17	vp	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	1,649	4,00	6,60 Kč
1.15 - 21	vp	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	51,648	345,00	17 818,56 Kč
1.15 - 22	vp	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	3,297	345,00	1 137,47 Kč
1.15 - 23	vp	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	29,970	108,80	3 260,74 Kč
1.15 - 24	vp	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	24,975	106,20	2 652,35 Kč
1.15 - 25	vp	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	49,950	8,00	399,60 Kč
1.15 - 27	vp	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146, vhodné vytříděné zeminy z výkopů a recyklatů dle TP146	T	53,946	159,20	8 588,20 Kč
1.15 - 28	vp	Štěrkopisek frakce 8-16	T	47,453	205,70	9 761,08 Kč
	vp	Přípravné a přidružené práce				6 057,72 Kč
1.15 - 33	vp	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	43,200	19,90	859,68 Kč
1.15 - 34	vp	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	43,200	23,90	1 032,48 Kč
1.15 - 36	vp	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	20,520	139,30	2 858,44 Kč
1.15 - 37	vp	Poplatek za skládku stavební suti	t	20,520	63,70	1 307,12 Kč
	vp	sut - živice				10 132,96 Kč
1.15 - 38	vp	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	43,200	99,50	4 298,40 Kč
1.15 - 41	vp	Řezání stávajícího živitního krytu tl. do 5 cm	m	55,000	73,00	4 015,00 Kč
1.15 - 43	vp	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	7,819	139,30	1 089,19 Kč
1.15 - 44	vp	Poplatek za recyklaci	t	7,819	106,20	830,38 Kč
	vp	Podkladní a vedlejší konstrukce				2 386,11 Kč
1.15 - 50	vp	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	4,995	477,70	2 386,11 Kč
	vp	Bourání ve výkopu				22 893,10 Kč
N 1A-110-2	vp	Vytřídění stáv. bet. potrubí DN 400	m	26,500	790,47	20 947,45 Kč
1.15 - 46	vp	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	1,997	4,00	7,99 Kč
1.15 - 47	vp	Vodorovné přemístění suti skládku vč. uložení	m3	3,994	345,00	1 377,93 Kč
1.15 - 48	vp	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,787	63,70	559,73 Kč
	vp	Trubní vedení				123 143,61 Kč
3.53-27	vp	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	14,500	42,50	616,25 Kč
3.15 - 40	vp	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 300	m	41,000	47,80	1 959,80 Kč
3.53 - 30	vp	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 200	kus	3,000	272,00	816,00 Kč
3.53 - 30	vp	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 300	kus	11,000	272,00	2 992,00 Kč
3.53 - 31	vp	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300	kus	2,000	378,20	756,40 Kč
N1A-201	vp	Nápojení kan. přípojky na stáv. potrubí ze SKL DN 1600	kus	1,000	8 900,00	8 900,00 Kč
1.15 - 65	vp	Kamerové zkoušky	m	53,500	69,00	3 629,50 Kč
1.15 - 79	vp	Zaplnění stáv. potrubí a šachet poplilkocementovou suspenzí	m3	1,821	1 738,20	3 165,26 Kč
1.05 - 137	vp	Výšková úprava stáv.vpustí	kus	1,000		0,00 Kč
N 1A -16 -4	vp	Kanalizační potrubí PVC DN 200 SN 8	m	15,849	586,84	9 300,83 Kč
11.2 - 58	vp	Kanalizační potrubí PVC DN 300 SN 8	m	44,813	907,60	40 672,28 Kč
3.53 - 43	vp	Koleno kanalizační PVC DN 200/30°	kus	3,045	151,30	460,71 Kč
N 1A-6-9	vp	Koleno kanalizační PVC DN 300/15°	kus	4,060	3 167,10	12 858,43 Kč
N 1A-6-9	vp	Koleno kanalizační PVC DN 300/30°	kus	2,030	3 167,10	6 429,21 Kč
N 1A-6-9	vp	Koleno kanalizační PVC DN 300/45°	kus	2,030	3 167,10	6 429,21 Kč
N 1A-110-3	vp	Přesuvka kanalizační PVC DN 300 KGU	kus	2,030	467,00	948,01 Kč
N 1A-110-4	vp	Přechod kanalizační PVC DN 300/200	kus	1,015	563,00	571,45 Kč
1A-26 - 1	vp	Odbočka kanalizační PVC DN 300/200	kus	1,015	4 636,84	4 706,39 Kč
1A-26 - 1	vp	Odbočka kanalizační PVC DN 300/300	kus	1,015	4 636,84	4 706,39 Kč
N 1A-110-5	vp	Odbočka kanál.nalepovací Hobas 1600/300 KG - 90° (vč.dopravy)	kus	1,015	12 833,00	13 025,50 Kč
	vp	Komunikace				12 035,52 Kč
1.15 - 93	vp	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	43,200	119,40	5 158,08 Kč
1.15 - 95	vp	Podklad ze štěrkorotit po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	43,200	159,20	6 877,44 Kč
	vp	SO 1.15 STOKY B, OS-4, ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4 - Obnova kolizního místa stáv.kan.na daném místě				65 465,76 Kč
	vp	Zemní práce				12 759,90 Kč
1.15 - 10	vp	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	12,690	102,20	1 296,92 Kč
1.15 - 11	vp	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,810	942,10	763,10 Kč
1.15 - 16	vp	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	6,345	2,70	17,13 Kč
1.15 - 17	vp	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	0,405	4,00	1,62 Kč
1.15 - 21	vp	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	12,690	345,00	4 378,05 Kč
1.15 - 22	vp	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	0,810	345,00	279,45 Kč
1.15 - 23	vp	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,750	108,80	734,40 Kč
1.15 - 24	vp	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,750	106,20	716,85 Kč

1.15 - 27	vp	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146, vhodné vytříděné zeminy z výkopů a recyklatů dle TP146	T	12,150	159,20	1 934,28 Kč
1.15 - 28	vp	Štěrkopek frakce 8-16	T	12,825	205,70	2 638,10 Kč
	vp	Přípravné a přidružené práce				1 893,14 Kč
1.15 - 33	vp	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.20 cm	m2	13,500	19,90	268,65 Kč
1.15 - 34	vp	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	13,500	23,90	322,65 Kč
1.15 - 36	vp	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	6,413	139,30	893,33 Kč
1.15 - 37	vp	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,413	63,70	408,51 Kč
	vp	sut - živice				4 198,95 Kč
1.15 - 38	vp	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	13,500	99,50	1 343,25 Kč
1.15 - 41	vp	Řezání stávajícího živického krytu tl. do 5 cm	m	30,900	73,00	2 255,70 Kč
1.15 - 43	vp	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2,444	139,30	340,45 Kč
1.15 - 44	vp	Poplatek za recyklaci	t	2,444	106,20	259,55 Kč
	vp	Podkladní a vedlejší konstrukce				7 254,90 Kč
1.15 - 50	vp	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	1,350	477,70	644,90 Kč
1.15 - 51	vp	Desky podkladní pod potrubí C12/15	m3	2,025	3 264,20	6 610,01 Kč
	vp	bourání ve výkopu				1 566,23 Kč
1132011R	vp	Vytrhání stáv.potrubí DN 200	m	15,000	89,12	1 336,80 Kč
1.15 - 46	vp	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	0,236	4,00	0,94 Kč
1.15 - 47	vp	Vodorovné přemístění suti skládku vč.uložení	m3	0,471	345,00	162,50 Kč
1.15 - 48	vp	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,036	63,70	65,99 Kč
	vp	Trubní vedení				34 031,53 Kč
3.53-27	vp	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	15,000	42,50	637,50 Kč
N 1A-10-1	vp	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 200	kus	1,000	240,85	240,85 Kč
N1A-201	vp	Napojení kan.připojky na stáv.potrubí ze SKL DN 1600	kus	1,000	8 900,00	8 900,00 Kč
1.15 - 65	vp	Kamerové zkoušky	m	15,000	69,00	1 035,00 Kč
N 1A-16-4	vp	Kanalizační potrubí PVC DN 200 SN 8	m	16,395	586,84	9 621,24 Kč
N 1A-110-4	vp	Přechod kanalizační PVC DN 300/200	kus	1,015	563,00	571,45 Kč
N 1A-110-5	vp	Odbočka kanál.nalepovací Hobas 1600/300 KG - 90° (vč.dopravy)	kus	1,015	12 893,00	13 025,50 Kč
	vp	Komunikace				3 761,10 Kč
1.15 - 93	vp	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	13,500	119,40	1 611,90 Kč
1.15 - 95	vp	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	13,500	159,20	2 149,20 Kč
	vp	SO 1.15 STOKY B, OS-4, ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4 - Zajištění kabelů za prádelnou - st.0.009-0.113 km				26 218,40 Kč
	vp	Zemní práce				26 218,40 Kč
1.15 - 5	vp	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	104,000	252,10	26 218,40 Kč
	R	Rezerva	kpi	0,250	922 124,12	230 531,03 Kč
	vp	Všeobecné položky				23 073,51 Kč
3	vp	Realizační dokumentace	kpl	0,922	19 134,68	17 644,45 Kč
11	vp	Dokumentace skutečného provedení	kpl	0,922	5 887,59	5 429,06 Kč

Výpočet - bourání bet.základu - st.0,016 km

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství
	Bourání ve výkopu		
1.15 - 45	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	12,402
1.15 - 46	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	6,201
1.15 - 47	Vodorovné přemístění suti skládku vč.uložení	m3	12,402
1.15 - 48	Poplatek za skládku stavební suti	!	27,284
	Bourání ve výkopu celkem :		

dl.	š.	hl.	celkem
základ (3,0x3,0x0,8), sloup (1,7x1,8x1,7)			12,402
12,402	2,000		6,201
12,402		2,200	12,402
			27,284

Výpočty - bourání septiku a šachty u vod.řadu 27 - st.0.029 km

Řídek poř.	Práce	Jednotka	Množství
	Bourání ve výkopu		
1.15 - 45	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	6,944
1.15 - 46	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	3,472
1.15 - 47	Vodorovné přemístění suti skládku vč.uložení	m3	6,944
1.15 - 48	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,277
	Bourání ve výkopu celkem :		
	CELKEM za "Bourání septiku a šachty u vod.řadu 27"		
2)	Dopojení kanalizace u vod.řadu 27 - st.0.024-0,030 km, datum zápisu ve SD 7.10.2014		
	Zemní práce		
1.15 - 7	Příplatek za ztižené hloubení v blízkosti vedení	m3	1,200
1.15 - 10	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	5,076
1.15 - 11	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,324
1.15 - 16	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	2,538
1.15 - 17	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	0,162
1.15 - 21	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	5,076
1.15 - 22	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	0,324
1.15 - 23	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,700
1.15 - 24	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,700
1.15 - 25	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	5,400
1.15 - 27	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146, vhodné vytříděné zeminy z výkopů a recyklátů dle TP146	T	4,860
1.15 - 28	Štěrkopisek frakce 8-16	T	5,130
	Zemní práce celkem :		
	Podkladní a vedlejší konstrukce		
1.15 - 50	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	0,540
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :		

dl.	š.	hl.	celkem
šachta (2,0x1,2x1,7), tl.stěn 0,4 m,			
dno a čelo septiku (1,8x1,7x2) tl.stěn			
0,2 m			
	6,944	2,000	6,944
			3,472
			6,944
	6,944	2,200	15,277



FAKTURA

nedaňový doklad / var.symbol 9126150753

List 1

DODAVATEL

ČEZ Distribuce, a. s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly

IČ: 24729035 | DIČ: CZ24729035

Bankovní spojení: 000035-4544580267/0100

IBAN: CZ7601000000354544580267, BIC: KOMBCZPP

Forma úhrady: Převodní příkaz

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

TEPVOS, spol. s r.o.

Třebovská 287,

Ústí nad Orlicí

562 03

Česká republika

ODBĚRATEL

TEPVOS, spol. s r.o.

Třebovská 287,

562 03 Ústí nad Orlicí

IČ: 25945793 | DIČ: CZ25945793

ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO	0010858005
ČÍSLO OBJEDNÁVKY	Z_S24-12_8120035022
ČÍSLO ZAKÁZKY	1210145085
DATUM SPLATNOSTI	13. 09. 2013
DATUM VYSTAVENÍ	30. 08. 2013
DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ	

REKAPITULACE	DPH	Základ DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Zdanitelné plnění	0.00 %	155.702,27	0,00	155.702,27
Uhrazená záloha	0.00 %	-156.534,00	0,00	-156.534,00
ROZDÍL	0.00 %	-831,73	0,00	-831,73
CELKEM K VRÁCENÍ				-831,73

Fakturuje vám konečné náklady za realizaci přeložky č. EP-12-2001813, Ústí nad Orlicí, TEPVOS - přeložka KVN, bez věcných břemen. Vyúčtování věcných břemen bude provedena po zavedení do katastru nemovitostí, až budou známy jejich skutečné náklady.

Žádáme Vás o přesné dodržování variabilního symbolu 9126150753 při úhradě. Při chybném použití variabilního symbolu se vystavujete nebezpečí, že platba nebude správně přiřazena k evidované pohledávce.

DETAILNÍ PŘEHLED FAKTUROVANÝCH ÚDAJŮ

Pol.	Předmět fakturace	Množství MJ	Cena/jedn. (Kč)	DPH	Částka (Kč)
10	6000056530 ZHOTOVENÍ PŘELOŽKY	1,000JV	155.702,27	0 %	155.702,27
	Číslo zakázky: 1210145085				

V případě prodlení s plněním zaplatí dlužník úrok ve výši určené ve smlouvě, jinak ve výši dané zákonem.

Cena stanovena dle zákona 526/90Sb. o cenách.

FAKTURA

$$155\,702,27 \times 1,05 = 163\,487,38$$

Vystavil: Jana Plánková, tel.: + 420 592 111 594, e-mail: jana.plankova@cez.cz

Vyřizuje: Markéta Helbichová, tel.: + 420 462 113 181, e-mail: marketa.helbichova@cezdistribuce.cz

		Tepvos, spol. s r.o.	
Došlo:		- 2 - 09 - 2013	
Č.j.: 3003/2013		Starační znak:	
Počet listů: 1		Starační číslo:	
Počet listů příloh: -		Spisový znak:	



ক. প্রাচীন

	Tepvos, spol. s r.o.
Datum:	19-07-2013
Číslo:	Skartiční znak:
Počet listů:	Skartiční číslo:
Počet listů příloh:	Spisový znak:



D0000000100487064308

TEPVOS, spol. s r.o.

Třebovská 287

Ústí nad Orlicí

562 03

VÁŠ DOPIS ZNAČKY
001042868453

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

František Dvořák / 840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Plzeň 17. 7. 2013

Ukončení realizace stavby - – Ústí nad Orlicí ,TEPVOS - přeložka kVN

Vážená zákaznice/Vážený zákazník,

dovolujeme si Vás informovat, že jsme dne 9. 7. 2013 dokončili realizaci přeložky podle smlouvy Z_S24_12_ V krátké době od nás obdržíte konečné vyúčtování nákladů za přeložku distribučního zařízení.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na náš Zákaznické lince 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Při hovoru s operátorem uvádějte prosím naši značku ze záhlaví dopisu.

Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem



Karel Kohout
Ředitel úseku Obnova a údržba DS
ČEZ Distribuce, a. s.
na základě plné moci

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 | společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 s předmětem podnikání - distribuce elektřiny na základě licencí č. 120115583 | zasilací adresa: ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., Plzeň, Guidenerova 2577/19, PSČ 326 00



S M L O U V A

číslo: Z_S24_12_8120035022

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, uzavřené na základě § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen „energetický zákon“).

I. SMLUVNÍ STRANY

PROVOZOVATEL:

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035

se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu/kód banky: 35-4544580267/0100,

zastoupena na základě pověření ze dne 7.10.2010 Ing. Luborem Čáslavkou, vedoucím odd.inženýring-region

Kontaktní údaje:

Adresa pro písemný styk: ČEZ Distribuce, a.s., Píseň, Guidenerova 2577/19, PSČ 303 03

Zákaznická linka : 840 840 840 ; www. cez.cz; E-mail: cez@cez.cz

(dále jen „Provozovatel“)

ŽADATEL:

TEPVOS spol. s r.o., Číslo zákazníka: 10858005

IČ: 25945793, DIČ: CZ25945793

Ulice: Třebovská 287

Obec: Ústí nad Orlicí, Dodací pošta: Ústí nad Orlicí 3, PSČ: 562 03

Zápis v obchodním rejstříku (rejstříkový soud a spisová značka (tj. oddíl a vložka)): společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 16762

Zástupce: Ing. Václav Knejp, tel.č.: 465529587

mail:

mobil:

(dále jen „Žadatel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, ve smyslu stanoviska Provozovatele ze dne 26.04.2012 ev. č. 8120035022 v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované firmou K energo s.r.o., na stavbu Ústí nad Orlicí, TEPVOS - přeložka kVN, č. Projektu EP-12-2001813 a úhrada nákladů spojených s přeložkou v souladu s ustanovením § 47 zákona 458/2000 Sb.

Provozovatel je vlastníkem zařízení distribuční soustavy kabel vedení VN, které se nachází v Ústí n.Orlicí.

III. VÝŠE ÚHRADY

1. Na základě zákona č.458/2000 Sb. §47 odst.2 je Žadatel povinen uhradit náklady na přeložku rozvodného zařízení v plné výši. Předpokládaná výše nákladů (bez DPH), které jsou spojeny s přeložkou zařízení, činí: **169 134,00 Kč** (realizační náklady 103 902,- Kč, projektová dokumentace 42 032,- Kč, inženýrská činnost 5 000,- Kč, náklady na manipulaci v síti 5 600,- Kč, náklady spojené se zřizováním věcných břemen k dotčeným nemovitostem 12 600,- Kč). Jedná se o cenu předpokládanou na základě vyhotovené projektové dokumentace za účelem možnosti vystavení zálohové faktury dle odstavce 2. čl. III. této smlouvy, kdy Provozovatelem skutečně vynaložené náklady na realizaci přeložky, ve smyslu odstavce 3. a 4. čl. III. této smlouvy, budou Žadateli vyúčtovány fakturou po vynaložení uvedených nákladů.
2. Žadatel před započítáním samotné realizace uhradí Provozovateli zálohu na provedení přeložky v částce předpokládané výše nákladů. Platba bude realizována na základě zálohové faktury vystavené Provozovatelem. Zálohová faktura na částku **169 134,00 Kč** bude vystavena po uzavření této smlouvy.
3. Žadatel se zavazuje po dokončení realizace přeložky uhradit skutečně vynaložené náklady spojené s realizací přeložky včetně nákladů s přeložkou souvisejícími (náklady prostavěné, náklady na projektovou činnost, vlastní náklady Provozovatele, náklady na místní poplatky, nájemné za pronájem komunikací, vícepráce vyžádané Žadatelem, náhrady za majetkoprávní vypořádání, věcná břemena apod.). Případný rozdíl od konečné ceny bude vyúčtován ve faktuře zaslané po ukončení realizace a vyúčtování všech nákladů spojených s přeložkou. Ve faktuře bude zúčtována záloha poskytnutá Žadatelem.
4. V případě, že do účetního vypořádání samotné stavby nebudou dořešeny náklady spojené s náhradou za omezení v obvyklém užívání nemovitosti a náklady spojené se zřízením věcných břemen k nemovitostem dotčených stavbou přeložky, bude faktura za tyto náklady vystavena po ukončení vypořádání všech nákladů s tímto spojených. K pokrytí zálohy na fakturu za zřízení věcných břemen bude použito části zálohy za náklady spojené se zřizováním věcných břemen k dotčeným nemovitostem uvedené ve výčtu položek v 1. odstavci, článku III. této smlouvy. Zbýlá část záloh bude zúčtována do faktury za náklady, které budou známy z účetního vypořádání samotné stavby přeložky. Fakturu za tyto náklady vyhotoví Provozovatel po účetním vypořádání samotné stavby, a to bez zbytečného odkladu.
5. Povinnost úhrady vyplývá pro Žadatele ze zákona, a proto tento podíl není zdanitelným plněním a nepodléhá dani z přidané hodnoty (viz výklad MF ČR - informace o uplatňování DPH v energetice ze dne 11.3.2005).

IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

PROVOZOVATEL:

1. Provozovatel se zavazuje, s předpokladem předchozího uzavření této smlouvy a splnění úhrad způsobem sjednaným v článku III. této smlouvy, zajistit realizaci přeložky v termínu do 4 měsíců od úspěšného předání a převzetí staveniště. Termíny zprovoznění energetického díla jsou podmíněny stavební připraveností Žadatele dle odstavce 2. článku IV. této smlouvy, příznivými klimatickými

podmínkami, které umožní provádění prací v souladu s technologickými předpisy Provozovatele a nabytím právní moci stavebního povolení za předpokladu, že takového povolení bude k uskutečnění přeložky zapotřebí. Stavbu bude provádět firma **K energo s.r.o.**

2. Provozovatel se zavazuje účelně vynakládat Žadatelem poskytnuté finanční prostředky pouze ke smluvně sjednanému účelu.

ŽADATEL:

1. Je povinen řádně, včas a ve sjednané výši uhradit platby sjednané v článku III. této smlouvy. V případě opožděné platby zaplatí Žadatel úrok z prodlení ve smluvně sjednané výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.
2. Zajistit stavební připravenost pro uskutečnění přeložky, kdy stavební připraveností pro uskutečnění přeložky se rozumí předání volné trasy pro uskutečnění přeložky a pro Žadatelem žádané její umístění na pozemku resp. pozemcích jež mají být realizací přeložky dotčeny.
3. Umožnit přístup pracovníkům Provozovatele a vybraného zhotovitele na pozemky Žadatele, za účelem provádění prací a úkonů, souvisejících s realizací přeložky, a to nejpozději ke dni zahájení prací.
4. Zavazuje se Provozovateli poskytnout veškerou nezbytně potřebnou součinnost a podklady.
5. Nesplní-li řádně a včas své povinnosti dle článku III. a IV. této smlouvy, odkládá se dle dohody smluvních stran termín realizace energetického díla automaticky o dobu prodlení Žadatele se splněním jeho povinností + 30 dnů. Dostane-li se Žadatel se splněním svých povinností dle této smlouvy do prodlení delšího než 90 dnů, je dle dohody smluvních stran Provozovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy se nedotýká nároku Provozovatele na zaplacení úroku z prodlení, popř. nároku na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nebo zánikem práv a povinností z této smlouvy vyplývajících z jakéhokoliv jiného důvodu nevzniká smluvním stranám povinnost vrátit uhrazené smluvní pokuty či úroky z prodlení, na něž smluvním stranám vznikl nárok v době účinnosti této Smlouvy.
6. Na pozemcích ve vlastnictví Žadatele, dotčených stanoveným technickým řešením dle stanoviska Provozovatele, jehož ev.č. je uvedeno v čl. II této smlouvy, umožní zřízení věcného břemene za finanční náhradu dle znění zákona 151/1997 Sb. a souvisejících předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že budou účinně spolupracovat při realizaci celé stavby. Zároveň se zavazují vzájemně se informovat o všech skutečnostech majících vliv na zásady dohodnuté v této smlouvě.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah vyplývající z této smlouvy se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. Žadatel vyvolává v souladu s ustanovením § 47 odstavec 2 zákona č. 458/2000 Sb. potřebu přeložky zařízení distribuční soustavy dle čl. II této smlouvy. Vlastnictví tohoto zařízení se po realizaci přeložky nemění.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, a to pod sankcí jejich neplatnosti. Písemná forma je nezbytná i pro právní úkony směřující ke zrušení Smlouvy.

4. V případě nedodržení termínu dle odstavce IV. část Provozovatel bodu 1. z důvodu zaviněných Provozovatelem se snižuje cena stavby uvedená v odstavci III. této smlouvy o 0,05% za každý den prodlení.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy přecházejí v plném rozsahu na případné právní nástupce všech smluvních stran.
7. Smluvní strany budou veškeré spory, vyplývající z plnění závazků této smlouvy, řešit vzájemnou dohodou.
8. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy prostudovaly a prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
9. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.
10. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu.
11. Pokud smlouva nebude podepsána do 30 dnů ode dne, kdy byl návrh smlouvy doručen Žadateli a neproběhnou-li další upřesňující jednání, má se za to, že Žadatel od svého záměru ustoupil.
12. Podpisem této smlouvy Žadatel jako subjekt údajů potvrzuje, že Provozovatel jako správce údajů splnil vůči danému subjektu údajů informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele.
13. Žadatel svým podpisem současně potvrzuje, že (vedle výše uvedených informací) je si též plně vědom všech svých práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou a rovněž potvrzuje pravdivost a aktuálnost osobních údajů, které k účelu předmětné smlouvy poskytl. Žadatel se podpisem smlouvy též zavazuje prokazatelně Provozovateli oznámit do pěti pracovních dnů případné změny svých osobních údajů.
14. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje bude využívat a nakládat s nimi pouze ke sjednanému účelu a v souladu se zákonem.

V České Třebové dne 21.2.2013

V

dne.



Provozovatel



ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 63



Žadatel

ČEZ Distribuce a.s.

Ing. Lubor Čáslavka

Ved. odd. inženýring-region

Faktura

1014007496

Dodavatel:

TECAM spol. s r.o.
Kotrčova 304/2
50301 Hradec Králové - Plotiště nad Labem
CZ
IČO: 60933623
DIČ: CZ60933623

Telefon: 495 212 047
Fax: 495 212 844

Telefon: 497770510
e-mail: beranova@tecam.cz
Fax: 495212844

A. B. V. spol. s r.o.
Vrbová 655
56201 Ústí nad Orlicí
CZ

Odběratel

A. B. V. spol. s r.o.
Vrbová 655
56201 Ústí nad Orlicí
CZ
IČO: 48154067
DIČ: CZ48154067

Vaše objednávka: KPN 120028
Ze dne: 25.11.2014
Zakázku podal: p. Bartoš
Referent: Stanislav Radoň
Zakázka: 10/2014/5741
Dodací podmínky:
Způsob dopravy:
Popis: HOBAS VLOŽKY 1000

Faktura: 10/2014/7496

Tento doklad je zároveň daňovým dokladem

Datum vystavení: 31.12.2014
Datum UZP: 31.12.2014
Datum splatnosti: 10.4.2015
Způsob platby: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 1014007496
Tento symbol uvádějte, prosím, při platbě
Konstantní symbol:
Banka: ČS obchodní banka - HK
Účet/Kód banky: 17841543/0300
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1784 1543

Zboží	Množství	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
HOBAS vložka šachtová DN 1000	4,000 ks	4 523,00	21	18 092,00	3 799,32	21 891,32 Kč
Výdejka: 10/2014/10043						
Přepravné	1,000 ks	1 500,00	21	1 500,00	315,00	1 815,00 Kč
HOBAS tvarovka	1,000 ks	11 672,00	21	11 672,00	2 451,12	14 123,12 Kč
Výdejka: 10/2014/10302						
Přepravné	1,000 ks	550,00	21	550,00	115,50	665,50 Kč
		Daň %	Netto	DPH	Brutto	
Základní sazba DPH		21	31 814,05	6 680,95	38 495,00 Kč	
Celkem			31 814,05	6 680,95	38 495,00 Kč	

11A-MO-S

$(11672 + 550) \times 1,05 = 12833,1 \text{ Kč}$

Vratné obaly budou přijímány max. do 4 měsíců od nákupu, na základě soupisu faktur, kterými byly odebrány.

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upomínání pohledávky po splatnosti jsme oprávněni požadovat paušální náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky, která činí v současné době podle nařízení vlády č. 180/2013 Sb., v platném znění částku Kč 1 200,--.

Vystavil: Marcela Beranová
Krajský soud v HK, odd. C, vl. 5955

Datum:
Převzal:

Strana: 1/1

Marcela Beranová
TECAM spol. s r.o.
Kotrčova 304/2
50301 Hradec Králové
IČO: 60933623, DIČ: CZ60933623
tel. 495 212 047
beranova@tecam.cz

DODACÍ LIST

Dodavatel		Číslo dodacího listu	
Glasspol, spol. s r.o. Malý Val č.p. 1541 767 01 Kroměříž Divize : Letohradská 100 562 01 Ústí nad Orlicí IČ : 18559778 Tel : 465 527 450 DIČ : CZ18559778 Fax : 465 527 450 Zapsána u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 982		150400034 Odběratel A.B.V. spol. s r.o. VRBOVÁ 625 562 03 ÚSTÍ NAD ORLICÍ ČESKÁ REPUBLIKA IČ : 48154067 DIČ : CZ48154067 Kontaktní osoba :	
Místo určení:		Datum prodeje : 30.01.2015 Datum vystavení : 21.01.2015 Datum expedice : 21.01.2015 Objednávka : Číslo zakázky :	

řadlog	Označení dodávky			MJ	Cena za MJ	Množství	Sl.%	Hodnota	DPH%	Celkem
	Hmotnost [kg]	Objem [dm3]	Objednávka							
406210018	F-KUS 100 LT TT SG			ks	998,00	1,0000	10,00	898,20	21	1 086,83
1413070	KGEA 315/200/45° KAN.ODBOČ.			ks	993,00	1,0000	10,00	893,70	21	1 081,38
1443073	KGR 315/200 REDUKCE KAN.			ks	536,00	1,0000	10,00	482,40	21	583,71
39300121	FÓLIE 300mm/100mm BÍLÁ			m	2,80	100,0000	10,00	252,00	21	304,92
Zaokrouhlení								-0,04		-0,04
						Hodnota		DPH		Celkem
Sumarizace dle sazeb DPH				základní sazba 21%		2 526,30		530,54		3 056,84
za zdanitelná plnění				snížená sazba 15%						0,00
Hmotnost [kg]				Objem [dm3]						
				Celkem		2 526,30		530,54		3 056,84

DODACÍ LIST CELKEM:

3 056,80 Kč

Poznámka: <http://www.glasspol.cz> e-mail: glasspol@glasspol.cz
 Kanalizace a ČOV Ústí nad Orlicí
 Bartoš Josef

doklad vystavil(a)
 Zdeněk Kovrzek

41A-110-4

$536 \times 1,05 = 562,8 \text{ kg}$

DODACÍ LIST

Dodavatel Glasspol, spol. s r.o. Malý Val č.p. 1541 767 01 Kroměříž Divize : Letohradská 100 562 01 Ústí nad Orlicí IČ : 18559778 Tel : 465 527 450 DIČ : CZ18559778 Fax : 465 527 450 Zapsána u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 982		Číslo dodacího listu 150400006 Odběratel A.B.V. spol. s r.o. VRBOVÁ 625 562 03 ÚSTÍ NAD ORLICÍ ČESKÁ REPUBLIKA IČ : 48154067 DIČ : CZ48154067 Kontaktní osoba : Datum prodeje : Datum vystavení : 08.01.2015 Datum expedice : 08.01.2015 Objednávka : Číslo zakázky :	
Místo určení:			

Katalog	Označení dodávky			MJ	Cena za MJ	Množství	SI. %	Hodnota	DPH%	Celkem
	Hmotnost [kg]	Objem [dm3]	Objednávka							
1453000			KGU 300 PŘESUV.SPOJKA KAN.	ks	445,00	2,0000	10,00	801,00	21	969,21
1403010			KGB 315/15° KOLENO KAN.	ks	474,00	4,0000	10,00	1 706,40	21	2 064,75
1403030			KGB 315/30° KOLENO KAN.	ks	474,00	2,0000	10,00	853,20	21	1 032,38
1403040			KGB 315/45° KOLENO KAN.	ks	474,00	2,0000	10,00	853,20	21	1 032,38
1313016			KGEM 315x7,7x1m ROURA KAN.	ks	445,00	4,0000	10,00	1 602,00	21	1 938,42
1313026			KGEM 315x7,7x2m ROURA KAN.	ks	772,00	1,0000	10,00	694,80	21	840,71
1313056			KGEM 315x7,7x5m ROURA KAN.	ks	1 662,00	6,0000	10,00	8 974,80	21	10 859,51
Zaokrouhlení								0,04		0,04
					Hodnota			DPH		Celkem
Sumarizace dle sazeb DPH					základní sazba 21%			15 485,40	3 251,96	18 737,36
za zdanitelná plnění					snížená sazba 15%					0,00
					bez DPH 0%					
Hmotnost [kg]	Objem [dm3]				Celkem			15 485,40	3 251,96	18 737,36

DODACÍ LIST CELKEM:

18 737,40 Kč

Poznámka: <http://www.glasspol.cz> e-mail: glasspol@glasspol.cz
 Kanalizace a ČOV Ústí nad Orlicí
 Rybář

doklad vystavil(a)
 Zdeněk Kovrzek

41A-MD-3

$$445 \times 1,05 = 467,25 \text{ Kč}$$

KALKULACE H1A-MO-1

libová práce dělníka - 261 Kč/hod

+

podíl SHZ - HZ = 89 Kč/hod

350 Kč/hod

KALKULACE H1A-MO-2

$\pi. el. \pi. stěna = 3,14 \times 0,4 \times 0,12 = 0,151 \text{ m}^3/\text{m}$

$0,151 \times 4970 = 790,47 \text{ Kč/m}^3$

4970 - cena vDS za souřti st

	VŠEOBECNÉ POLOŽKY				21 928 519,00
1	Zařízení staveniště	p.s.	1,000	3 300 642,00	3 300 642,00
2	Propagace	p.s.	1,000	145 000,00	145 000,00
3	Realizační dokumentace	p.s.	1,000	11 136 370,00	11 136 370,00
4	Náhradní transport odpadních vod a provizorní propojení a čerpání při rekonstrukcích	p.s.	1,000	350 000,00	350 000,00
5	Provizorní zařízení po dobu rekonstrukce vodovodu, odslávký a náhradní zásobování vodou	p.s.	1,000	180 000,00	180 000,00
6	Prozatímní provozyování postupně uváděny celku do provozu od doby předání díla vč. provozních	p.s.	1,000	270 000,00	270 000,00
7	moštitel, odtěračů, železných díků a součástí				
8	Zaškolení obsluhy	p.s.	1,000	60 000,00	60 000,00
9	Provozní řády	p.s.	1,000	1 713 288,00	1 713 288,00
10	Havarijní plán	p.s.	1,000	856 644,00	856 644,00
11	Geodetické zaměření skutečného provedení	p.s.	1,000	240 000,00	240 000,00
12	Dokumentace skutečného provedení	p.s.	1,000	3 426 575,00	3 426 575,00
13	Zkušební provoz	p.s.	1,000	140 000,00	140 000,00
	Vybavení správy stavby	p.s.	1,000	110 000,00	110 000,00

Cena na 1mil Kč obřytu

5 671,21

249,14

19 134,66

601,37

309,28

463,92

103,09

2 943,79

1 471,90

503,14

5 887,59

240,55

189,00

celkový obřyt 584 mil. Minus 22mil. Kč rovná se 582mil. Kč

celkový obřyt 594 mil. Minus 22mil. Kč minus PS 96mil rovná se 477mil. Kč - pro geodeta

3 Realizační dokumentace

11 Dokumentace skutečného provedení

0,922124 * 19 134,66 = 17 644,45 Kč

0,922124 * 5 887,59 = 5 429,06 Kč



„Sdružení pro Ústí nad Orlicí-kanalizace a ČOV“

Ing. Pavel Kužela

Pobřežní 667/78

186 00 Praha 8

Datum:

8.1.2015

Vyřizuje:

Ing. Sana Bahor, 737 206 974

**Věc : Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV
1A – Ústí nad Orlicí - kanalizace
Stanovisko projektanta k ZL1A-109
SO 1.15 – Stoka OS4**

Vážený pane,

na základě Vašeho požadavku Vám sdělujeme stanovisko projektanta k ZL1A-110.

Při výkopových pracích na stoce OS4 bylo zjištěno:

-V průběhu výkopových pracích v trase kanalizace byl zjištěn stávající železobetonový septik areálu VUB, který bude nutno přepojit a zdemolovat. Bude provedeno vyčerpání a likvidace splašků, demolice septiku a následný zásyp. Existence septiku nebyla známa v době zpracování ZDS a RDS.

-V trase stoky OS4 mezi RŠ OS7 a OS9 byly nalezeny dvě betonové dešťové stoky DN400. Dle provedených kamerových prohlídek bylo zjištěno, že stoky odvádí pouze dešťové svody. Stoky budou zrušeny a dešťové svody budou přepojeny přímo do stoky OS4.

-Po vytyčení odlehčovací komory OK4, spojné komory a stávajících sítí v chodníku bylo zjištěno, že pro provedení stavebních prací bude nutno provést výkop do tělesa komunikace I/14 vč. její opravy a bezpečného zajištění stěn výkopu použitím štětovnicového pažení.

-Při zahájení demoličních prací stávajících stok B v místě provedení odlehčovací komory OK4 byl zjištěn odlišný skutečný stav stávajících stok oproti podkladů, které měl zpracovatel RDS. Bylo zjištěno, že stávající stoky jsou osazeny na betonovou desku tl. 30cm a jsou částečně obetonovány. Dále při provádění demoličních prací stávajících stok v prostoru navržené OS4 bude nutno provést zabezpečení kabelu VN vč. zpětného uložení kabelu po provedení komory OK4.

-Po provedeném vytyčení trasy stoky OS4 v úseku mezi OS2 a OS6 byla zjištěna existence nadstavby přístřešku u vstupu do bývalé prádelny. Přístřešek bude nutno demontovat a na základě požadavku správce areálu zpětně namontovat.

-Na základě zjištění skutečného uložení kabelu VN v olejovém pouzdru, který neumožňuje jakoukoli manipulaci a nutnosti zachování zdroje požární a pitné vody v areálu VUB bude nutno provést provizorní vedení vodovodu v úseku stoky OS4 mezi OS2 a OS6. Provizorní potrubí vodovodu bude vyvěšeno ve výkopu. Následně bude provedena stoka OS4 a poté plánovaná přeložka vodovodu.

- Na základě dodatečného požadavku Objednatel provede Zhotovitel připojení č.p. 224 v ul. Na Ostrově tlakovou přípojkou DN40 v délce 58m.

- Z důvodu kolize stávajících stok se stokou OS4 bude nutno provést přeložení stoky DN200 u OS8, stoky DN300 u OS12, stoky DN200 u OS2 a stoky DN300 u C7.

-Při provádění sondážních pracích na stoce OS4 v prostoru lomové šachty OS12 byla zjištěna existence kabelů VO a ČD, které nebyly uvedeny v podkladech správce sítí, které měl k dispozici projektant v době zpracování ZDS a RDS. Z důvodu přímé kolize výše uvedených sítí se stokou OS4 bude nutno provést přeložku sítí. Součástí přeložek sítí bude i obnova povrchů chodníků a komunikace zámkovou dlažbou.

Sídlo Brno

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 426 011
fax: +420 541 426 012
e-mail: info@aquaprocon.cz

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha
Tel.: +420 220 879 819
fax: +420 226 712 140
e-mail: info.praha@aquaprocon.cz


IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
Brno-venkov č. ú.: 24301-641/0100
Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

-V průběhu provádění výkopových prací byla zjištěna kolize jak v podélném směru tak i výškovém uložení stávající splaškové stoky DN300 vedoucí od areálu VUB do stávající stoky C a navržené stoky OS4. Z důvodu nutnosti zachování funkčnosti daného systému odvádění splaškových vod z areálu VUB bude nutno provést přeložku stoky DN300 v délce cca 8m a obnovit její napojení na stoku C.

Zpracovatel ZDS ani RDS nemohl předpokládat existence septiku a dodatečné vybudovaného přístřešku v trase stoky OS4, uložení stávající kanalizace a kabelů odlišné od poskytnutých podkladů a dodatečný požadavek na napojení č.p. 224.

Z výše uvedených důvodů s výše uvedenou změnou souhlasíme.

S pozdravem



Ing. Daniel Kozický



PŘEDCHÁZEVJÍCÍHO TROUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY, BYLO PROJEKTOVATEM ROZHODNUTO, ŽE JE V TAKOVÉM TECHNIČKÉM STAVU, ŽE NEBYLO TŘEBA UVAŽOVAT S JEJÍ DEKONSTRUKCÍ. V RÁMCI KONTOLY REALIZACE STAVBY PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NA STOCĚ BYLO NA MÍSTĚ KONSTATOVÁNO, ŽE DEGRADACE KONSTRUKCE VLIVEM ZVÝŠENÉHO OTOČEBENÍ A HRAZOVÝCH OVLIVŮ DOŠLO K ZÁVÁŽNÉMU OBNOVENÍ MOKŘI TROUBOU ZPS A FYZICKOU REALIZACÍ STAVBY DO FÁZE, KDO JE POTŘEBA PROVÉST JEJÍ KOMPLETNÍ SANACI, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA DOŠTATEČNÁ ŽIVOST JEJÍ, ALŽI ZALÉŽLA NAVAŽOVACÍKÝ ČÁSTI STAVBY, COŽ JE DOKOŽENO VYKALOVANÝM STANOVÝM FOTODOKUMENTY, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ ZHOTOVĚNÉHO LISTU. ZÁMÍ ROZDÁVACÍ OZVEDNATELE BUDĚ ZHOTOVITEL REALIZOVAT NEJEDNĚVĚ DO PLÁNĚ ZOKOŽENÍ OPLECHOVANÍ STOKY OS4, OS5-1, OS5-2/ A PLÁNĚM UVEDENÍ DO PROVOZU OPIKHOVANÍ KOMORY OK4.

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ NÁVEM STANOVĚNÉHO LISTU.

ZA OZVEDNATELE

P. KNEUP

ZA SPST

P. ŠEVČEK

ZA ZHOTOVITELE

P. PAULIC

VA KUPEL

MO. ÚČS 1 - SO 1.15 - STOKA OS4

6.1.2015

NA ŽÁDOST OZVEDNATELE

- 1) NA ZÁKLADĚ ROZDÁVACÍ OZVEDNATELE ZHOTOVITEL TROUBĚ TLAKOVĚ PŘÍPĚNÍM JAKO VĚŠLÉ OČA SK W PRO Č.P. 224 V UL. NA OSTROVĚ.
- 2) NA ZÁKLADĚ PŘÍPĚ KOUZE NOVĚ BUDOVANÉ STOKY SE STÁVACÍM SEPTIKEM U OS2 BUDĚ ZDEMOLOVÁN STÁVACÍ SEPTIK NO. MČERANÍ A LIKVIDACE SPLAŠČŮ, ZABEZPEČENÍ STÁVACÍHO SEPTIKU A NÁSLEDNÉHO ZÁČEM. TOŽICE ZAMĚŘENÍ OZVEDNÍ NEBYLA ZMĚNĚNA A OZVEDNÍ BYL NALOŽEN PŘI SÁMOTNÝM VÝKOPOVÝM PRACÍK.
- 3) Z DŮVODU KOUZE STÁVACÍKÝ SÍŤ BYLO NUTNĚ PROVÉST TROUBENÍ:
 - a) KANALIZACE DN 200 U OS8
 - b) KANALIZACE DN 200 U OS12
 - c) KANALIZACE DN 200 U OS21



SENAČE +/- STAVBY ÚHEP' NAD OBČI' - KANALIZACE A ČOV

D. 3

str. 7.

oJ KANALIZACE DN 300 u ČZ

- 4) Při provádění prací demolice stávajících stok a prostorách odlehlovací komory OK4 je nezbytné provést zabezpečení vn kabelu vč. obnovy jeho uložení v prostorách kolem budovy odlehlovací komory OK4.
- 5) Při provádění souběžných prací na stoce OS4 v prostorách ložnice sádky OS12 byla zjištěna existence kabelu vč. a čd, které nebyly uvedeny v podkladu TD ani výtčím stavcem sítě. z důvodu přímé kolize sádky sítě je stokou OS4 je nezbytné provést přeložení sádky sítě. součástí přeložení sítě bude i obnova povrchu opodniku a komunikace sádkou zlatou. rovněž byl přeložen kabel čez z důvodu kolize.
- 6) Na základě zjištěné skutečné police stl řýnovodu a uvo řýnov kolize s nově budovanou stokou OS4 u OS12 bude nutné realizovat stl řýnovodu řýnovodu.

Zhotovitel předložil návrh EL.

ZA OBJEDNATELE

P. KUBOP

ZA ČP SE

P. ŠEVČEK

ZA ZHOTOVITELE

P. PAULIČ

W. KUBOP

MA. ÚČS. 1 - SO 1.15 - STOKA OS4 - TORDAČOVÁNÍ ZATISU Č. 123, bod 2

6.1.2015

NA ZÁKLAD ZHOTOVITEL

NA ZÁKLAD SKUTEČNÉ POLICE STAVBY ŘEŠENÉ KANALIZACE DN 200 VODOU OD AKTIVNÍ VUS DO STÁVNÍ STOKY C A JEJÍ PŘÍMÉ KOLIZE JSE V PODKLADNÍ SMĚRU, JE VÝKROUŠEN ULŽENÍ JE NEZBYTNÉ STÁVNÍ KANALIZACI ODSTAVIT A z důvodu zachování funkčnosti daného systému opodniku sádkou vod bude nutné obnovit danou kanalizaci do nové police vč. nového napojení na stoku C. NA ZÁKLAD SKUTEČNÉ POLICE SŘAŽOVACÍ ŘEŠOVACÍ KANALIZACE DN 300 KUPD PŘEDLOŽENÁ PŘELOŽKA KANALIZACE TŘEJE ČISTOTY V JELCE OCA 8 bma bude obnoveno napojení na stoku C, jinak

STAVBA 1/- STAVBA VEŠNÍ NAD BRUCEM - KANALIZACE A ČOV

POS. 3

STR. 8.

STOKA ZŮSTANE V PŮVODNÍM STAVU.

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ NÁVRH ZL.

ZA OBJEDNATELE

P. KNEP

ZA SPS

P. ČEVOČEK

ZA ZHOTOVITELE

P. PAULIC

W. KUBER

13.1.2015

MR. KČS 2 - SO 2.15 - VODOVODNÍ ŘAD 27

NA ŽÁDOST ZHOTOVITELE

V DŮSLEDKŮ PŘÍMÉ KOLIZE VODOVODNÍHO ŘADU 27 A STAVAJÍCÍHO PŘÍKOPU

V ARBNU VÍŠ ZYLO ROZHODNUTO INTERIOREM O JEHO DETALCI.

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ NÁVRH ZL.

ZA OBJEDNATELE

P. KNEP

ZA SPS

P. ČEVOČEK

ZA ZHOTOVITELE

P. PAULIC

W. KUBER

MR. KČS 1 - SO 1.15 - STOKA OS 4

13.1.2015

NA ŽÁDOST ZHOTOVITELE

V PŘÍBĚHU VYKOPÁVČÍ PRÁCI NA STOKU OS 4 BYLY TAD PRÁČENÍ
TĚLESEM OD ZVÍŠTĚNÝ PŘÍKOPU ŽELEZOBETONOVÉHO PŘÍKOPU STOKU.

Z DŮVODU JEJICH KOLIZE S NOVĚ BUDOVANOU STOKOU OS 4 BYLO
ROZHODNUTO O JEJICH ODSTRANĚNÍ.

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ NÁVRH ZL.

ZA OBJEDNATELE

P. KNEP

ZA SPS

P. ČEVOČEK

ZA ZHOTOVITELE

P. PAULIC

W. KUBER

Deník +/- stavby ústi n/0 - kanalizace a Dov

D J. 2

str. 21

12.3. úst 1A SO 1.15 - stoka OS4

15.5.2011

ZÁDOST ZHOTOVITELE

NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÝCH ROZC SÍŤI A VYTČENÍ STAVBY BYLO ZJIŠTĚNO:

1) V TRASE KANALIZACE OS4 MEZI PŘ OS 09 A OS 08 BYL ZJIŠTĚN STÁVNÍK ŽELEZOBETONOVÝ SEPTIL AREÁLU VUB, KTERÝ BUDE KUTNĚ PŘEPOTIT A ZDEMOLOVAT. NA ZÁKLADĚ TĚHTO ÚTRAV BUDE NEBEZYTNO PŘEVÉST PŘELOŽENÍ STL PLANOVAŇI PŘELOŽENÍ.

2) V PLANOVAŇI TRASE STOKY OS4 MEZI PŘ OS 09 A OS 07 BYLI NALAZENY DVE ŽEŠTĚVÉ KANALIZACE DN 400 (MATERIÁL BETON), KTERÉ JSU PŘEVÉZENÝCH KANALIZACÍCH PŘEVÉZENÝCH SUDNÍ TOUTE ŽEŠTĚVÉ SUDNÍ. DVA KANALIZACE BUDE PŘEVÉST A ŽEŠTĚVÉ SUDNÍ BUDE PŘEVÉST PŘEVÉST DO STOKY OS4.

3) PO VYTČENÍ ODLEHODVACÍ KONOPY OK4, SPOJNÝCH KONOP A STÁVNÍK SÍŤI V CHODNĚK JE NEBEZYTNO PŘEVÉST PŘEVÉST PŘEVÉST VÝKOP DO TĚHTA KOMUNIKACE NĚ. JEDÍ OPĚTOVNĚ OPRAVY A ŽEŠTĚVNĚ ŽEŠTĚVNĚ STĚN VÝKOP - STĚJOVNICOVÉ ŽEŠTĚVNĚ.

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ NÁVRH ZL.

ZA OBJEDNATELE

P. KNEŠP

ZA SPS

P. ŠEVČEK

ZA ZHOTOVITELE

P. PAVLÍK

12.4. úst SO 3.17 - stoka S 7-2

15.5.2011

ZÁDOST OBJEDNATELE

NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÍ OBJEDNATELE ZHOTOVITEL PŘEVÉST PŘEVÉST STOKY S 7-2 V ČÁSTI PŘEDLOŽENÍ OČKA 70 cm DO OP. 350.

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ NÁVRH ŽEŠTĚVNĚ PŘEVÉST A NÁVRH ZL.

ZA OBJEDNATELE

P. KNEŠP

ZA SPS

P. ŠEVČEK

ZA ZHOTOVITELE

P. PAVLÍK

DEMOK +/- STAVBY ÚSTÍ N/D - KANALIZACE A ŽEV

§ 2.2)

125. ÚČS 8 SO 3.16 - STOKA 80-2

STR. 32/

15.5.2011

ŽÁDOST OBJEDNATELE

NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÍ TOČKY NA KABELU, KTERÁ BYL V MĚRIBOŘI
POLOŽEN DO PLÁNOVANÉ TRASY STOKY S6-2 OD ŘS S62-3 DO S62-6
JE NEBBYTNE ŽENĚNA TRASY. ŽENĚNA TRASY V RÁMCI STÁVAJÍCÍCH
POŘENKŮ MÁTEL NEODSOULASK. PROTO JE NÁVĚ NEBBYTNE PŘOVĚST
ŽENĚNU TRASY NA NOVÉ TOČENÍ.

ŽHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ NÁVRH ŘEMZE ŘPD A NÁVRH ŽL.

ZA OBJEDNATELE

ZA SPS

ZA ŽHOTOVITELE

P. KNEP

P. ŠEVČEK

P. PAVLÍČ

126. ÚČS 1A SO 1.15 - STOKA 084 - OBJEKT 084 A SPOUNTCH
KAMOR

10.6.2011

ŽÁDOST ŽHOTOVITELE

PŘI ZAHÁJENÍ DEMOLIČNÍCH PRACÍ STÁVAJÍCÍCH STOK B V UL. MORAVERA
BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE STÁVAJÍCÍ STOKY JSOU OSÁZENY NA OCA 80 cm
ŽETONOVOU ŽESKOU A JSOU ČÁSTEČNĚ OBEŽENOVÁNY. SKUTEČNÝ STAV
NEKORRESPONDUJE S PODKLADY, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYLA VYKONÁVÁNA
ŘPD. PŘI ŘEMPAČI 084 JE NEBBYTNE PŘOVĚST ŽENĚNU KOMUNIKACE 1/14 A TÍH ŽODĚNÍ TOČENÍ
ŘSD (ŽENĚNU PŘÍKAP, ORANA KOMUNIKACE).

ŽHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ NÁVRH ŽHĚNOVÉHO ÚSTU.

ZA OBJEDNATELE

ZA SPS

ZA ŽHOTOVITELE

P. KNEP

P. ŠEVČEK

P. PAVLÍČ

129. ÚČS 1A SO 1.15 - STOKA OS4 - ZPĚTNÝ VÝDEK OS2 AŽ OS6

15.8.2014

ŽÁDOST ZHOTOVITELE

1) Při provedení výtčování stávajících sítí v daném úseku stoky OS4 byla zjištěna existence napřevy přetřesení a k tomu do výše předložen. Danou dodatečnou přetřevu (přetřesení) bude nutné demontovat a na základě požadavků správce areálu a zřejmě namontovat.

2) Na základě zjištění skutečné ~~poškození~~ ^{poškození} olejných potrubí, který neumožňuje jakoukoli manipulaci, a nutnosti zachování zdroje porušení a jiné vody pro areál vub, bude nucen zhotovitel provést provizorní vedení vodovodu v úseku stoky OS4 od RS OS2 do RS OS6. Zhotovitel dává provizorní potrubí vyvésti do prostoru. Následně bude provedena stoka OS4 a poté plánovaná přeložka vodovodu.

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽIL NÁVRH EL.

ZA OBJEDNATELE

P. KNEIP

ZA SPS

P. ŠEVČÍK

ZA ZHOTOVITELE

P. PAULÍČ

130. ÚČS 1A SO 1.11.1 - STOKA K4-0

21.8.2014

ŽÁDOST OBJEDNATELE

1) Na základě požadavků objednatel zhotovitel provede na obecních a kanalizačních stokách revizní šachty PVC DN 400/200 pro č.p. 218, č.p. 84, č.p. 161 a č.p. 163 a revizní šachty PVC DN 400/160 na kanalizační odbočce pro č.p. 169 a č.p. 199.


2) Na základě přetřesení kousek nové budované stoky ze stávajícím septikem bude demontován stávající septik v. včerpáním a likvidace splašků, zabezpečení stávajícího septiku a

→

Technical drawing of a sewerage system layout. The drawing shows a network of sewer lines with various diameters (DN 100, DN 120, DN 150, DN 160) and slopes (e.g., 0.113, 0.1084). Key features include a 'ŘAD 27' (Row 27) section, a 'BOURÁNÍ' (Drilling) area, and a 'ZAJIŠTĚNÍ KABELŮ' (Cable Protection) section. The drawing also shows a 'PŘELOŽKA STL PLYN' (Gas Line Crossing) and a 'VUB' (Ventilation) point. The drawing is dated 1980 and includes a scale of 1:1000.

ŘAD 27

TLT DN 100, dl. 158 m

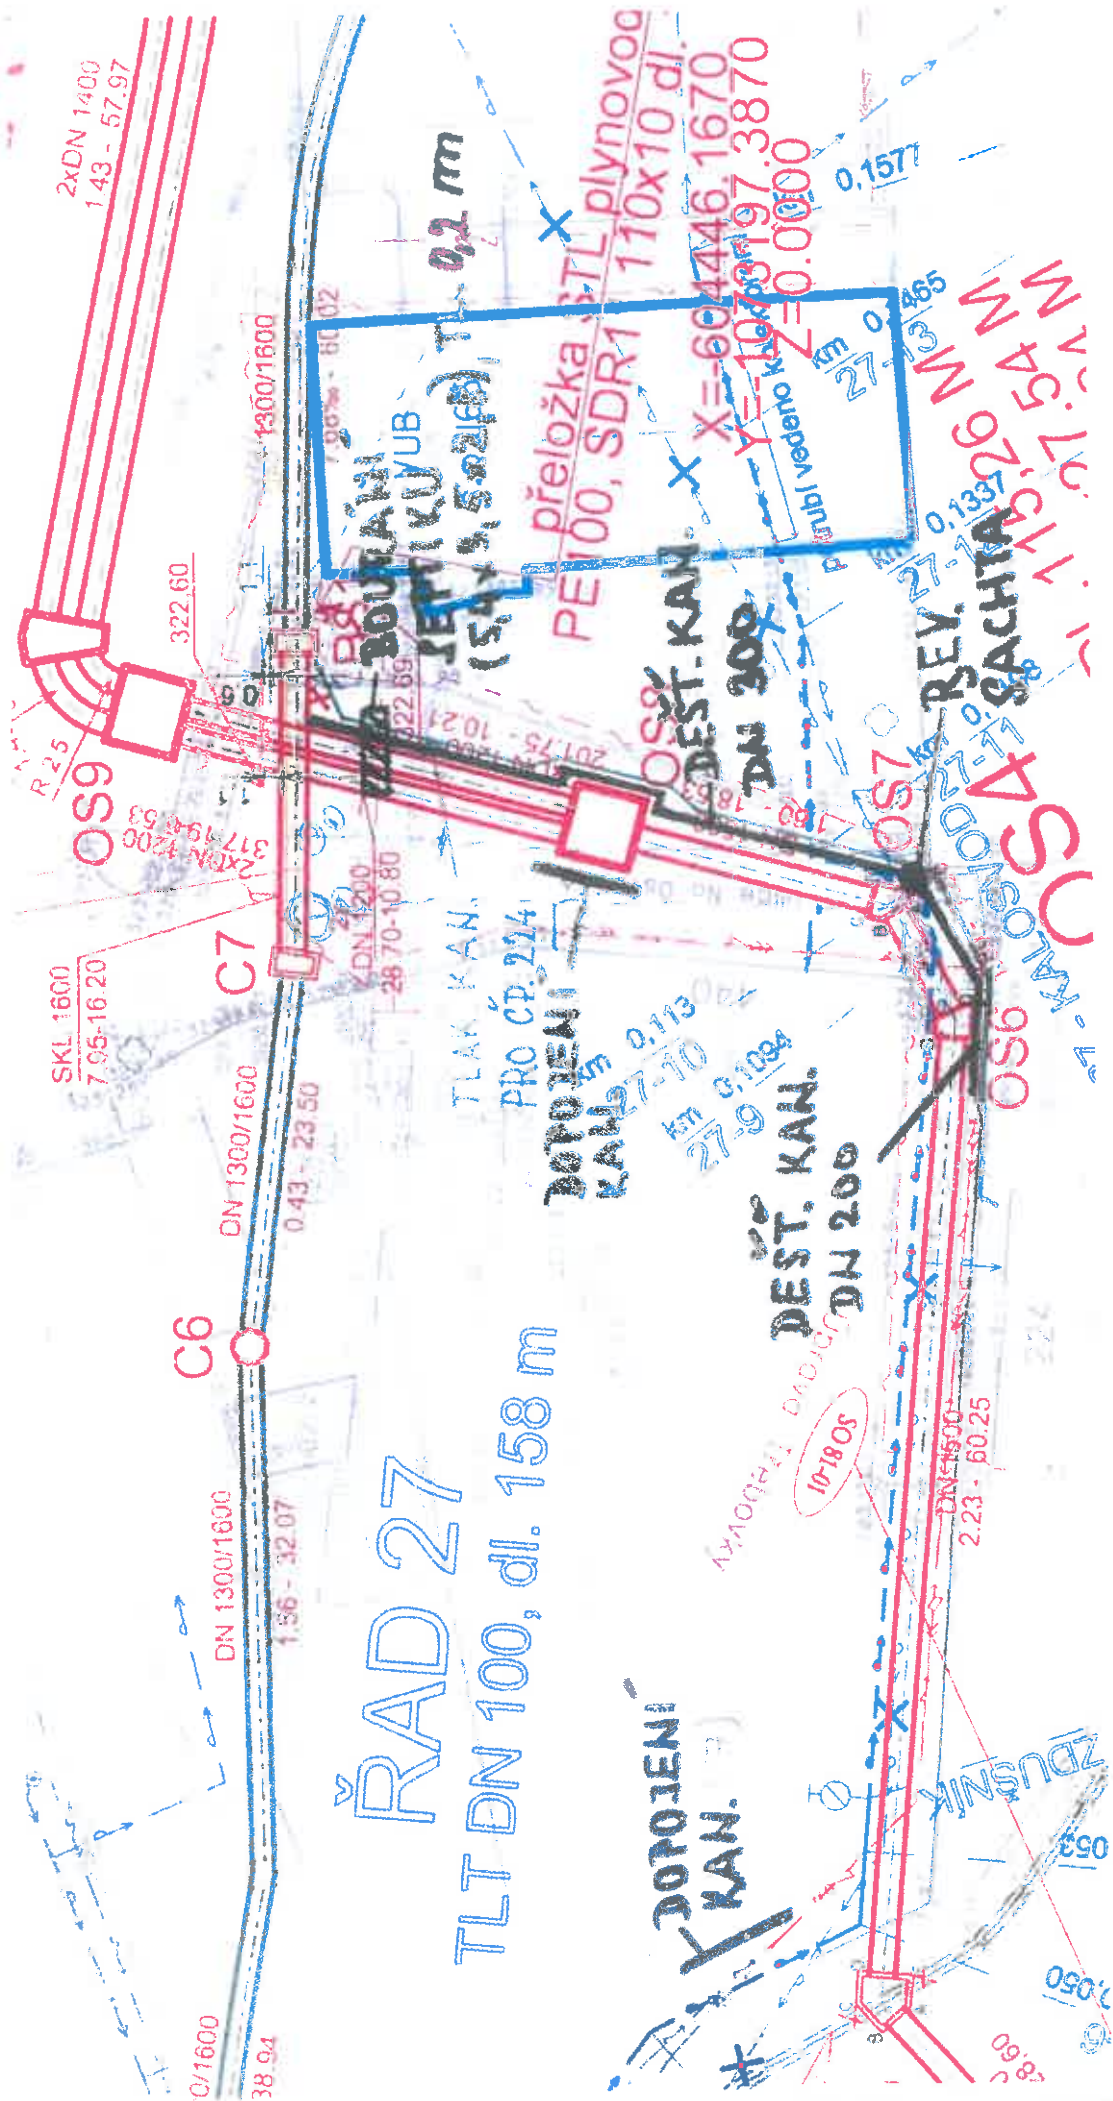

Fotodokumentace



Bourání septiku u vod. řadu 27



Dopojení kanal. u vod. řadu 27



Dopoj. kan. u š. OS12 + plyn



Přeložka plynu



Oprava komunikace



Oprava komunikace



Oprava komunikace



Oprava komunikace



Kabel VO a ČD



Kabel VO a ČD



Přeložka plynu



Přeložka plynu



Zajištění kabelů ČEZ u OK4 RK1 a SP1



Zajištění kabelů ČEZ u OK4 RK1 a SP1



Bourání betonového základu u OS2



Bourání betonového základu u OS2



Bourání teplovodu



Bourání teplovodu



Bourání teplovodu



Bourání teplovodu



Zajištění kabelů za prádelnou



Zajištění kabelů za prádelnou



Obnova kolizního místa stáv.kan.na daném místě



Obnova kolizního místa stáv.kan.na daném místě



Dešťová kanalizace pro čp.224



Dešťová kanalizace pro čp.224



Dešťová kanalizace pro čp.224



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259/1

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 1681/2014-OR HKR/U

Vyřizuje: Coufal Pavel

Telefon: 972 342 079

Mobil:

E-mail: coufal@szdc.cz

Datum: 14.2.2014

Tepvos spol.s.r.o.

Třebovská 287

562 03 Ústí nad Orlicí

Na základě předložené žádosti a dokumentace stavby vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové (dále jen SZDC OR), dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

Souhrnné stanovisko k územnímu řízení pro stavbu:

Název stavby: ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV - změna č.2

Trat': Česká Třebová - Praha žkm 255,320 - 256,00 a 257,150 - 257,900 oboustranně

TÚDÚ: 150104, 1501C1, 150106

Investor: Tepvos spol.s.r.o.

Podle předložené projektové dokumentace se jedná o změnu zájmové stavby č. 2, která řeší SO 1.11.1 Pražská – nová stoka K-4-0A; SO 1.11.2 stoka K-5-2; SO 1.11.2 vodovodní řad 19; SO 1.11.2 vodovodní řad 21; SO 2.11.2 vodovodní řad 32; SO 1.15 – stoka OS4; SO 1.02 nová stoka C-0-1; SO 1.02 šachta C18 - dle ověřené PD. Celá akce je situovaná na mimodrážních pozemcích a pozemcích, se kterými má SZDC právo hospodářit, p.č. 2506/1, 2506/5, stp.č. 534 v k.ú. Ústí nad Orlicí a na pozemku ČD, a.s. p.č. 541/1 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí.

Dle předložených situací se v uvedených lokalitách nacházejí podzemní vedení, objekty a další zařízení ve správě SZDC OR /SSZT, SEE, SMT, SBBH/ a ČD - Telematika.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se stavbou situovanou v ochranném pásmu dráhy souhlasí za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

- 1) *Majetkoprávní vztahy je investor povinen vyřešit se SZDC, s.o., Stavební správou východ.*
- 2) *V zájmovém území v současné době probíhá stavba Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí. Veškeré změny ve všech stupních řízení musí být konzultovány a odsouhlaseny dodavatelem stavby EUROVIA CS, a.s.*
- 3) *Při realizaci výše uvedené akce dojde ke styku s trasami telekomunikačních vedení ve správě ČD-Telematika, proto je nutné splnit podmínky stanovené ve vyjádření č.j. 2820/2014-0 ze dne 25.2.2014 viz příloha.*
- 4) *Technologický postup prací bude vypracován tak, aby nedošlo poškození drážních zařízení a nebyla ohrožena ani omezena bezpečnost a plynulost železničního provozu.*
- 5) *Stavba bude navržena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.*
- 6) *Stavba je umístěna v oblasti s výskytem bludných proudů. Podzemní části stavby včetně inž. sítí je nutno chránit dle příslušných norem proti korozivním účinkům bludných proudů (nebo budou navrženy z materiálů nepodléhajících korozi) z elektrizované železniční trati.*

Upozorňujeme Vás na kabelové trasy správy ČD-Telematika, které se nacházejí mimo OPD v intravilánu města.

Zpracovanou PD, včetně situace celé akce (i mimo OPD), pro stavební řízení požadujeme předložit ke schválení.

Toto vyjádření je vydáno pouze pro účely územního řízení a zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. V žádném případě ho nelze použít pro účely vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby popř. provádění prací!!!

Toto stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu předložené námi ověřené dokumentace. Případné změny v projektové dokumentaci /další stavby, které by zasahovaly do OPD, obvodu dráhy/ požadujeme neprodleně předložit k novému posouzení a k případnému stanovení nových podmínek.

Jako účastník řízení trváme na tom, aby výše uvedené podmínky tohoto stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do podmínek územního rozhodnutí (souhlasu) jako nezbytně závazné, s uvedením č.j. a datumu vydání stanoviska. Dále žádáme, aby nám byla zaslána všechna rozhodnutí a stanoviska stavebního úřadu týkající se této stavby na datovou schránku SŽDC (uccchjm).

Souhrnné stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené dokumentace s platností **2 let** od datumu vydání souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné rozhodnutí je investor povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska, dle aktuálních podmínek a právních předpisů.

Pro případné další jednání k této akci bychom Vás rádi požádali, abyste při předkládání žádosti k dalšímu stupni PD uváděli naše číslo jednací pro naši rychlejší orientaci k uvedené akci.


Ing. Jiří Vondráček
náměstek ředitele pro techniku
Oblastního ředitelství Hradec Králové

Špráva železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(17)

Příloha: ověřená žádost, PD, situace SBBH a kopie vyjádření Telematiky.

Dopis zn.: 1681/14S (21078/13Z, 1606/12, 1463/06)
Ze dne: 27.1.2014

Naše zn.: 2820/2014-0
Vyfukuje: Hejsková Dagmar
Tel.: +420 972 342 226
Mob.: +420 725 069 004

e-mail: dagmar.hejskova@cdt.cz
Datum: 25.2.2014

SŽDC, s.o. OŘ

HRADEC KRÁLOVÉ

Coufal Pavel

Věc: **Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. - divize TÚDC, ČD - Telematiky a.s. ke stavebnímu povolení.**

Akce: **ÚSTÍ NAD ORLICÍ-KANALIZACE A ČOV - ZMĚNA 2**

Staveb. část: 1. Výstavba stoky OS4 žkm 255,825 ; 2. Stoka C-0-1 PP trub DN250 žkm 255,371-255,474 ; 4. Propojovací stoka C z potrubí SKL DN800 a spojná komora SK8 ; 5. Stoka K-4-0A z PP trub DN300 ; 6. Stoka K-5-2 z PP trub DN300 , vodovodní řad 21

Území: V trati Česká Třebová-Praha oboustranně v žkm 255,320-256,000 a žkm 257,150-257,900

Vyjádření pozbývá platnosti dne 25.2.2016

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Zařízení: DK2+TKK8 ; DK26 ; DOK12f+TK25x0,8 v HDPE tr.(SŽDC.s.o.) ; DOK 36f+72f v HDPE tr.(ČD-T a.s.)

Kniha plánu: Brandýs-Česká Třebová L64,68,69-3,70 (DK,TKK) ; Česká Třebová-Ústí n.O. L 36 a Choceň-Ústí n.O. L67,68,70 (DK26) ; Ústí n.O.-Česká Třebová L5,32,33,40 (DOK,TK)

Přílohy: 1x Všeobecné podmínky SŽDC 1x Všeobecné podmínky ČD-T

Upřesnění:


1.k.ú.Gerhartice v žkm 257,8-257,9 (U cyklostezky) dojde ke kolizi s kabely DK+TKK,DK26,TK+DOK- 2.k.ú.Kerhartice (podjezd k vojákům) dojde ke křížení a souběhu s DK26 - 3.k.ú.Ústí n.O. (U Mandřka) dojde ke křížení s DOK+TK - 4.k.ú.Ústí n.O. (ul.Lázeňská) dojde ke křížení a souběhu s DK26 a DK+TKK . O vytyčení požádejte pracovníky SKS Česká Třebová před započatím zemních prací na základě objednávky.Manipulace s optickými kabely (a jejich příslušenstvím např. HDPE) v majetku ČD – Telematika a.s. jsou nezadatelné a budou zajištěny na základě smluvního vztahu pracovníky majitele zařízení.V případě jakékoli kolize s kabely ve správě ČD-Telematika a.s.projednejte způsob ochrany popř.přeložky s pracovníkem SKS Česká Třebová Vlastimilem Dlouhým mob. 602760627, e-mail: vlastimil.dlouhy@cdt.cz.



ČD-Telematika a.s.
Úsek servis infrastruktury
Vadoucí okrsku
Dlouhý Vlastimil
v.z. Hejsková Dagmar

ČD - Telematika a.s.
Úsek servis infrastruktury
Vadoucí okrsku
Dlouhý Vlastimil
v.z. Hejsková Dagmar

Dk
UHERSKO - ŽICHÁNEK


L. 64

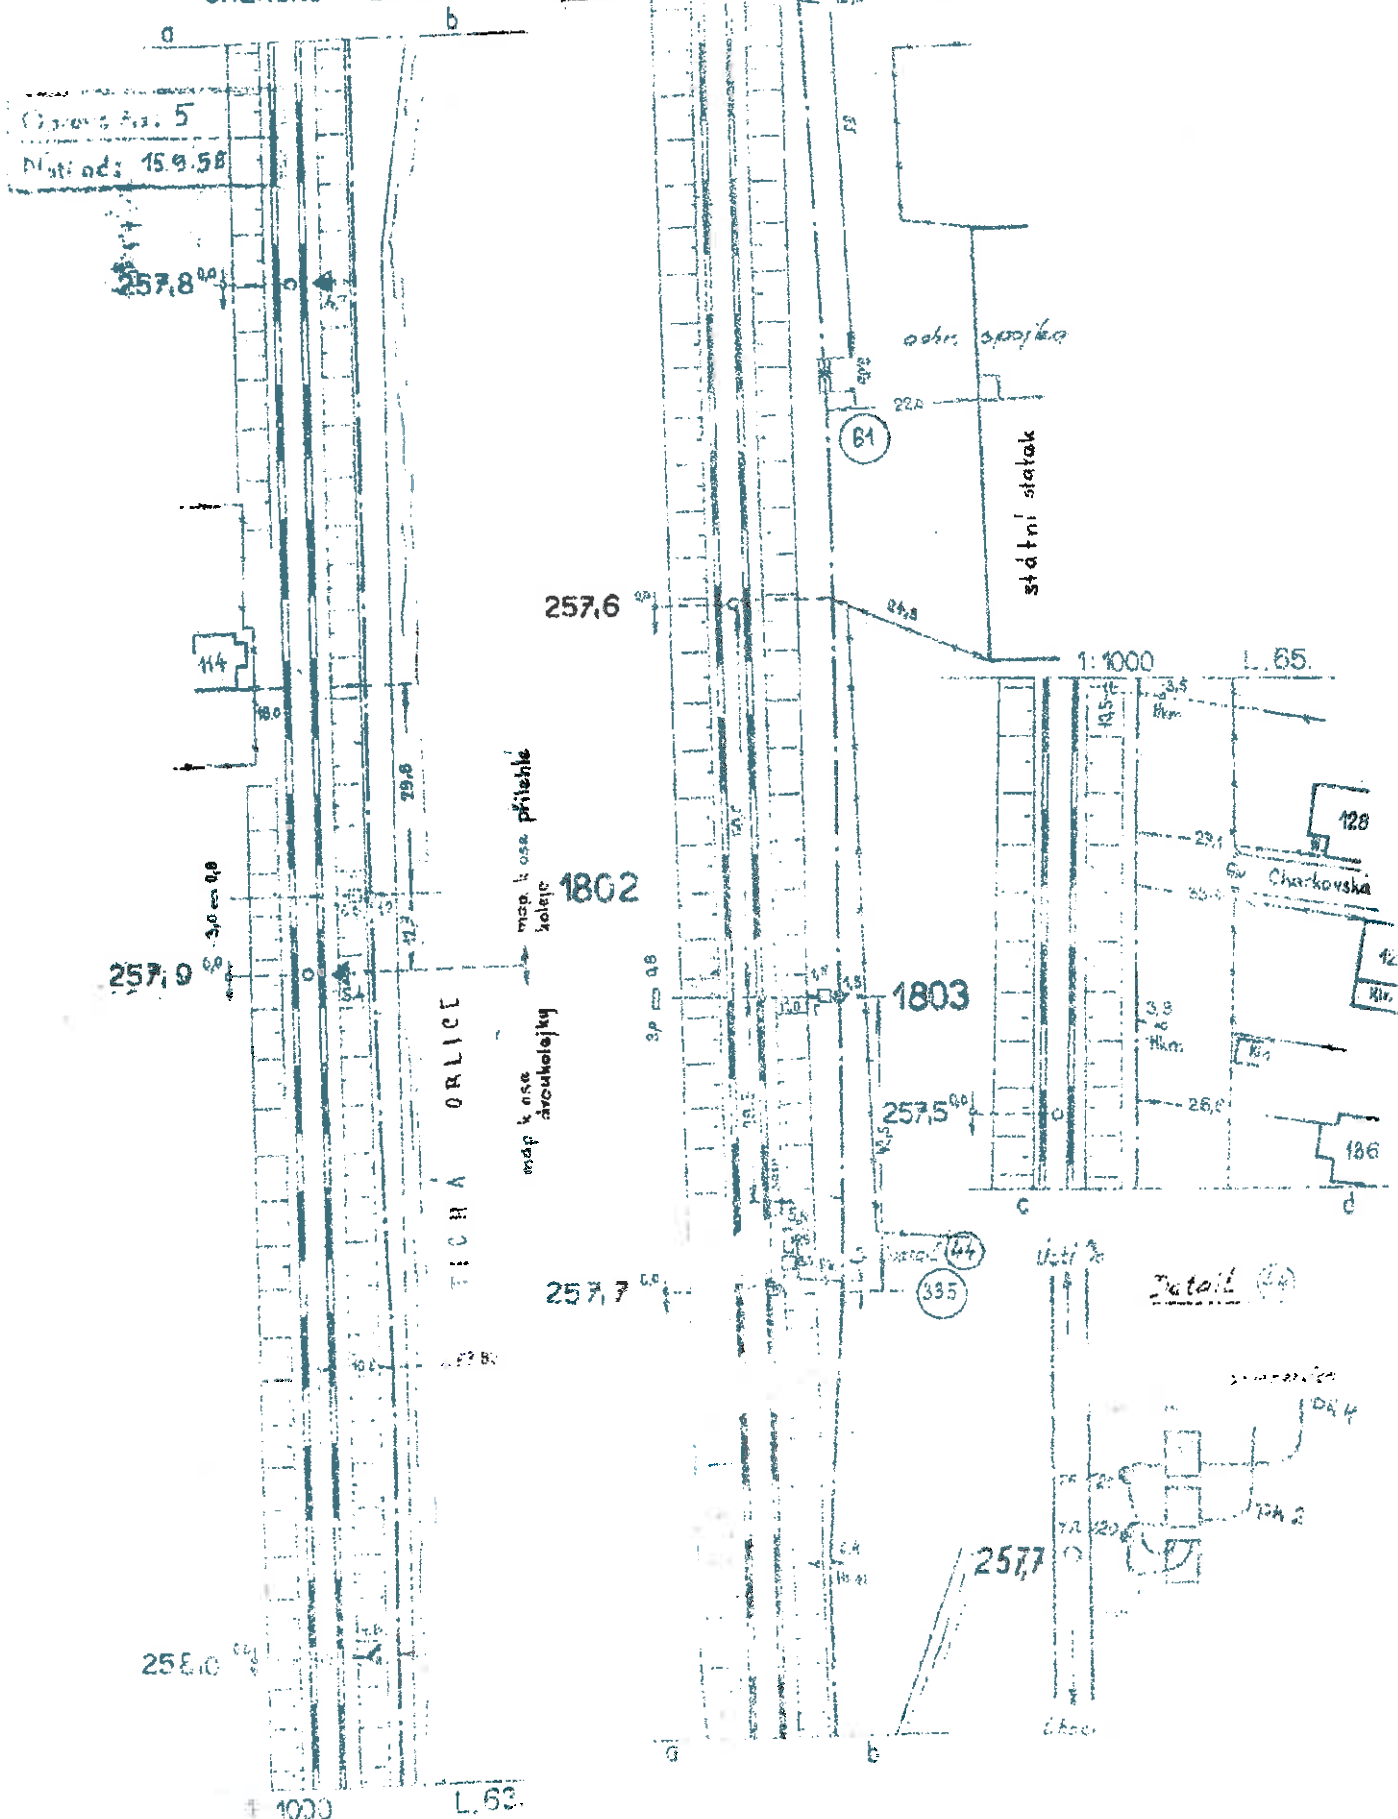

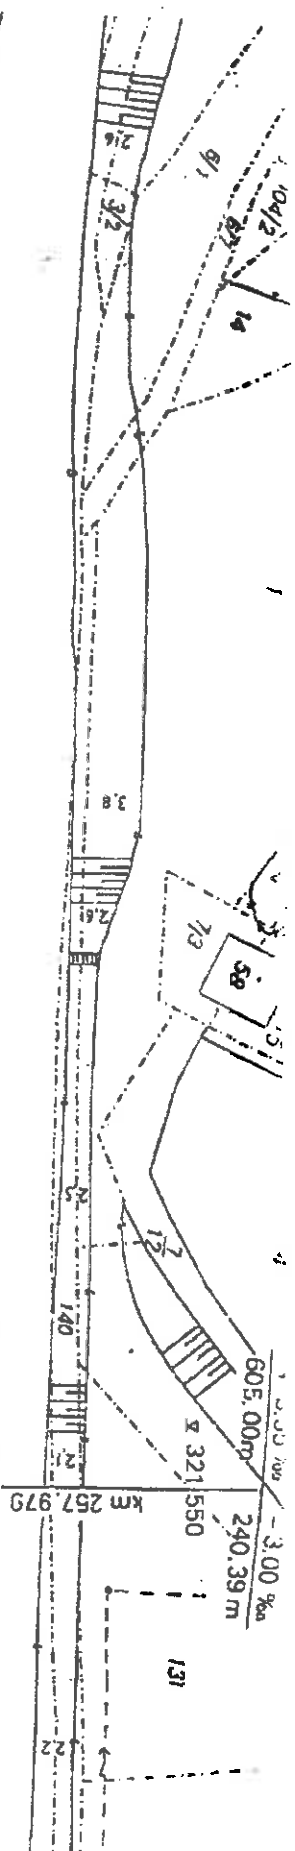

Tichá Orlice

147

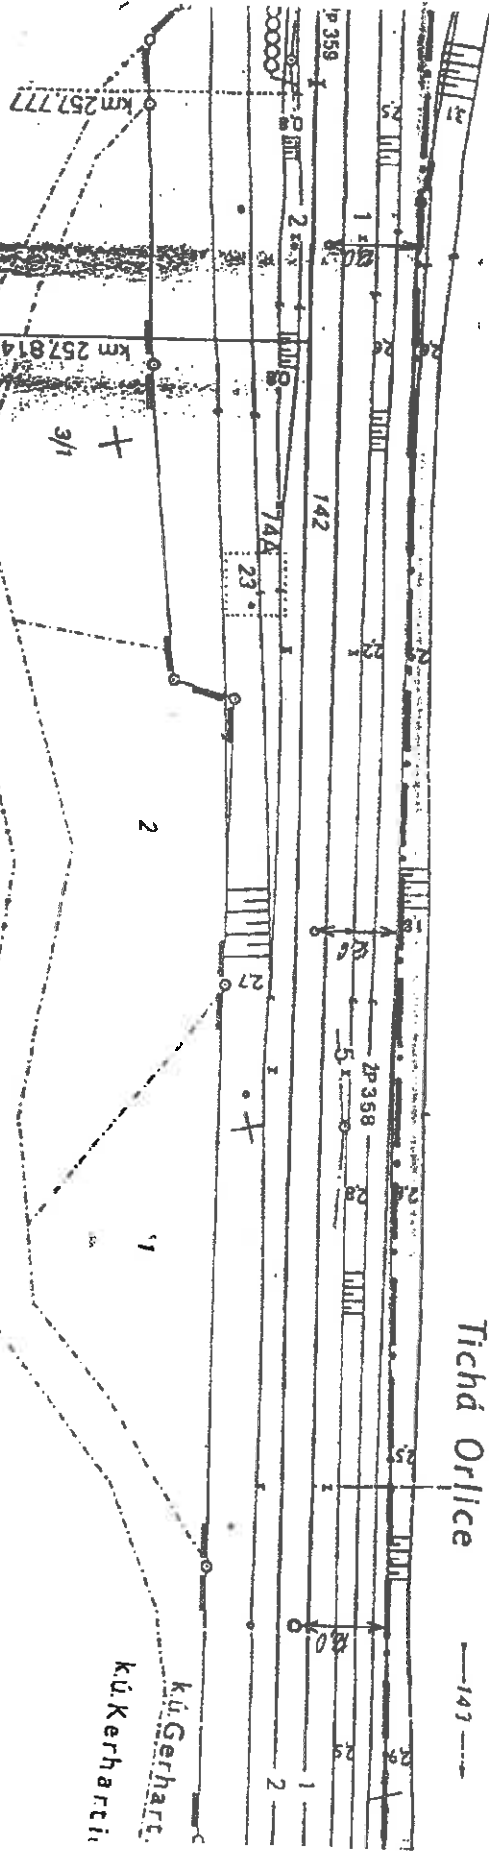

+3.730 ‰
300.00m
-3.060 ‰
434.70m

q = 5000 m


257,8

257,9

258,0


DK 26 Choceň Ústí nad Orlicí

L 67

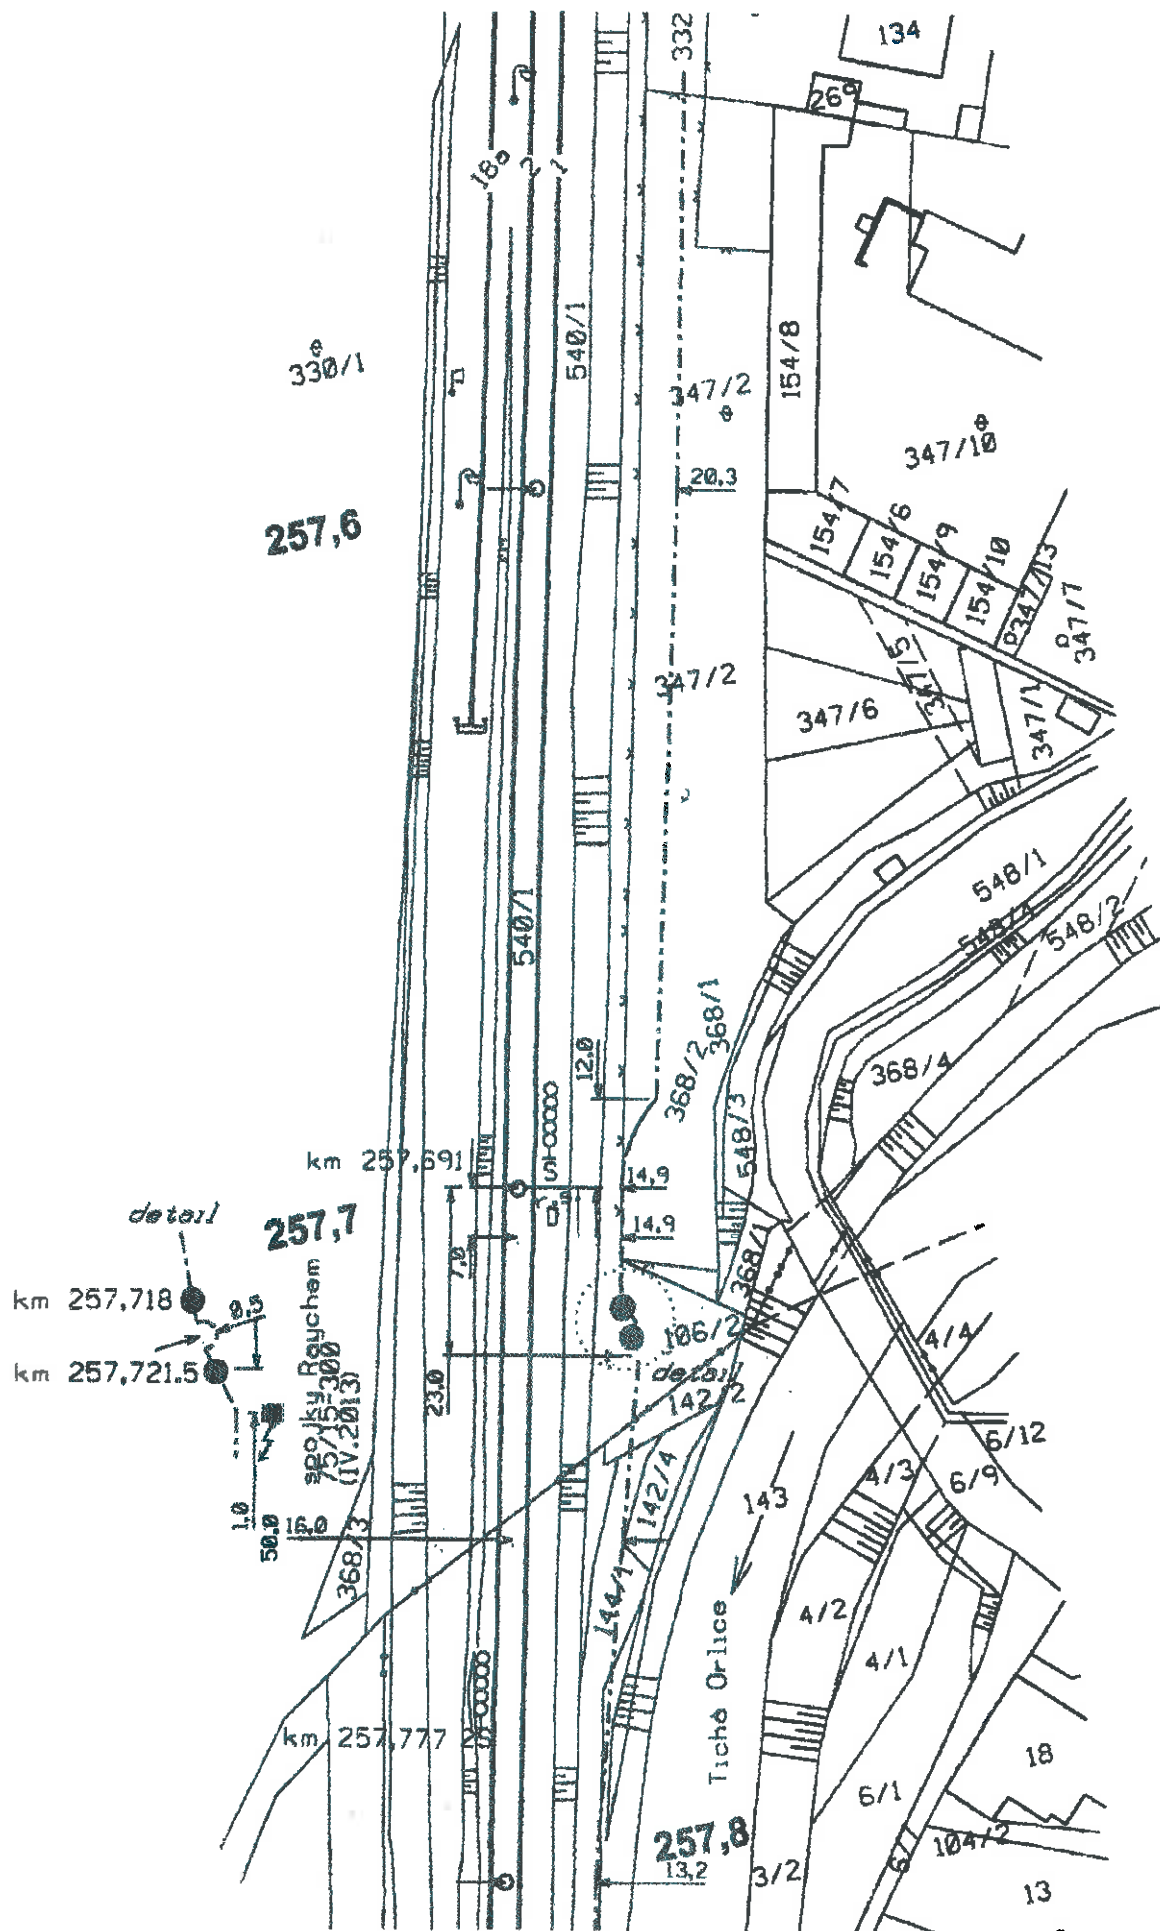


L.69.

Case No. 24
Filed: 7.10.63

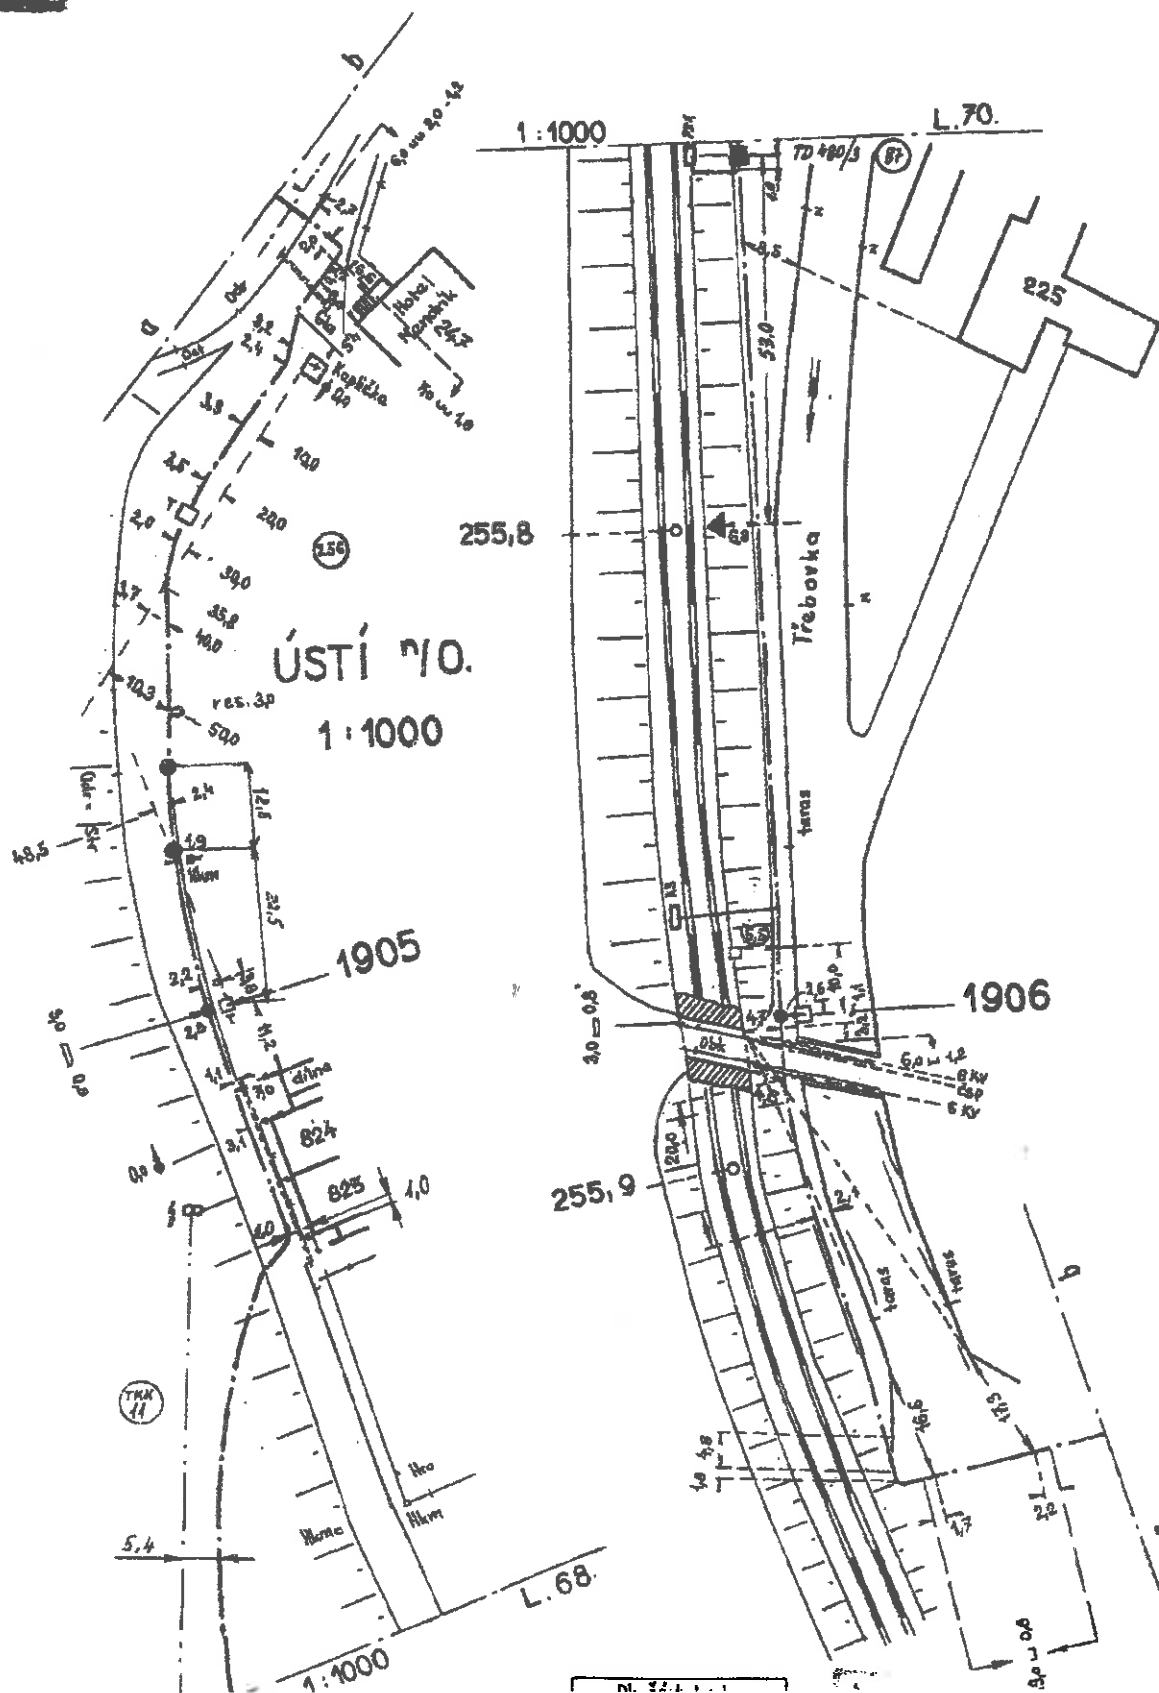

TK / *DIK*

L. 35

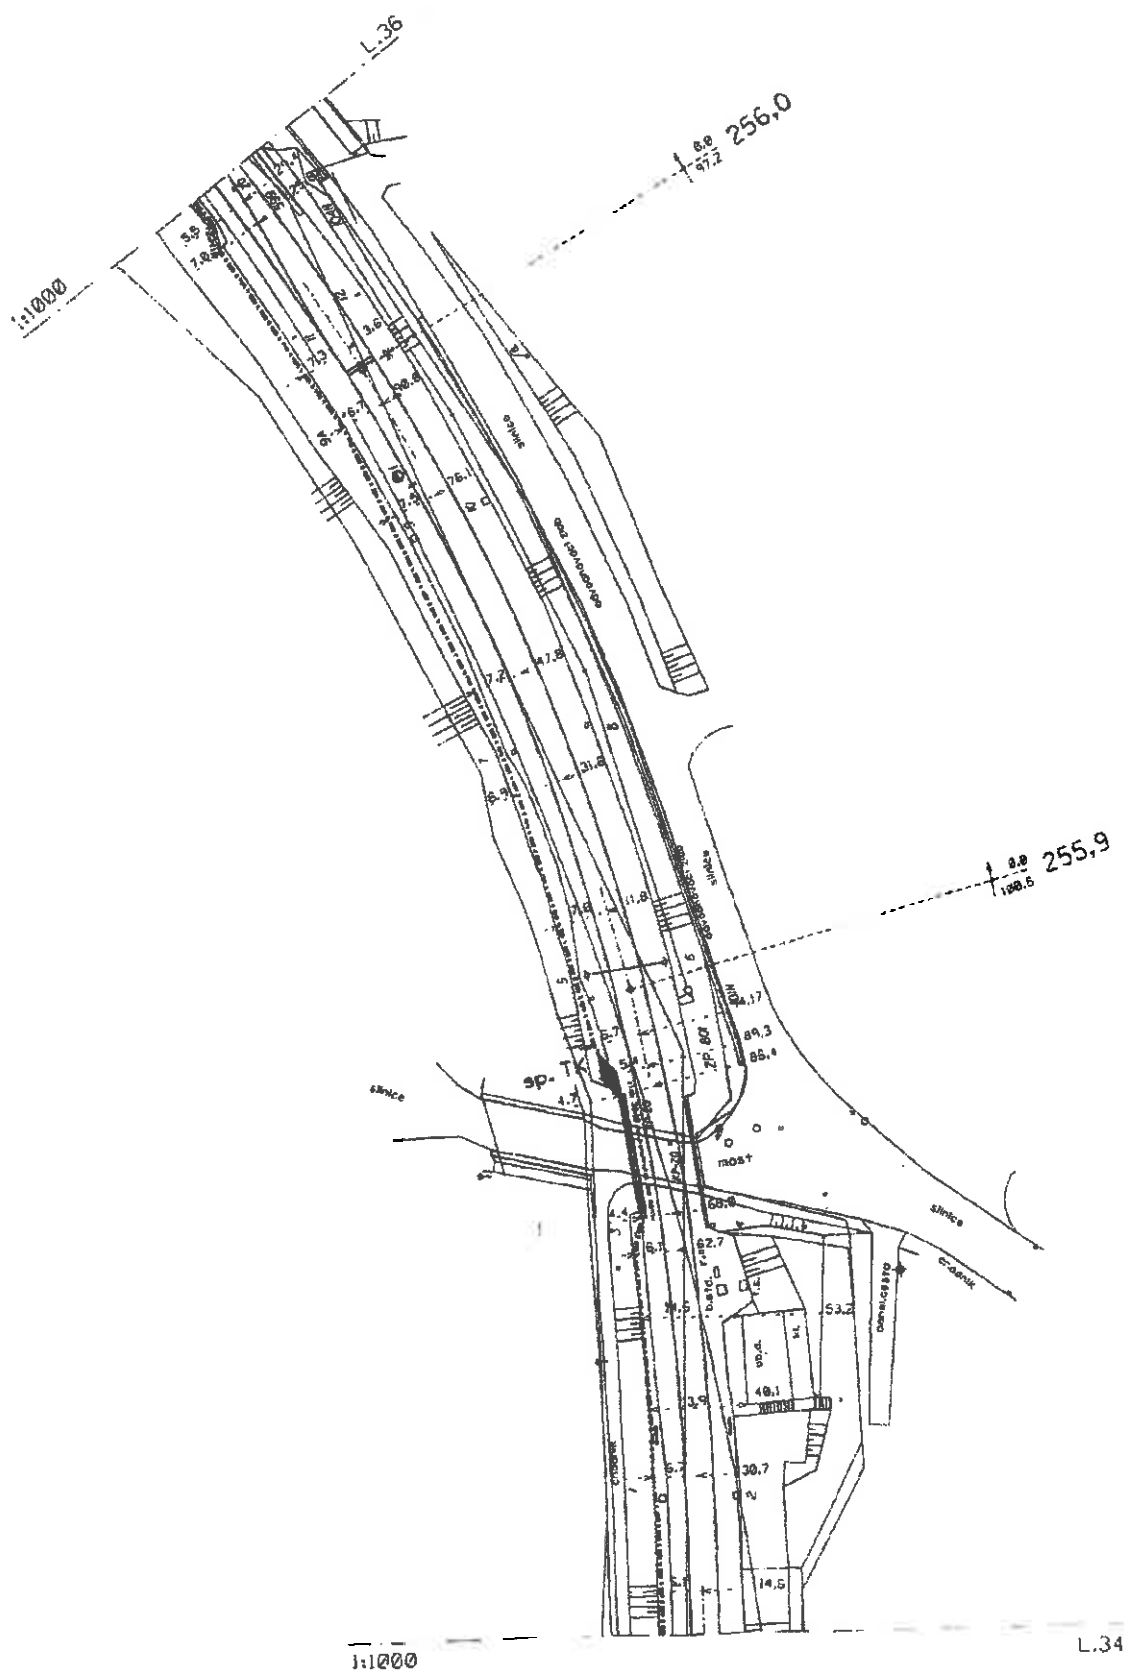


U MENDRICO

ČDT ŽVPS DOK

Ústí nad Orlicí-Česká Třebová

L 5

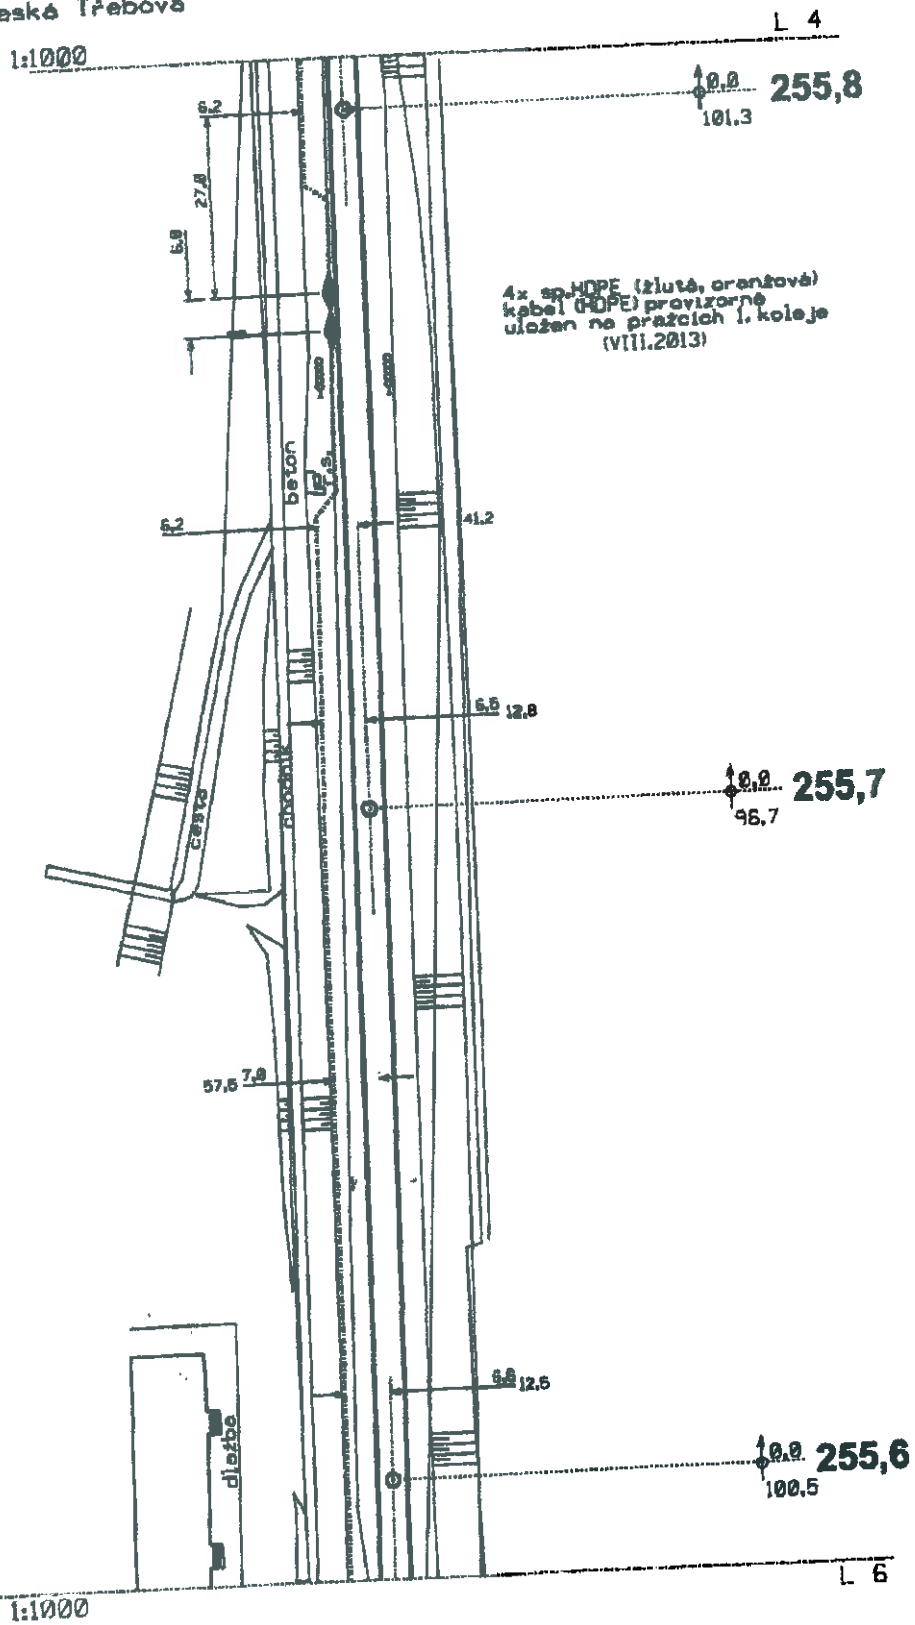



ČD-Telematika

396

10/92

55

63

DK 2

Plati od

5.8.
1952


v. 2013


Uhersko -
Žichlinek

L 70 B

Meritko 1:1000

UO Mendrik

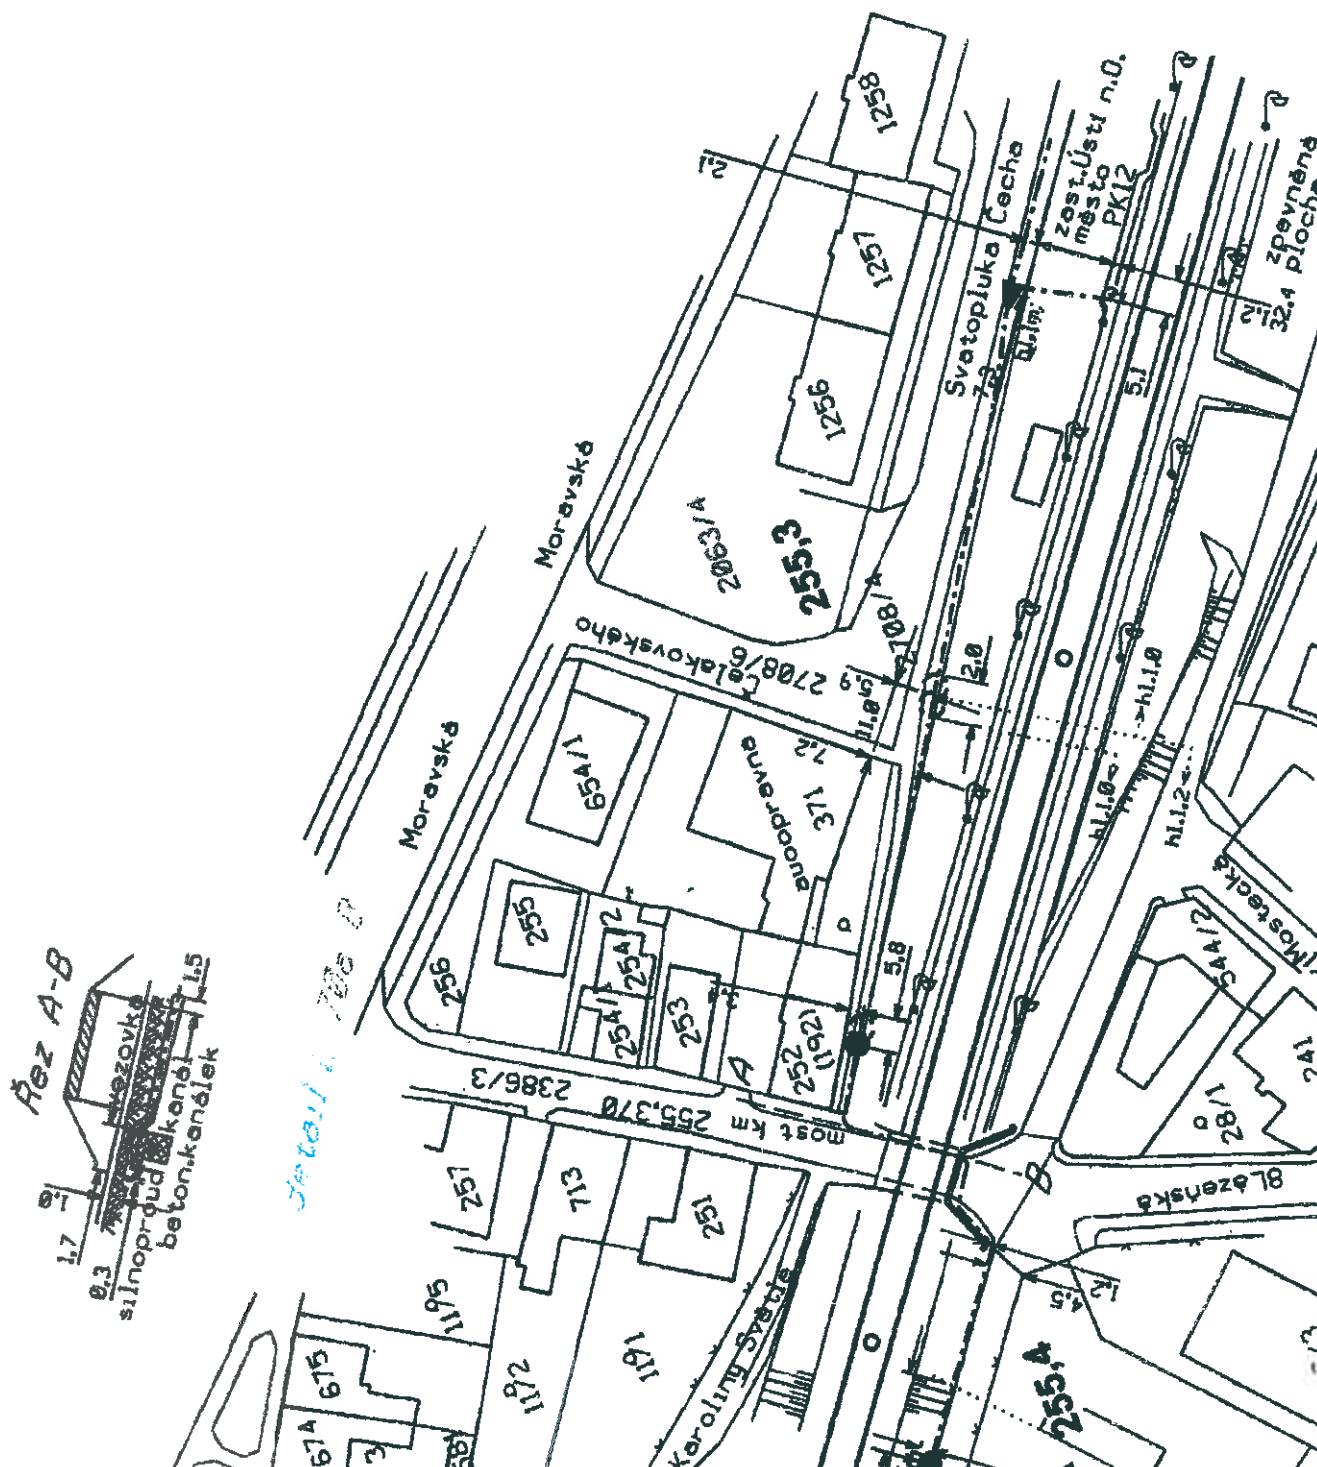

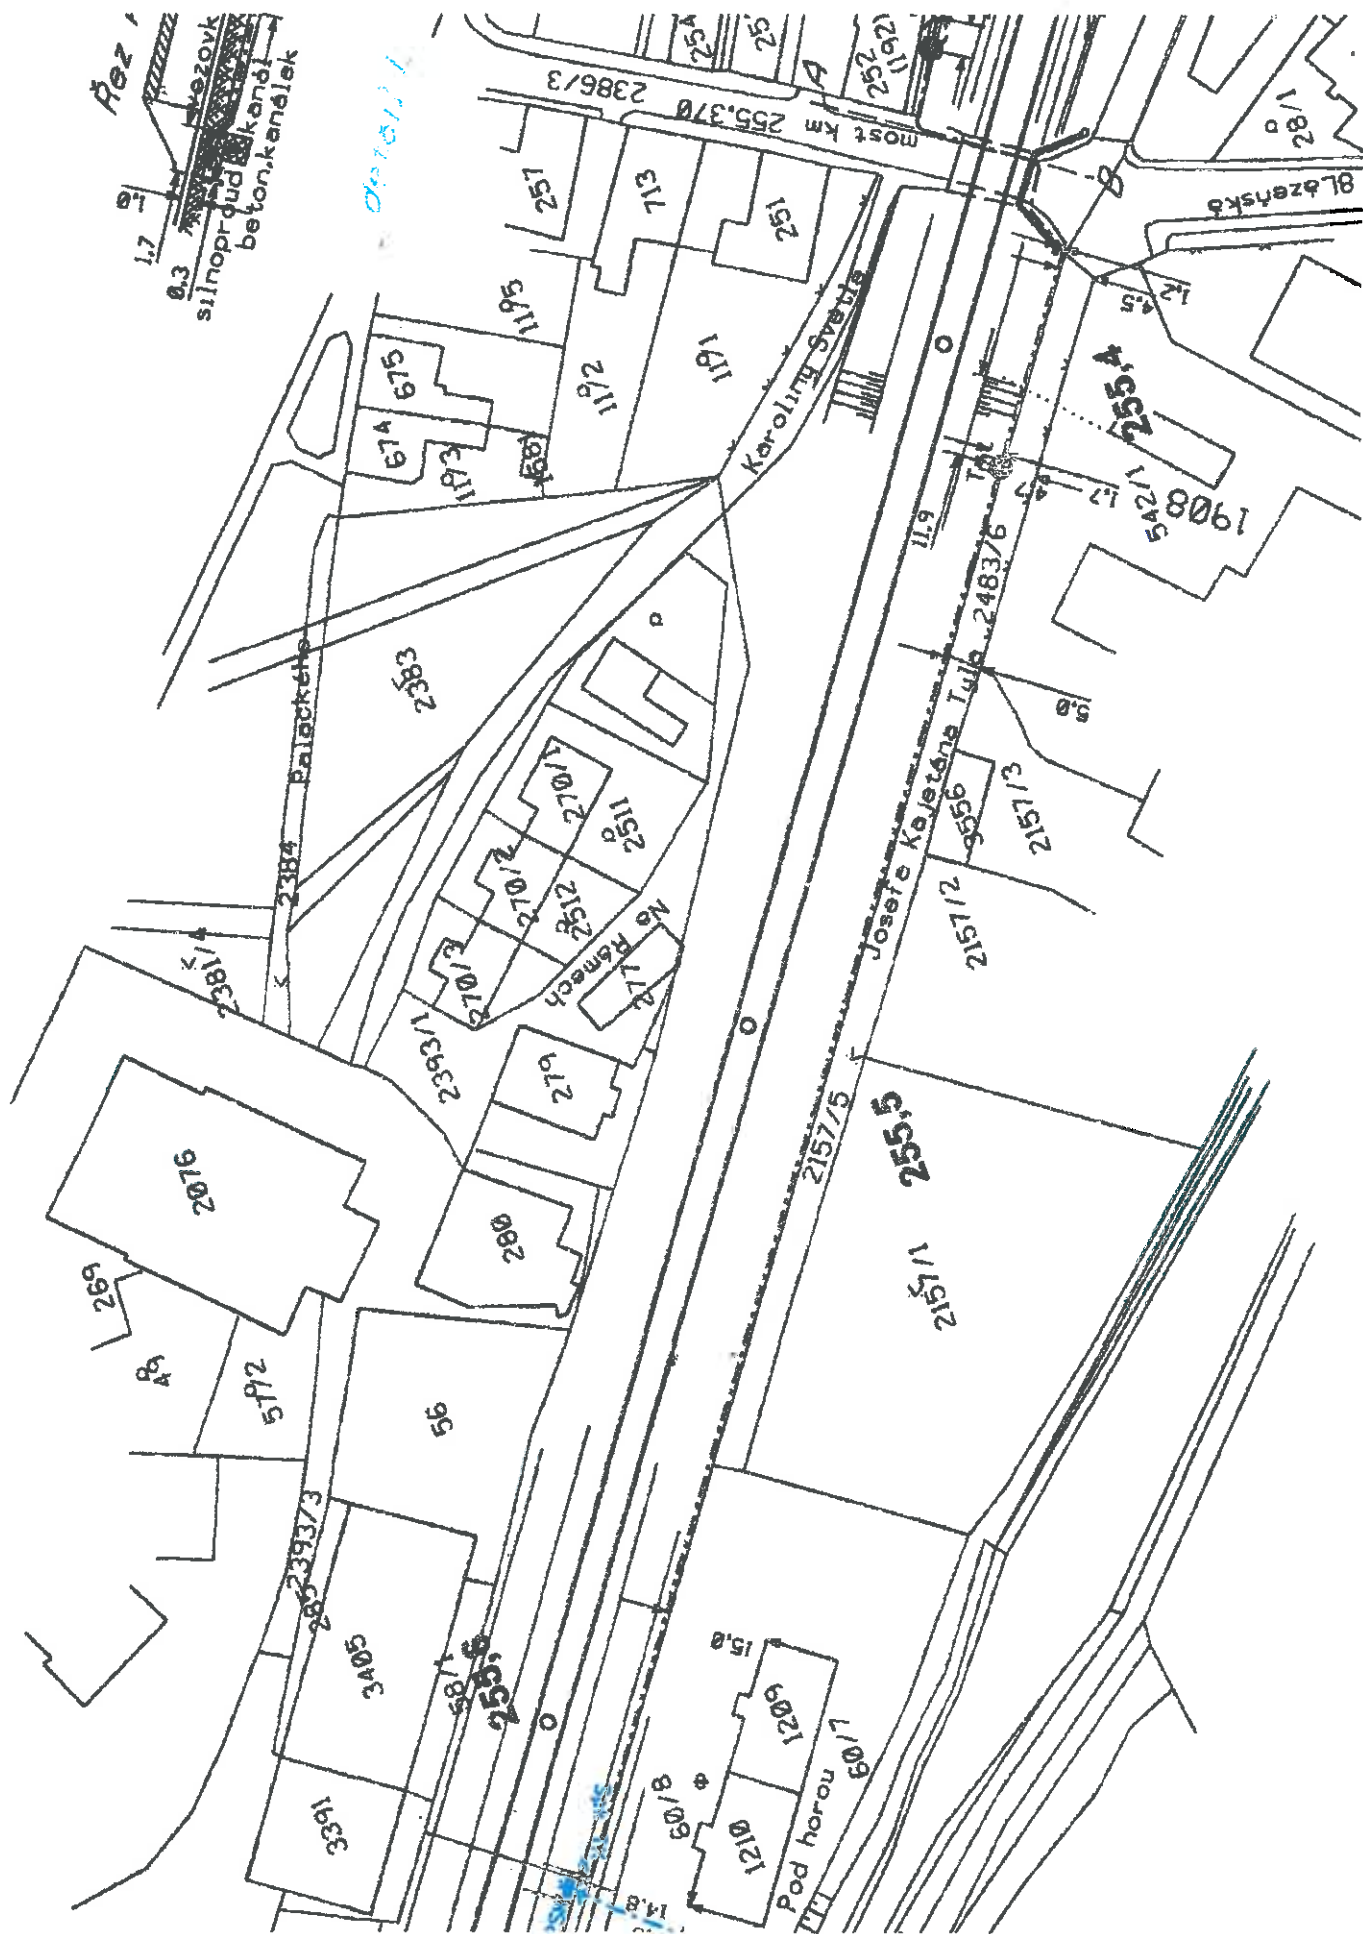

DE+TKK
41. LAZENSKÁ

 CD-Telematika	Porucha č.	396	10/92						Uhersko - Zichlinek
	Oprava č.	55	83						
	TKK 8 OK 2	Platí od	20.11. 1999	5.8. 1992	V 2013				

Řez A-B


1.7

0.3


1.5

beton. konstrukce

sínoprodukt

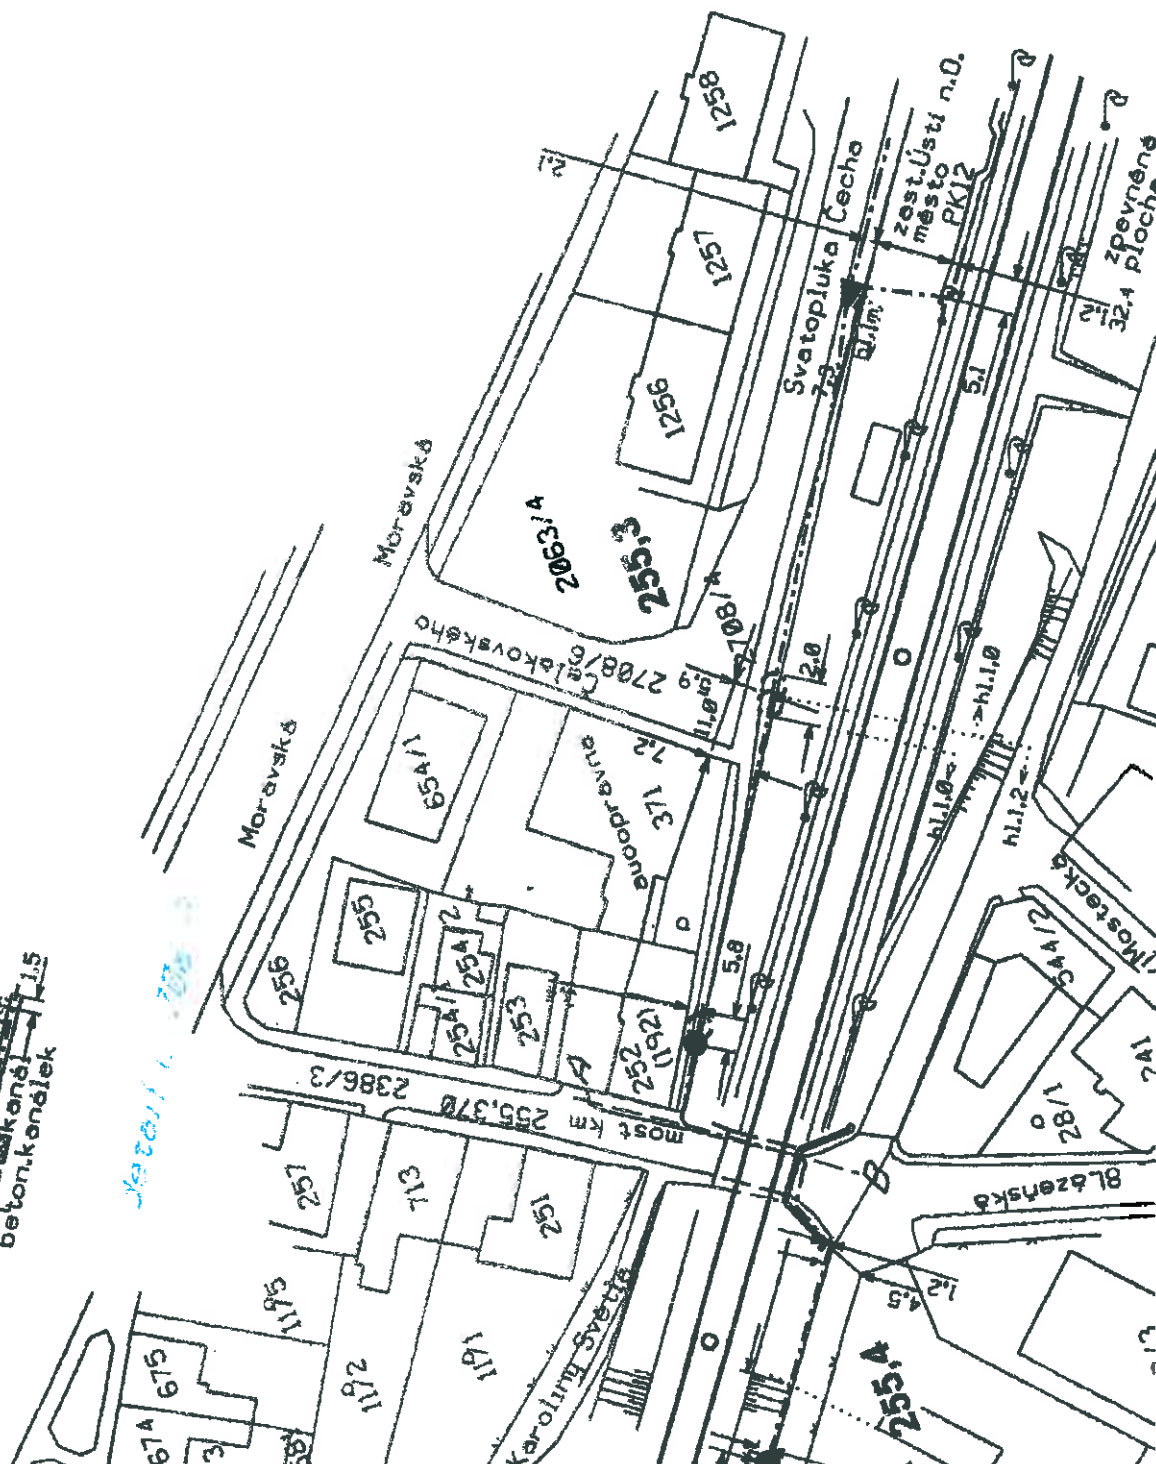

ÚSTÍ n. ORLICÍ

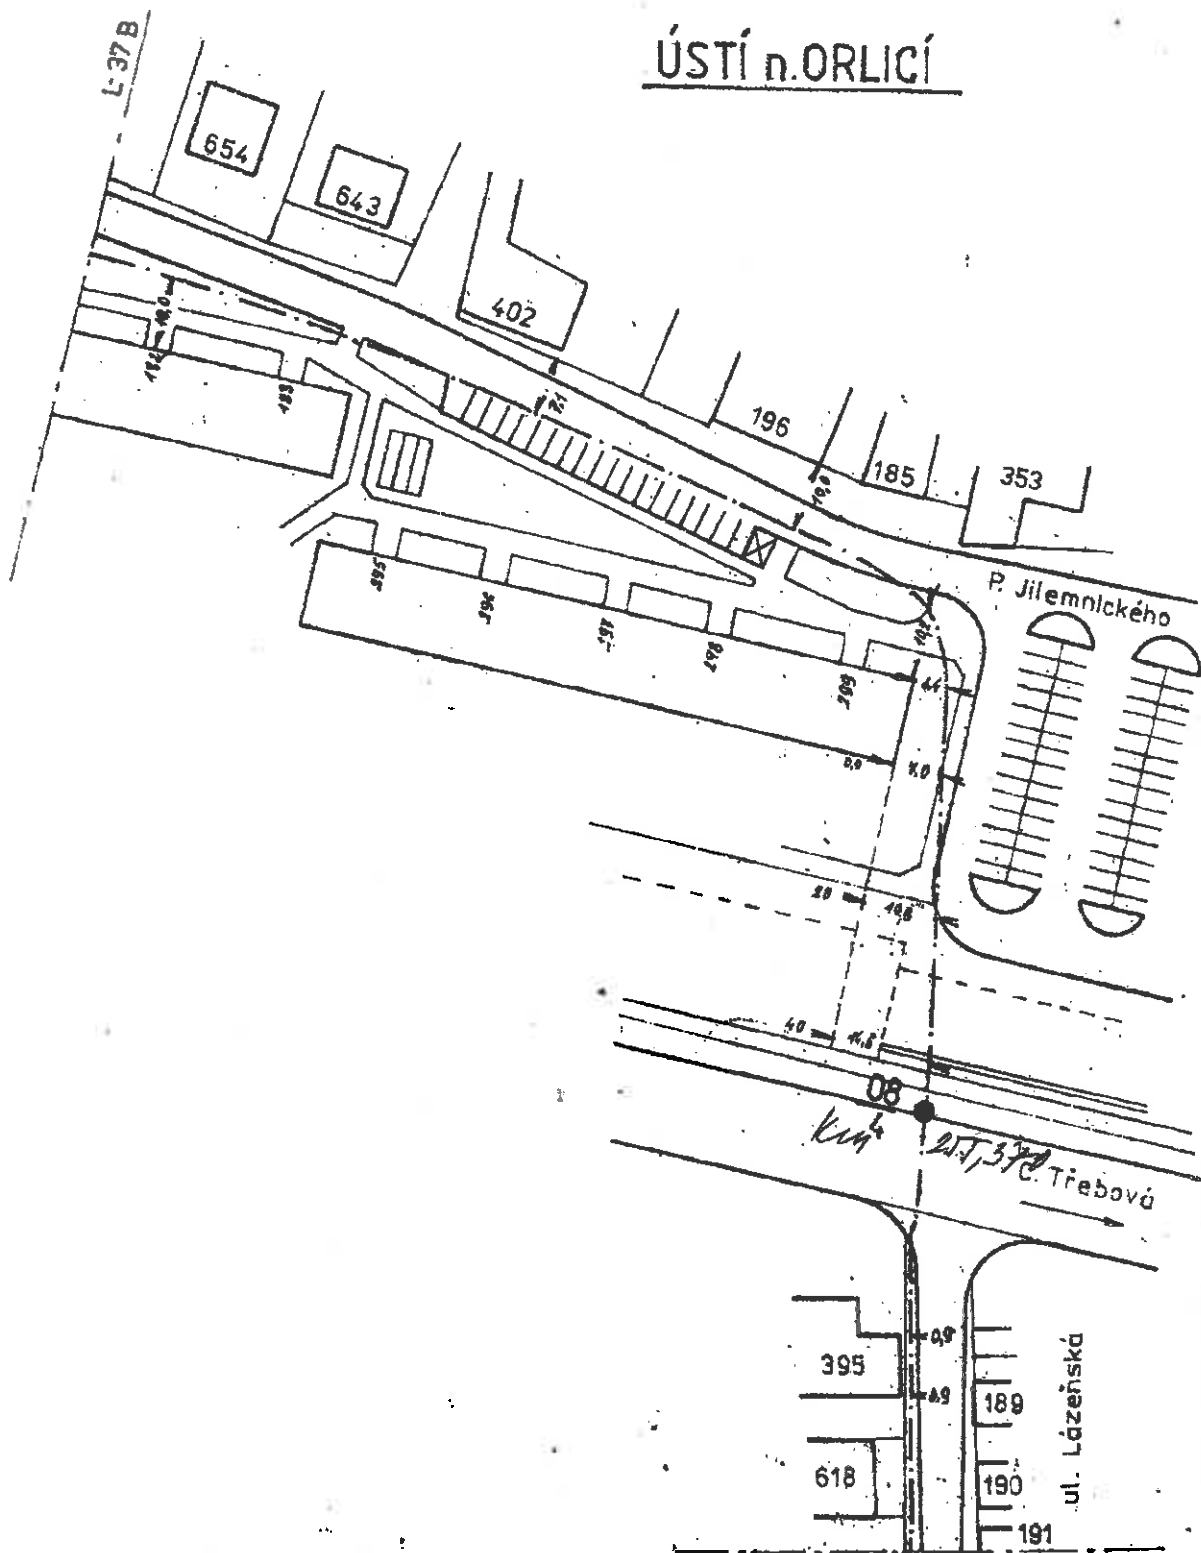


SKO Hradec Král. 1:1000	Návrh			Poručka č.															C. TŘEBOVÁ -
	Kreslil	M. J. 19		Oprava č.															ÚSTÍ n. ORL.
	Zkoušel			Plati od															L-36 Ba

Ústí nad Orlicí-Česká Třebová

1:1000

L 5

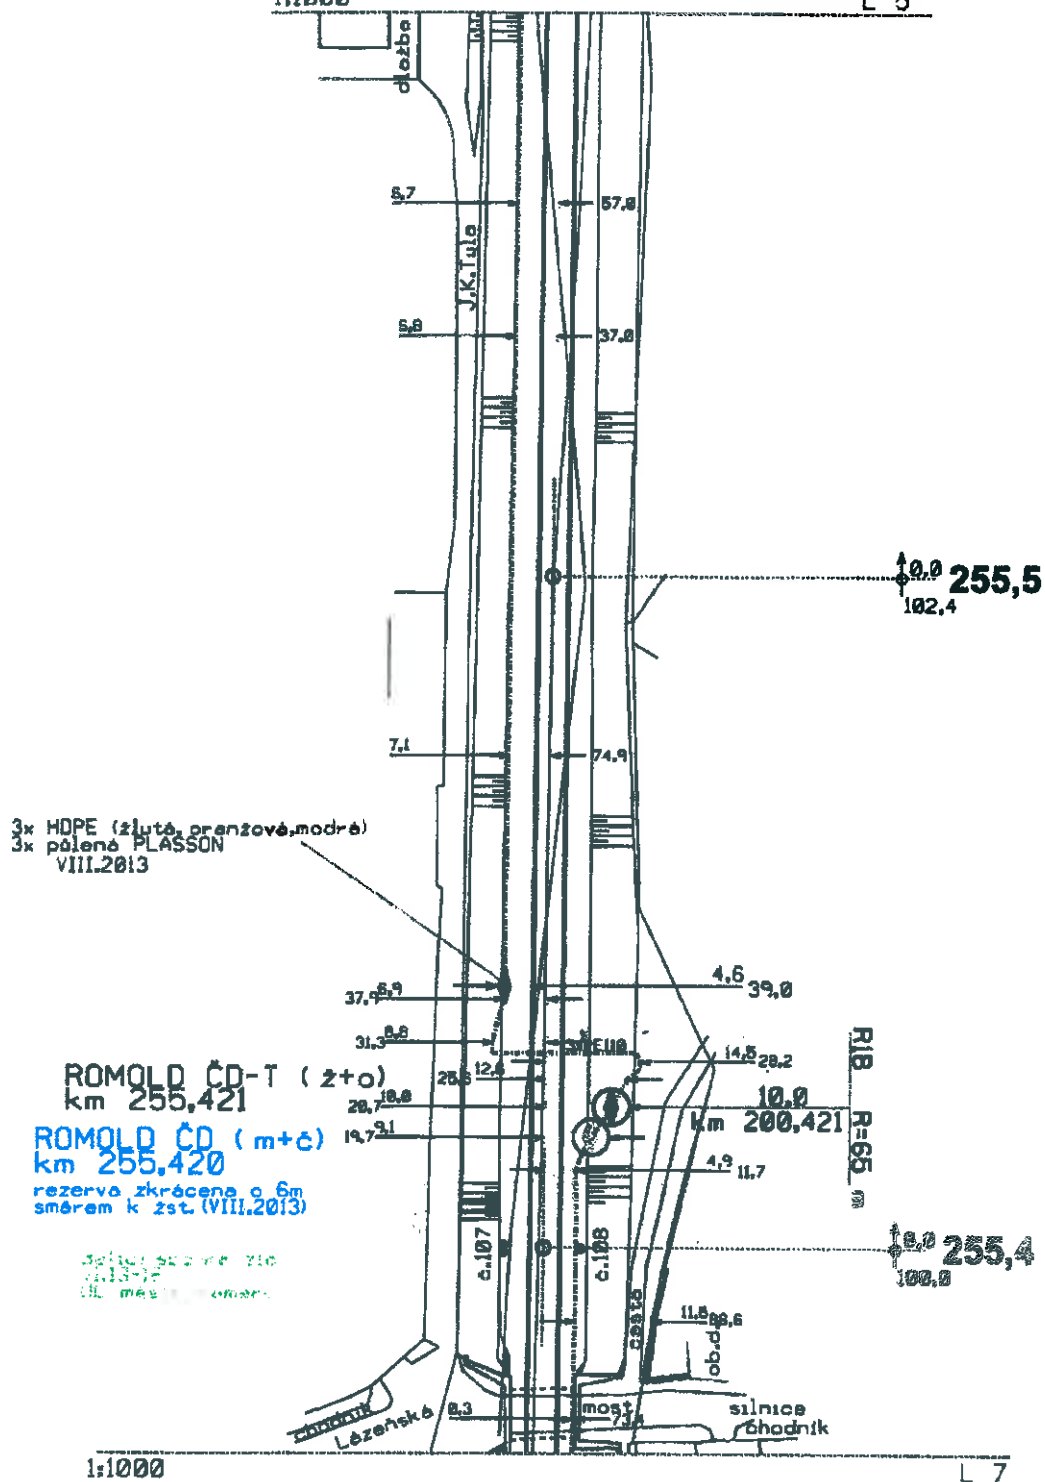



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň



ČD-Telematika

Schváleno SZDC – TÚDC č.j.: 3495/10–TÚDC ze dne: 1. 9. 2010

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o.:

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědná za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízeních telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. (dále jen SZDC)

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SZDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačního vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajišťí:

- aby stavební objekty a provozní soubory v majetku SZDC zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení byly v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č. 146/2008 Sb. a upřesněnou směnicí SZDC 11/2006,
- aby činnosti na majetku SZDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah,
- pisemné vyrozumění organizací, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uložení vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubkových strojů, sbíječků apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů poježděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce ztuhlila zemina pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Česká Třebová, Dlouhý Vlastimil, tel.: +420 602 760 627, Jasanský Jan, tel.: +420 724 815 170, k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 „Uzemnění a ochranné vodiče“
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Česká Třebová, Dlouhý Vlastimil, tel.: +420 602 760 627, Jasanský Jan, tel.: +420 724 815 170, HELP DESK, tel.: +420 972 110 000,
- ohlášení ukončení stavby organizací, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek,
- provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb., „Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl. č. 101/1995 Sb., a příslušných výnosů SZDC (zejména Směnice SZDC č. 50). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SZDC,
- vyřešení věcných břemen v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SZDC nebo Českých drah,
- s ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SZDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Všeobecné podmínky pro vytyčení trasy:

- Sdělování polohy a vytyčení je prováděno pracovníky ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Česká Třebová, Dlouhý Vlastimil, tel.: +420 602 760 627, Jasanský Jan, tel.: +420 724 815 170 dle platného ceníku.
- Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
- V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny náklady spojené s tímto vytyčením.
- Vytyčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zasláné nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte číslo vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 a objednávka bude zaslána na adresu ČD - Telematika a.s., Centrální Podatelna - U2, Pod Táborem 369/3a, 190 01 Praha 9.

Vyjádření vydala: ČD - Telematika a.s., servis kabelových sítí Česká Třebová z pověření SZDC, TÚDC

Sídlo firmy: ČD - Telematika a. s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8938,

IČO: 61 45 94 45

DIČ: CZ61459445

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku a správě ČD – Telematika a.s.:

Stavebník je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- písemné vyznění organizaci, která vydala výjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Česká Třebová, Dlouhý Vlastimil, tel.: +420 602 760 627, Jasanský Jan, tel.: +420 724 815 170, k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům (včetně, např. trvalých parkovišť apod.) . Bez souhlasu majitele, správce nesnižovat, ani nezvyšovat krytí nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 „Uzemnění a ochranné vodiče“
- neprodleně ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Česká Třebová, Dlouhý Vlastimil, tel.: +420 602 760 627, Jasanský Jan, tel.: +420 724 815 170, HELP DESK, tel: +420 972 110 000.
- ohlášení ukončení stavby organizaci, která vydala výjádření, včetně správce a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení a to v případech, kdy je vedení umístěno na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu.
- s ohledem na to, že majitel, správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.
- V případě, že stavebník poškodí kabel v majetku, správě ČD - Telematika a.s. :
 1. je povinen uhradit společnosti ČD – Telematika a.s. smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč za každou započatou hodinu trvání přerušení kabelu,
 2. je povinen uhradit společnosti ČD – Telematika a.s. jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,00 Kč,
 3. tím není dotčeno právo ČD – Telematika, a.s. na náhradu škody

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Z výše uvedených důvodů považuje společnost ČD - Telematika a.s. veškeré činnosti spojené s přeložkou, překládkou či manipulací s již provozovaným kabelovým majetkem za nezadatelné. Tyto činnosti je oprávněna provozovat pouze ČD – Telematika a.s. Jedná se především o souhrn demontáží, montáží a měření optických vláken a kabelových souborů.

Všeobecné podmínky pro vytyčení trasy:

- Sdělování polohy a vytyčení je prováděno pracovníky ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Česká Třebová, Dlouhý Vlastimil, tel.: +420 602 760 627, Jasanský Jan, tel.: +420 724 815 170 dle platného ceníku.
- Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
- V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny náklady spojené s tímto vytyčením.
- Vytyčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zasláné nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uvedte číslo výjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 a objednávka bude zaslána na adresu ČD - Telematika a.s., Centrální Podatelna – U2, Pod Táborem 369/3a, 190 01 Praha 9.
- Termín, způsob a forma vytyčení je možno řešit individuálně po telefonické dohodě.


Vyjádření vydala: ČD - Telematika a.s., servis kabelových sítí Česká Třebová

Sídlo firmy: ČD - Telematika a. s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8938,

IČO: 61 45 94 45

DIČ: CZ61459445

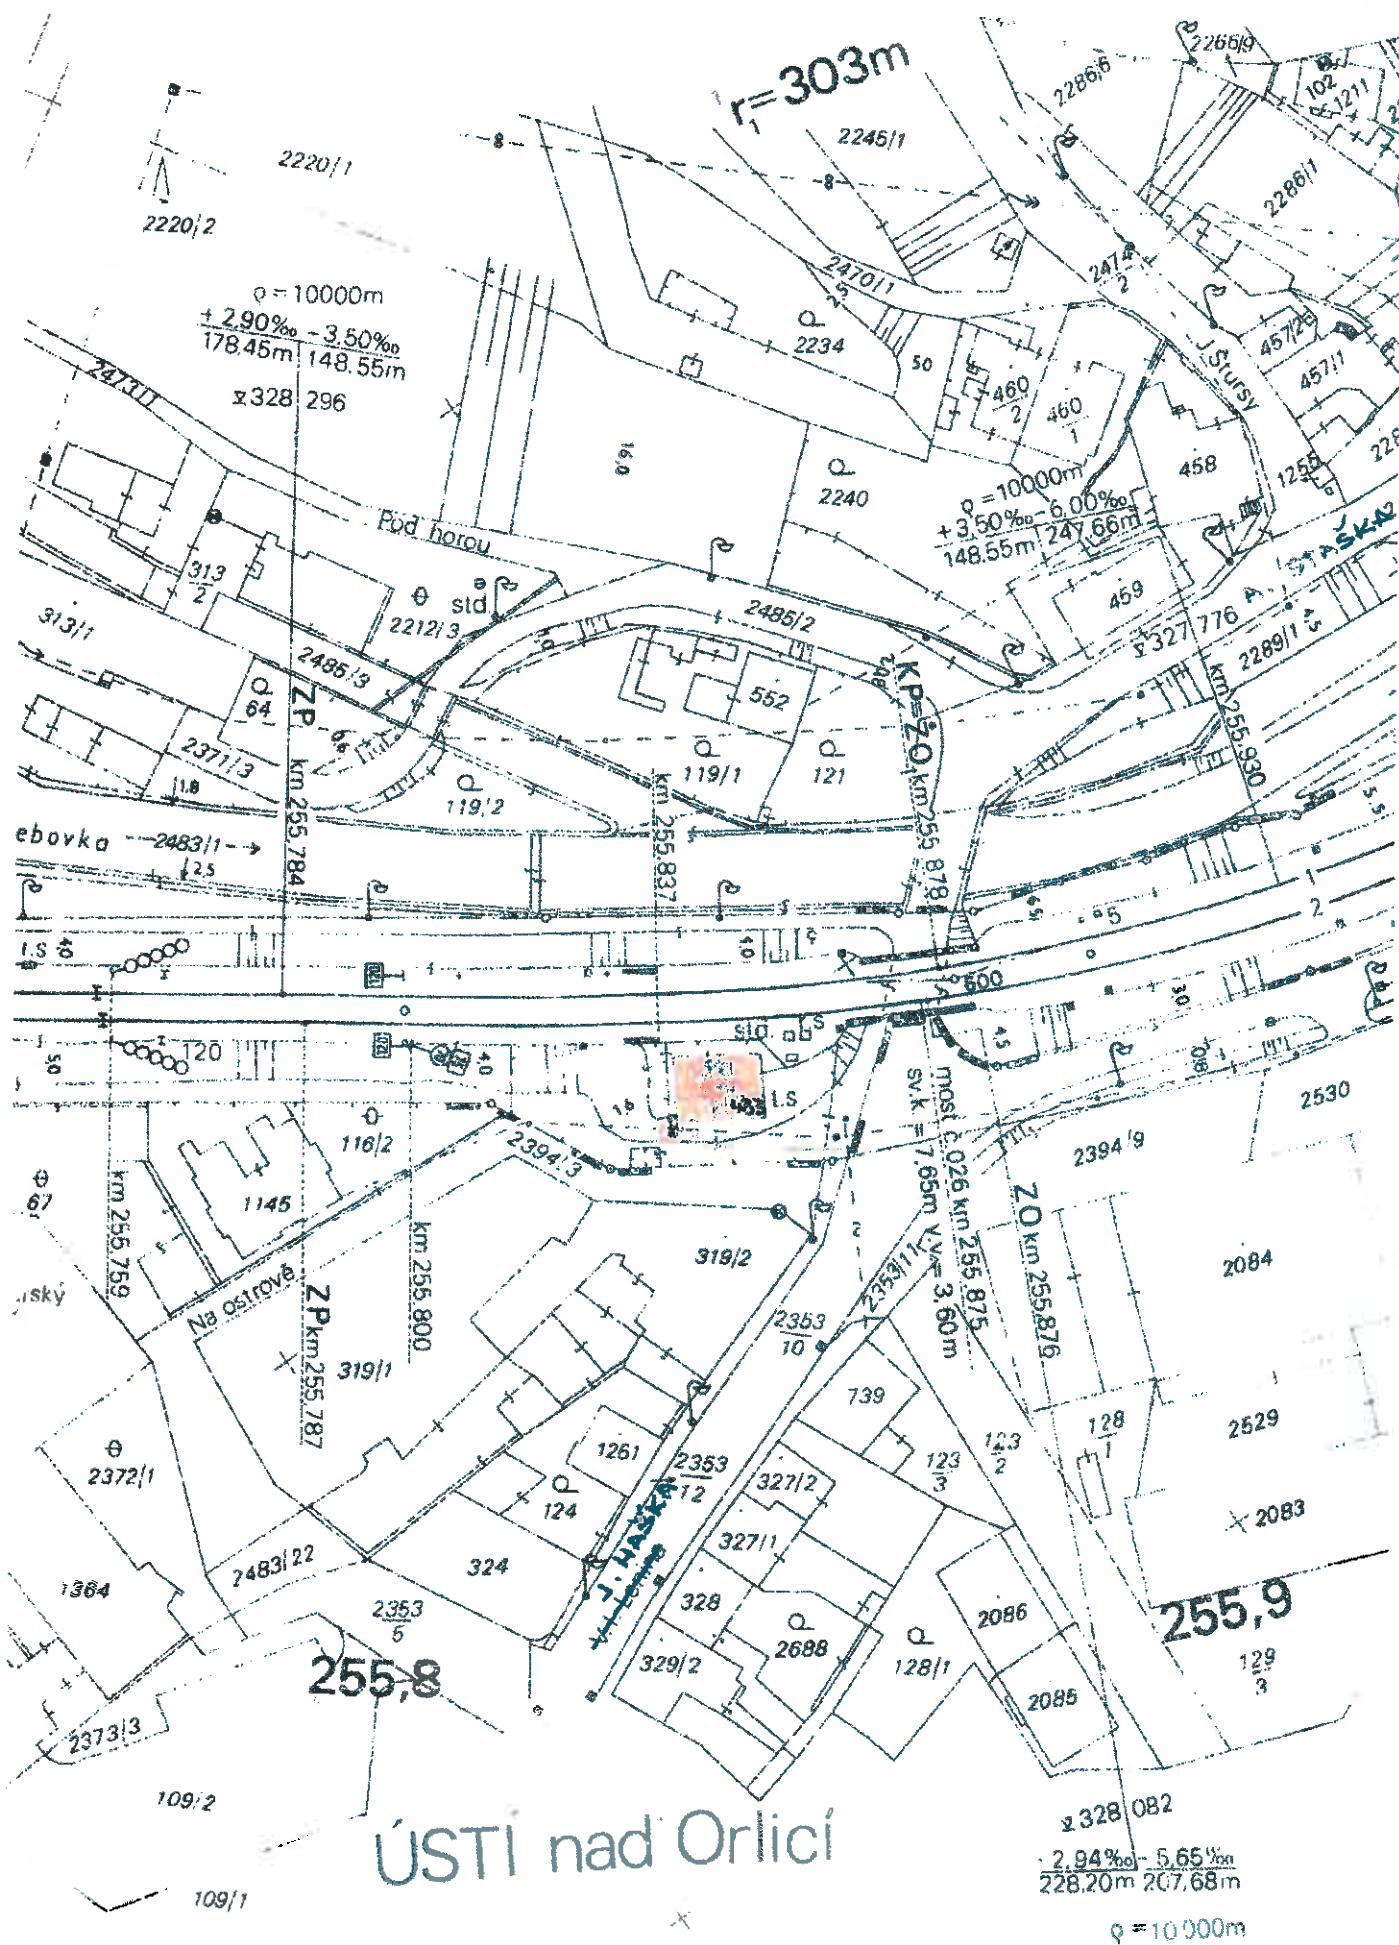

Coufal Pavel

Od: Karel Pražák <Karel.Prazak@tepvos.cz>
Odesláno: 24. ledna 2014 14:17
Komu: Coufal Pavel
Kopie: Iveta Dolezalova; Václav Knejp
Předmět: žádost o souhrnné stanovisko k akci KaČOV - změna 2
Přílohy: UNO - SITUACE KATASTRÁLNÍ_pro ČD-1.pdf; UNO - SITUACE KATASTRÁLNÍ_pro ČD-2.pdf; 1.15-1_30_OCE.pdf; KaČOV změny v OP dráhy.pdf

SŽDC,s.o.
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259/1
501 01 Hradec Králové

14.2.2014
1681/2014-02
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(17)

Věc: žádost o souhrnné stanovisko ke změně č. 2 PD

Název stavby: „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV“ – část 1A Ústí nad Orlicí a část 2 přeložky vodovodů :

TEPVOS, spol. s r.o. zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C., vložka 16762, sídlo: Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČ: 25945793, zastoupený jednatelem Ing. Václavem Knejpem tímto žádá o souhrnné stanovisko k vynuceným změnám vyvolaných nepředvídatelnými okolnostmi ,v jiném umístění stávajících podzemních sítí apod. u stavby: „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ : u částí 1A kanalizace a části 2 přeložky vodovodů v obci Ústí nad Orlicí

Změny jsou vyznačeny v příložených situacích fialovou barvou včetně popisu fialovou barvou , v první příloze zvýrazněné žlutou barvou. V poslední příloze je podélný profil – křížení stoky OS 4 s drážním tělesem u strážního domku v ul. M.R.Štefánika čp. 433 na st. 534 a dále přes p.č. 2506/5 v k.ú. Ústí nad Orlicí , vlastník je na l.v 1509 – SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, Praha 1

Změny:

situace č. 1 v první příloze z katastrální pro ČD-1 :

k.ú. Kerhartice v žel. km cca 257,750 až 257,900 - souběh

- SO 1.11.1 Pražská - nová stoka K-4-0A- výstavba byla vynucena jako náhradní řešení za nemožnost realizace stoky K4 z důvodu tekutých písků, je z PP DN 300 délky 340,24 m a odvádí splaškové vody z části Pražské ulice – od konce Kerhartic k autobusové zastávce , je vedena k řece a podél ní do šachty před shybkou pod Tichou Orlicí v Sokolské ulici

situace č. 2 v první příloze z katastrální pro ČD-1 :

V k.ú. Kerhartice nad Orlicí v žel.km cca 257,350 až 257,400 - souběh

- SO 1.11.2 – stoka K-5-2 Karpaty – úprava trasy mezi šachtami K33 až K53 přes pozemek p.č. 330/20 v k.ú. Kerhartice n.O., vložení 2 ks šachet a změna délky na celkem 238,77m
- SO 2.11.2 – vodovodní řad 19 Karpaty, změna napojovacího místa na DN 150 za podjezdem
- SO 2.11.2 – vodovodní řad 21 Karpaty- změna trasy přes pozemek p.č. 330/20 v k.ú. Kerhartice n.O., změna napojovacího místa na DN 150, změna délky na 52 m a přepojením posádky v jiném napojovacím místě - není realizován řad 32
- SO 2.11.2 – vodovodní řad 32 - nerealizován

situace č. 3 v první příloze z katastrální pro ČD-2 :

V k.ú. Ústí nad Orlicí v žel.km cca 255,820 až 255,890 – křížení v žel.km 255,820

- SO 1.15 – stoka OS4 v ul. Na Ostrově, její zkrácení a změnu ve vyústění do Třebovky překopem přes nový pozemek st. 534 v k.ú. Ústí nad Orlicí a překopem opuštěného železničního náspu po přemístění kolejí

na novou estakádu, z materiálu sklolaminát SN 10000 DN 1500 v nové zkrácené délce 115,6 m s osazením nové šachty OS2 se zpětnou klapkou, dále bude provedena překopem silnice I/14

situace č. 4 v první příloze z katastrální pro ČD-2 :

V k.ú. Ústí nad Orlicí v žel.km cca 255,360 až 255,480

- SO 1.02 - nová stoka C-0-1 v ul. J.K.Tyla na pozemcích p.č. 2483/6 a 2157/5 v k.ú. Ústí nad Orlicí z PP DN 250 v délce 104,29 m s napojením do stoky C-O do Lázeňské ul. pro gravitační odkanalizování stávajících objektů
- SO 1.02 - šachta C18 v ul. Svatopluka Čecha bude nahrazena spojnou komorou SK8 na pozemku p.č. 2708/4 v k.ú. Ústí nad Orlicí z důvodu napojení stoky DN 800, realizace SK 8 si také vyžádá nový propoj se stávající kanalizací DN 800

Děkuji za vyřízení žádosti.

Pokud bude potřeba žádost doplnit, můžete mne kontaktovat.

V pátek dne 31.1.2014 je od 9:00 hodin koordinační jednání u nás na TEPVOSu v Ústí nad Orlicí, pokud bude potřeba přizveme projektanta.

S pozdravem

Karel Pražák
investiční technik

TEPVOS, spol. s r.o.
Třebovská 287
562 03 Ústí nad Orlicí

tel. 465 519 852
mob. 608 55 33 03
e-mail: karel.prazak@tepvos.cz

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		č.	
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY		ZL č.1A-110	
Komu: TEPVOS, spol. s r.o.		Datum:	
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.15 stoky B, OS4, odlehčovací komora OK4	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:			
Důvod změny: Rozdíl mezi ZDS a RDS			
Popis změny:			
SO 1.15 stoky B, OS4, odlehčovací komora OK4 – v průběhu realizace došlo k následujícím vícepracím:			
- Zajištění kabelů ČEZ při výkopových pracích podél OK4, RK1 a SP1 - Bourání septiku a dopojení kanalizace u vodovodního řadu 27 - Tlaková přípojka čp. 224 - Přeložka kabelu ČD u š.OS12 - Přeložka kabelu VO u š.OS12 - Oprava chodníku a komunikace u š.OS12 - Dopojení kanalizace u šachty OS12 - Bourání betonového základu (základ sloupu) - st.0,016 km - Bourání teplovodního kanálu u VÚB - st.0,129-0,135 km - Dešťová kanalizace pro čp. 224 + obnova kolizního místa na daném místě - st.0.076-0.132			
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny:			
Vícepráce 945 197,63 Kč			
Méněpráce 0,00 Kč			
Celkem 945 197,63 Kč			
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí - 2. 04. 2015 Datum:		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí - 2. 04. 2015 Datum:	
Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí - 2. 04. 2015 Datum:		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí - 2. 04. 2015 Datum:	

Rekapitulace				
--------------	--	--	--	--

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.15 stoky B, OS4, odlehčovací komora OK4	ZL 1A-110	0,00 Kč	945 197,63 Kč	945 197,63 Kč
CELKEM		0,00 Kč	945 197,63 Kč	945 197,63 Kč

Pol.	vp / mp	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena rozdílu Kč
						945 197,63 Kč
	vp	SO 1.15 STOKY B, OS-4, ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4 - Zajištění kabelů ČEZ při výkopových pracích podél OK4, RK1 a SP1				49 936,76 Kč
	vp	Zemní práce				30 157,52 Kč
1.45.5 - 8	vp	VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ Podél silnice	km	0,047	6 634,50	311,82 Kč
1.45.5 - 9	vp	SEJMUTÍ DRNU Nářez dřvu,naložení,odvoz	m2	37,600	57,10	2 146,96 Kč
119001422	vp	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	47,000	240,00	11 280,00 Kč
1.15-7	vp	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	22,560	39,80	897,89 Kč
1.45.5 - 15	vp	HLoubení KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře 500mm,hloubka 800mm	m	47,000	132,70	6 236,90 Kč
1.45.5 - 17	vp	ZÁŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ Šíře do 65cm,tloušťka 5cm	m	47,000	37,20	1 748,40 Kč
1.45.5 - 18	vp	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	47,000	15,90	747,30 Kč
1.45.5 - 20	vp	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 Šíře 500mm,hloubka 700mm	m	47,000	66,30	3 116,10 Kč
1.45.5 - 21	vp	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	2,260	39,80	89,95 Kč
1.45.5 - 22	vp	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	11,300	21,20	239,56 Kč
1.45.5 - 23	vp	ÚPRAVA POVRCHU Položení dřvu	m2	37,600	59,70	2 244,72 Kč
1.45.5 - 24	vp	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ Zemina třídy 3	m2	37,600	29,20	1 097,92 Kč
	vp	Přípravné a přídržné práce				6 995,25 Kč
1.15 - 35	vp	Vytrhání obrub chodníkových včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	47,000	119,40	5 611,80 Kč
1.15 - 36	vp	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	6,815	139,30	949,33 Kč
1.15 - 37	vp	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,815	63,70	434,12 Kč
	vp	Komunikace				12 784,00 Kč
1.15 - 115	vp	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	47,000	192,40	9 042,80 Kč
1.15 - 116	vp	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	47,000	79,60	3 741,20 Kč
	vp	SO 1.15 STOKY B, OS-4, ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4 - Bourání septiku a dopojení kanalizace u vod.řadu 27				24 452,78 Kč
	vp	Bourání ve výkopu				14 900,03 Kč
1.15 - 45	vp	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	6,944	1 658,60	11 517,32 Kč
1.15 - 46	vp	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	3,472	4,00	13,89 Kč
1.15 - 47	vp	Vodorovné přemístění suti skládku vč.uložení	m3	6,944	345,00	2 395,68 Kč
1.15 - 48	vp	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,277	63,70	973,14 Kč
	vp	Dopojení kanalizace u vod.řadu 27 - st.0.024-0,030 km				9 552,75 Kč
1.15 - 7	vp	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	1,200	39,80	47,76 Kč
	vp	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek				518,77 Kč
1.15 - 10	vp	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,324	942,10	305,24 Kč
1.15 - 11	vp	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	2,538	2,70	6,85 Kč
1.15 - 16	vp	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	0,162	4,00	0,65 Kč
1.15 - 17	vp	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	5,076	345,00	1 751,22 Kč
1.15 - 21	vp	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	0,324	345,00	111,78 Kč
1.15 - 22	vp	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,700	108,80	293,76 Kč
1.15 - 23	vp	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,700	106,20	286,74 Kč
1.15 - 24	vp	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	5,400	8,00	43,20 Kč
1.15 - 25	vp	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146, vhodné vytříděné zeminy z výkopů a recyklátů dle TP146	t	4,860	159,20	773,71 Kč
1.15 - 27	vp	Štěrkopísek frakce 8-16	t	5,130	205,70	1 055,24 Kč
1.15 - 50	vp	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,540	477,70	257,96 Kč
3.53 - 27	vp	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	6,000	42,50	255,00 Kč
3.53 - 30	vp	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 200	kus	2,000	272,00	544,00 Kč
3.53 - 40	vp	Kanalizační potrubí PVC DN 200 SN 8	m	6,558	456,50	2 993,73 Kč
3.53 - 43	vp	Koleno kanalizační PVC DN 200/90°	kus	2,030	151,30	307,14 Kč
	vp	SO 1.15 STOKY B, OS-4, ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4 - Přeložka ČEZ				163 487,38 Kč
Faktura Tepvos	vp	Přeložka realizovaná společností ČEZ	kpl	1,000	163 487,38	163 487,38 Kč
	vp	SO 1.15 STOKY B, OS-4, ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4 - Tlaková přípojka čp. 224				131 765,45 Kč
	vp	Zemní práce				50 933,35 Kč
1.15 - 4	vp	Dočasné zajištění potrubí	m	1,200	311,80	374,16 Kč
1.15 - 5	vp	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,200	252,10	302,52 Kč
1.15 - 6	vp	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,650	59,70	98,51 Kč
1.15 - 7	vp	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	11,230	39,80	446,95 Kč
	vp	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek				4 838,15 Kč
1.15 - 10	vp	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	47,340	102,20	4 838,15 Kč
1.15 - 11	vp	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	3,020	942,10	2 845,14 Kč
1.15 - 12	vp	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	106,250	33,20	3 527,50 Kč
1.15 - 14	vp	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	106,250	9,30	988,13 Kč
1.15 - 16	vp	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	47,340	2,70	127,82 Kč
1.15 - 17	vp	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 50 m	m3	3,020	4,00	12,08 Kč
1.15 - 19	vp	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.naložení	m3	1,650	33,20	54,78 Kč
1.15 - 20	vp	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	5,170	79,60	411,53 Kč
1.15 - 21	vp	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	42,180	345,00	14 552,10 Kč
1.15 - 22	vp	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,020	345,00	1 041,90 Kč
1.15 - 23	vp	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	35,390	108,80	3 850,43 Kč
1.15 - 24	vp	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	10,050	106,20	1 067,31 Kč
1.15 - 25	vp	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	16,500	8,00	132,00 Kč
1.15 - 26	vp	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146, vhodné vytříděné zeminy z výkopů a recyklátů dle TP146	t	16,500	37,20	613,80 Kč
1.15 - 27	vp	Štěrkopísek frakce 8-16	T	31,900	159,20	5 078,48 Kč
1.15 - 28	vp	Štěrkošif, kamenivo D-63	T	18,650	205,70	3 836,31 Kč
1.15 - 29	vp		T	24,170	278,60	6 733,76 Kč

	vp	Přípravné a přidružené práce					3 514,04 Kč
1.15 - 31	vp	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	26,050	14,60		380,33 Kč
1.15 - 32	vp	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	26,050	23,90		622,60 Kč
1.15 - 36	vp	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	12,370	139,30		1 723,14 Kč
1.15 - 37	vp	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,370	63,70		787,97 Kč
	vp	Přípravné a přidružené práce - živice					14 719,99 Kč
1.15 - 39	vp	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	26,050	73,00		1 901,65 Kč
1.15 - 40	vp	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	47,760	73,00		3 486,48 Kč
1.15 - 42	vp	Řezání stávajícího živiniého krytu tl. do 5 cm zalití styč.spar asfaltovou záplivkou a posypem	m	43,420	92,90		4 033,72 Kč
1.15 - 41	vp	Řezání stávajícího živiniého krytu tl. 5 - 10 cm	m	43,420	73,00		3 169,66 Kč
1.15 - 43	vp	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	8,670	139,30		1 207,73 Kč
1.15 - 44	vp	Poplatek za recyklaci	t	8,670	106,20		920,75 Kč
	vp	Podkladní a vedlejší konstrukce					7 356,21 Kč
1.15 - 50	vp	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	4,450	477,70		2 125,77 Kč
1.15 - 51	vp	Bloky pod potrubí B 12,5	m	0,450	3 264,20		1 468,89 Kč
2.07 - 42	vp	Bednění bloků pod potrubí	m	4,500	835,90		3 761,55 Kč
	vp	Trubní vedení					23 990,01 Kč
1.17 - 62	vp	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 40 mm vč.tvarovek	m	58,640	45,10		2 644,66 Kč
1.17 - 63	vp	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80 vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách	m	58,640	17,20		1 008,61 Kč
2.01 - 54	vp	Napojení do revizní šachty PŠ1, kompletní provedení	kus	1,000	9 222,00		9 222,00 Kč
2.03 - 44	vp	Napojení na stávající přípojku univerzální mechanickou spojkou min.PN10	kus	1,000	9 222,00		9 222,00 Kč
1.17 - 66	vp	Trubka tlaková PE HD (PE 100 RC) d. 40 x 3,7 mm vč.tvarovek	m	59,520	31,80		1 892,74 Kč
	vp	Elektromontáže					1 477,73 Kč
2.01 - 62	vp	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 4	m	58,640	25,20		1 477,73 Kč
	vp	Zemní práce při montážích					932,38 Kč
2.01 - 63	vp	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	58,640	15,90		932,38 Kč
	vp	Komunikace					28 841,76 Kč
1.15 - 106	vp	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	26,050	119,40		3 110,37 Kč
1.15 - 108	vp	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	26,050	159,20		4 147,16 Kč
1.15 - 109	vp	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	26,050	252,10		6 567,21 Kč
1.15 - 110	vp	Postřik živiný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	26,050	29,20		760,66 Kč
1.15 - 111	vp	Postřik živiný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	47,760	26,50		1 265,64 Kč
1.15 - 112	vp	Beton asfalt. ABJ/ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 5 cm	m2	47,760	272,00		12 990,72 Kč
	vp	SO 1.15 STOKY B, OS-4, ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4 - Přeložka kabelu ČD u š.OS12					93 998,00 Kč
	vp	Zemní práce					79 932,00 Kč
1.05 - 5	vp	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	20,000	252,10		5 042,00 Kč
1.45.1 - 1	vp	Výkop a zához kabel.rýhy (původní trasa)	m	20,000	769,60		15 392,00 Kč
1.45.1 - 2	vp	Výkop a zához kabel.rýhy (nová trasa)	m	20,000	557,30		11 146,00 Kč
1.45.1 - 4	vp	Přenesení DK do nové trasy	m	20,000	849,20		16 984,00 Kč
1.45.1 - 5	vp	Položení žlabové trasy	m	20,000	1 247,30		24 946,00 Kč
1.45.1 - 6	vp	Krytí výstražnou fólií	m	20,000	321,10		6 422,00 Kč
	vp	Komunikace			15,90		14 066,00 Kč
1.45.1 - 10	vp	Kabelový žlab KŽ 13	m	20,000	703,30		14 066,00 Kč
	vp	SO 1.15 STOKY B, OS-4, ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4 - Přeložka kabelu VO u š.OS12					10 894,38 Kč
1.45.5 - 8	vp	VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ Podél silnice	km	0,021	6 634,50		139,32 Kč
1.05 - 5	vp	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	21,000	252,10		5 294,10 Kč
1.45.5 - 15	vp	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 šíře 500mm hloubka 800mm	m	21,000	132,70		2 786,70 Kč
1.45.5 - 17	vp	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ Šíře do 65cm,tloušťka 5cm	m	21,000	37,20		781,20 Kč
1.45.5 - 18	vp	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC ŠÍŘKA 33cm	m	21,000	15,90		333,90 Kč
1.45.5 - 20	vp	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 šíře 500mm,hloubka 700mm	m	21,000	66,30		1 392,30 Kč
1.45.5 - 21	vp	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	2,100	39,80		83,58 Kč
1.45.5 - 22	vp	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	10,500	21,20		222,60 Kč
	vp	SO 1.15 STOKY B, OS-4, ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4 - Oprava chodníku a komunikace u š.OS12					75 365,48 Kč
	vp	Zemní práce					23 172,28 Kč
113106152	vp	Rozebrání vozovky do 50m2 velké kostky	m2	41,250	58,30		2 404,88 Kč
113107131	vp	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, bet.prostý tl. 15 cm	m2	45,900	442,00		20 287,80 Kč
113202111	vp	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	11,000	43,60		479,60 Kč
	vp	Komunikace					30 297,75 Kč
567114112	vp	Podkladový beton tř.PBII tl.100 mm	m2	41,250	297,00		12 251,25 Kč
591141111	vp	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	34,050	530,00		18 046,50 Kč
	vp	Doplňující práce na komunikaci					11 572,45 Kč
916111113	vp	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou (dvojlinka)	m	36,000	139,00		5 004,00 Kč
917461111	vp	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	263,00		2 893,00 Kč
919735113	vp	Řezání stávajícího živiniého krytu tl. 10 - 15 cm	m	18,000	95,20		1 713,60 Kč
979024442	vp	Očištění vybouraných chodníkových obrubníků	m	11,000	20,10		221,10 Kč
979071112	vp	Očištění vybour. kostek velkých s výplní MC	m2	41,250	42,20		1 740,75 Kč
	vp	Staveništní přesun hmot					3 664,60 Kč
998223011	vp	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	t	25,100	146,00		3 664,60 Kč
	vp	Přesuny suti a vybouraných hmot					6 658,40 Kč
1.15 - 90	vp	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na skládku vč.uložení	t	32,800	139,30		4 569,04 Kč
1.15 - 91	vp	Poplatek za skládkovné suti	t	32,800	63,70		2 089,36 Kč
	vp	SO 1.15 STOKY B, OS-4, ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4 - Dopojení kanalizace u šachty OS12					17 453,83 Kč
	vp	Zemní práce					6 953,85 Kč
1.15 - 23	vp	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,800	108,80		1 175,04 Kč
1.15 - 24	vp	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,400	106,20		573,48 Kč
1.15 - 27	vp	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146, vhodné vytříděné zeminy z výkopů a recyklátů dle TP146	T	19,440	159,20		3 094,85 Kč
1.15 - 28	vp	Šterkopisek frakce 8-16	T	10,260	205,70		2 110,48 Kč
	vp	Podkladní a vedlejší konstrukce					515,92 Kč
1.15 - 50	vp	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	1,080	477,70		515,92 Kč
	vp	Trubní vedení					9 984,06 Kč
3.53 - 27	vp	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	12,000	42,50		510,00 Kč
3.53 - 30	vp	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 200	kus	1,000	272,00		272,00 Kč
3.53 - 40	vp	Kanalizační potrubí PVC DN 200 SN 8	m	13,116	456,50		5 987,45 Kč
N 1A-6-9	vp	Koleno kanalizační PVC DN 200/45°	kus	1,015	3 167,10		3 214,61 Kč
	vp	SO 1.15 STOKY B, OS-4, ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4 -Bourání bet.základu (žb základ sloupu) - st.0,016 km					26 611,44 Kč
	vp	Bourání ve výkopu					26 611,44 Kč

1.15 - 45	vp	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	12,402	1 658,60	20 569,96 Kč
1.15 - 46	vp	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	6,201	4,00	24,80 Kč
1.15 - 47	vp	Vodorovné přemístění suti skládku vč.uložení	m3	12,402	345,00	4 278,69 Kč
1.15 - 48	vp	Poplatek za skládku stavební suti	t	27,284	63,70	1 737,99 Kč
	vp	SO 1.15 STOKY B, OS-4, ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4 - Bourání teplovodního kanálu u VÚB - st.0,129-0,135 km				7 507,26 Kč
	vp	Bourání ve výkopu				5 407,26 Kč
1.15 - 45	vp	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	2,520	1 658,60	4 179,67 Kč
1.15 - 46	vp	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	1,260	4,00	5,04 Kč
1.15 - 47	vp	Vodorovné přemístění suti skládku vč.uložení	m3	2,520	345,00	869,40 Kč
1.15 - 48	vp	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,544	63,70	353,15 Kč
	vp	Ostatní práce - odstranění stáv.potrubi				2 100,00 Kč
N1A-110-1	vp	HZS - dělník	hod	6,000	350,00	2 100,00 Kč
	vp	SO 1.15 STOKY B, OS-4, ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4 - Dešťová kanalizace po čp.224 + obnova kolizního místa na daném místě - st.0.076-0.132 km				320 512,03 Kč
	vp	SO 1.15 STOKY B, OS-4, ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4 - Bourání bet.základu - st.0,016 km				228 827,88 Kč
	vp	Zemní práce				52 078,84 Kč
1.15 - 10	vp	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	51,648	102,20	5 278,43 Kč
1.15 - 11	vp	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,297	942,10	3 106,10 Kč
1.15 - 16	vp	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	25,824	2,70	69,72 Kč
1.15 - 17	vp	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	1,649	4,00	6,60 Kč
1.15 - 21	vp	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	51,648	345,00	17 818,56 Kč
1.15 - 22	vp	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	3,297	345,00	1 137,47 Kč
1.15 - 23	vp	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	29,970	108,80	3 260,74 Kč
1.15 - 24	vp	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	24,975	106,20	2 652,35 Kč
1.15 - 25	vp	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	49,950	8,00	399,60 Kč
1.15 - 27	vp	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146, vhodné vytříděné zeminy z výkopů a recyklátů dle TP146	T	53,946	159,20	8 588,20 Kč
1.15 - 28	vp	Štěrkopisek frakce 8-16	T	47,453	205,70	9 761,08 Kč
	vp	Přípravné a přidružené práce				6 057,72 Kč
1.15 - 33	vp	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	43,200	19,90	859,68 Kč
1.15 - 34	vp	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	43,200	23,90	1 032,48 Kč
1.15 - 36	vp	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	20,520	139,30	2 858,44 Kč
1.15 - 37	vp	Poplatek za skládku stavební suti	t	20,520	63,70	1 307,12 Kč
	vp	sut' - živice				10 232,96 Kč
1.15 - 38	vp	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	43,200	99,50	4 298,40 Kč
1.15 - 41	vp	Řezání stávajícího živického krytu tl. do 5 cm	m	55,000	73,00	4 015,00 Kč
1.15 - 43	vp	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	7,819	139,30	1 089,19 Kč
1.15 - 44	vp	Poplatek za recyklaci	t	7,819	106,20	830,38 Kč
	vp	Podkladní a vedlejší konstrukce				2 386,11 Kč
1.15 - 50	vp	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	4,995	477,70	2 386,11 Kč
	vp	bourání ve výkopu				22 893,10 Kč
N 1A-110-2	vp	Vytrhání stáv.bet.potrubi DN 400	m	26,500	790,47	20 947,46 Kč
1.15 - 46	vp	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	1,997	4,00	7,99 Kč
1.15 - 47	vp	Vodorovné přemístění suti skládku vč.uložení	m3	3,994	345,00	1 377,93 Kč
1.15 - 48	vp	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,787	63,70	559,73 Kč
	vp	Trubní vedení				123 143,61 Kč
3.53-27	vp	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	14,500	42,50	616,25 Kč
3.15 - 40	vp	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 300	m	41,000	47,80	1 959,80 Kč
3.53 - 30	vp	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 200	kus	3,000	272,00	816,00 Kč
3.53 - 30	vp	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 300	kus	11,000	272,00	2 992,00 Kč
3.53 - 31	vp	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300	kus	2,000	378,20	756,40 Kč
N1A-201	vp	Nápojení kan.připojky na stáv.potrubi ze SKL DN 1600	kus	1,000	8 900,00	8 900,00 Kč
1.15 - 65	vp	Kamerové zkoušky	m	55,500	69,00	3 829,50 Kč
1.15 - 79	vp	Zaplnění stáv.potrubi a šachet popilkocementovou suspenzí	m3	1,821	1 738,20	3 165,26 Kč
1.05 - 137	vp	Výšková úprava stáv.vpusti	kus	1,000		0,00 Kč
N 1A -16 -4	vp	Kanalizační potrubí PVC DN 200 SN 8	m	15,849	586,84	9 300,83 Kč
1.11.2 - 58	vp	Kanalizační potrubí PVC DN 300 SN 8	m	44,813	907,60	40 672,28 Kč
3.53 - 43	vp	Koleno kanalizační PVC DN 200/30°	kus	3,045	151,30	460,71 Kč
N 1A-6-9	vp	Koleno kanalizační PVC DN 300/15°	kus	4,060	3 167,10	12 858,43 Kč
N 1A-6-9	vp	Koleno kanalizační PVC DN 300/30°	kus	2,030	3 167,10	6 429,21 Kč
N 1A-6-9	vp	Koleno kanalizační PVC DN 300/45°	kus	2,030	3 167,10	6 429,21 Kč
N 1A-110-3	vp	Přesuvka kanalizační PVC DN 300 KGU	kus	2,030	467,00	948,01 Kč
N 1A-110-4	vp	Přechod kanalizační PVC DN 300/200	kus	1,015	563,00	571,45 Kč
1A-26 - 1	vp	Odbočka kanalizační PVC DN 300/200	kus	1,015	4 636,84	4 706,39 Kč
1A-26 - 1	vp	Odbočka kanalizační PVC DN 300/300	kus	1,015	4 636,84	4 706,39 Kč
N 1A-110-5	vp	Odbočka kanál.nalepovací Hobas 1600/300 KG - 90° (vč.dopravy)	kus	1,015	12 833,00	13 025,50 Kč
	vp	Komunikace				12 035,52 Kč
1.15 - 93	vp	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	43,200	119,40	5 158,08 Kč
1.15 - 95	vp	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	43,200	159,20	6 877,44 Kč
	vp	SO 1.15 STOKY B, OS-4, ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4 - Obnova kolizního místa stáv.kan.na daném místě				65 465,76 Kč
	vp	Zemní práce				12 759,90 Kč
1.15 - 10	vp	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	12,690	102,20	1 296,92 Kč
1.15 - 11	vp	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,810	942,10	763,10 Kč
1.15 - 16	vp	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	6,345	2,70	17,13 Kč
1.15 - 17	vp	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	0,405	4,00	1,62 Kč
1.15 - 21	vp	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	12,690	345,00	4 378,05 Kč
1.15 - 22	vp	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	0,810	345,00	279,45 Kč
1.15 - 23	vp	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,750	108,80	734,40 Kč
1.15 - 24	vp	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,750	106,20	716,85 Kč

1.15 - 27	vp	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146, vhodné vytríděné zeminy z výkopů a recyklátů dle TP146	T	12,150	159,20	1 934,28 Kč
1.15 - 28	vp	Štěrkopisec frakce 8-16	T	12,825	205,70	2 638,10 Kč
	vp	Přípravné a přidružené práce				1 893,14 Kč
1.15 - 33	vp	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm	m2	13,500	19,90	268,65 Kč
1.15 - 34	vp	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	13,500	23,90	322,65 Kč
1.15 - 36	vp	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	6,413	139,30	893,33 Kč
1.15 - 37	vp	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,413	63,70	408,51 Kč
	vp	sut - živice	m2	13,500	99,50	1 343,25 Kč
1.15 - 38	vp	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	m	30,900	73,00	2 255,70 Kč
1.15 - 41	vp	Rezáni stávajícího živiceho krytu tl. do 5 cm	t	2,444	139,30	340,45 Kč
1.15 - 43	vp	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	2,444	106,20	259,55 Kč
1.15 - 44	vp	Poplatek za recyklaci				7 254,90 Kč
	vp	Podkladní a vedlejší konstrukce	m2	1,350	477,70	644,90 Kč
1.15 - 50	vp	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m2	2,025	3 264,20	6 610,01 Kč
1.15 - 51	vp	Desky podkladní pod potrubí C12/15				1 566,23 Kč
	vp	bourání ve výkopu	m	15,000	89,12	1 336,80 Kč
1132011R	vp	Vytrhání stáv. potrubí DN 200	m2	0,236	4,00	0,94 Kč
1.15 - 46	vp	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	0,471	345,00	162,50 Kč
1.15 - 47	vp	Vodorovné přemístění suti skládku vč. uložení	t	1,036	63,70	65,99 Kč
1.15 - 48	vp	Poplatek za skládku stavební suti				34 031,53 Kč
	vp	Trubní vedení	m	15,000	42,50	637,50 Kč
3.53-27	vp	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	kus	1,000	240,85	240,85 Kč
N 1A-10-1	vp	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 200	kus	1,000	8 900,00	8 900,00 Kč
N1A-201	vp	Nápojení kan. přípojky na stáv. potrubí ze SKL DN 1600	m	15,000	69,00	1 035,00 Kč
1.15 - 65	vp	Kamerové zkoušky	m	16,395	586,84	9 621,24 Kč
N 1A - 16 - 4	vp	Kanalizační potrubí PVC DN 200 SN 8	kus	1,015	563,00	571,45 Kč
N 1A-110-4	vp	Přechod kanalizační PVC DN 300/200	kus	1,015	12 833,00	13 025,50 Kč
N 1A-110-5	vp	Odbočka kanai. nalepovací Hobas 1600/300 KG - 90° (vč. dopravy)				3 761,10 Kč
	vp	Komunikace	m2	13,500	119,40	1 611,90 Kč
1.15 - 93	vp	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	13,500	159,20	2 149,20 Kč
1.15 - 95	vp	Podklad ze štěrku dle tloušťky 20 cm				26 218,40 Kč
	vp	SO 1.15 STOKY B, OS-4, ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4 - Zaplštění kabelů za grádélou - st. 0,009-0.113				26 218,40 Kč
	vp	km				26 218,40 Kč
	vp	Zemní práce	m	104,000	252,10	26 218,40 Kč
1.15 - S	vp	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů				0,00 Kč
	R	Rezerva	kpl	0,000	922 124,12	0,00 Kč
	vp	Všeobecné položky				23 073,51 Kč
3	vp	Realizační dokumentace	kpl	0,922	19 134,66	17 644,45 Kč
11	vp	Dokumentace skutečného provedení	kpl	0,922	5 887,59	5 429,06 Kč
