

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		ZL č. 3-51	
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY			
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum:	3 6. 2014
Odesláno/			
předáno:			
Stavební objekt (provozní soubor):	SO 3.16 STOKY S6, S6-1, S6-1-1, S6-2, S6-2-1, S13, P13, VÝTLAKY T13		
Odkazy:	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny - RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny	
	na jinou část smlouvy:		

ZMĚNA – popis změny:

Popis změny:

SO 3.16 STOKY S6, S6-1, S6-1-1, S6-2, S6-2-1, S13, P13, VÝTLAKY T13 – na základě zjištěné pozice NN kabelů, který byl v mezidobí položen do plánované trasy stoky S6-2 od RŠ S6-2-3 do S6-2-6 je nezbytná změna trasy. Změnu trasy v rámci stávajících pozemků majitel neodsouhlasil, proto je nezbytné provést změnu trasy na nové pozemky.

Součástí oznámení změny je: 1) Zápis v DVMP
2) Stanovisko projektanta
3) Zákres změn v RDS
4) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny =
plus 47 696,18 Kč bez DPH

Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “

Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.

Vyjádření dotčených:

Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – - kanalizace a ČOV“ Podpředmět 664/78 186 00 Praha 8 Datum: 3.6.2014	Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí  divize Praha Dukelských hrdinů 12 170 00 Praha 7, ČR DIČ: CZ46964371 Datum: 3.6.2014
Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí : ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY d plus - projektová a inženýrská s.s. Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc Datum: 3.6.2014	Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 3.6.2014

DEMOK +/- STAVBY ÚSTU N/P - KANALIZACE A ŽEV

2.2)

125. ÚOS 8 SO 3.16 - STOKA SO-2

STR. 22

15.5.2011

ŽÁDOST OBJEDNATELE

NA ZÁKLADĚ ZWIŠTĚNÍ TORČO NA KABELU, KTERÝ BYL V MOHDOLÍ
POLOŽEN DO PLÁNOVANÉ TRASY STOKY SO-2 OD PŘEŠK 562-3 DO SO-2-6
JE NEBOHYNĚ ŽEJNA TRASY. ŽEJNU TRASY V RAHU STAVADICÍCH
POZEMKŮ MAJITEL NEODSOULKLASIL, PROTO JE NĚHĚ NEBOHYNĚ PROVEŠT
ŽEJNU TRASY NA NOVOE TORČO.

ŽHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ NĚHĚ REVIZI PPD A NĚHĚ ŽL.

ZA OBJEDNATELE

ZA SPS

ZA ŽHOTOVITEL

P. KNEP

P. ŠEVČEK

P. PAVLÍČ

126. ÚOS 1A SO 1.15 - STOKA OS4 - OBJEKT OS4 A SPOJNĚ
KAMOR

10.6.2011

ŽÁDOST ŽHOTOVITEL

PŘI ZAHADENÍ DEMOLICNÍCH PRACÍ STAVADICÍCH STOK B V UL. MORAVSKÉ
1LO ZWIŠTĚNÍ, ŽE STAVADICÍ STOKY JSOU OSADENY NA OCA 80 cm
BETONOVOU DESKOU A JSOU ČÁSTEČNĚ OBOHYNOVĚNÝ. SKUTEČNÝ STAV
NEKORRESPONDUJE S PODKLADY, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYLA VYHACOVĚNA
PPD. PRO REMONTU OS4 JE NEBOHYNĚ PROVEŠT ŽEJNU DO KOMUNIKACE 1/14 A TĚH DODATEČNĚ TORČO
RSD (PŘEŠK PŘEŠK, ORANA KOMUNIKACE).

ŽHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ NĚHĚ ŽHOTOVĚHO ÚSTU.

ZA OBJEDNATELE


ZA SPS

ZA ŽHOTOVITEL

P. KNEP

P. ŠEVČEK

P. PAVLÍČ

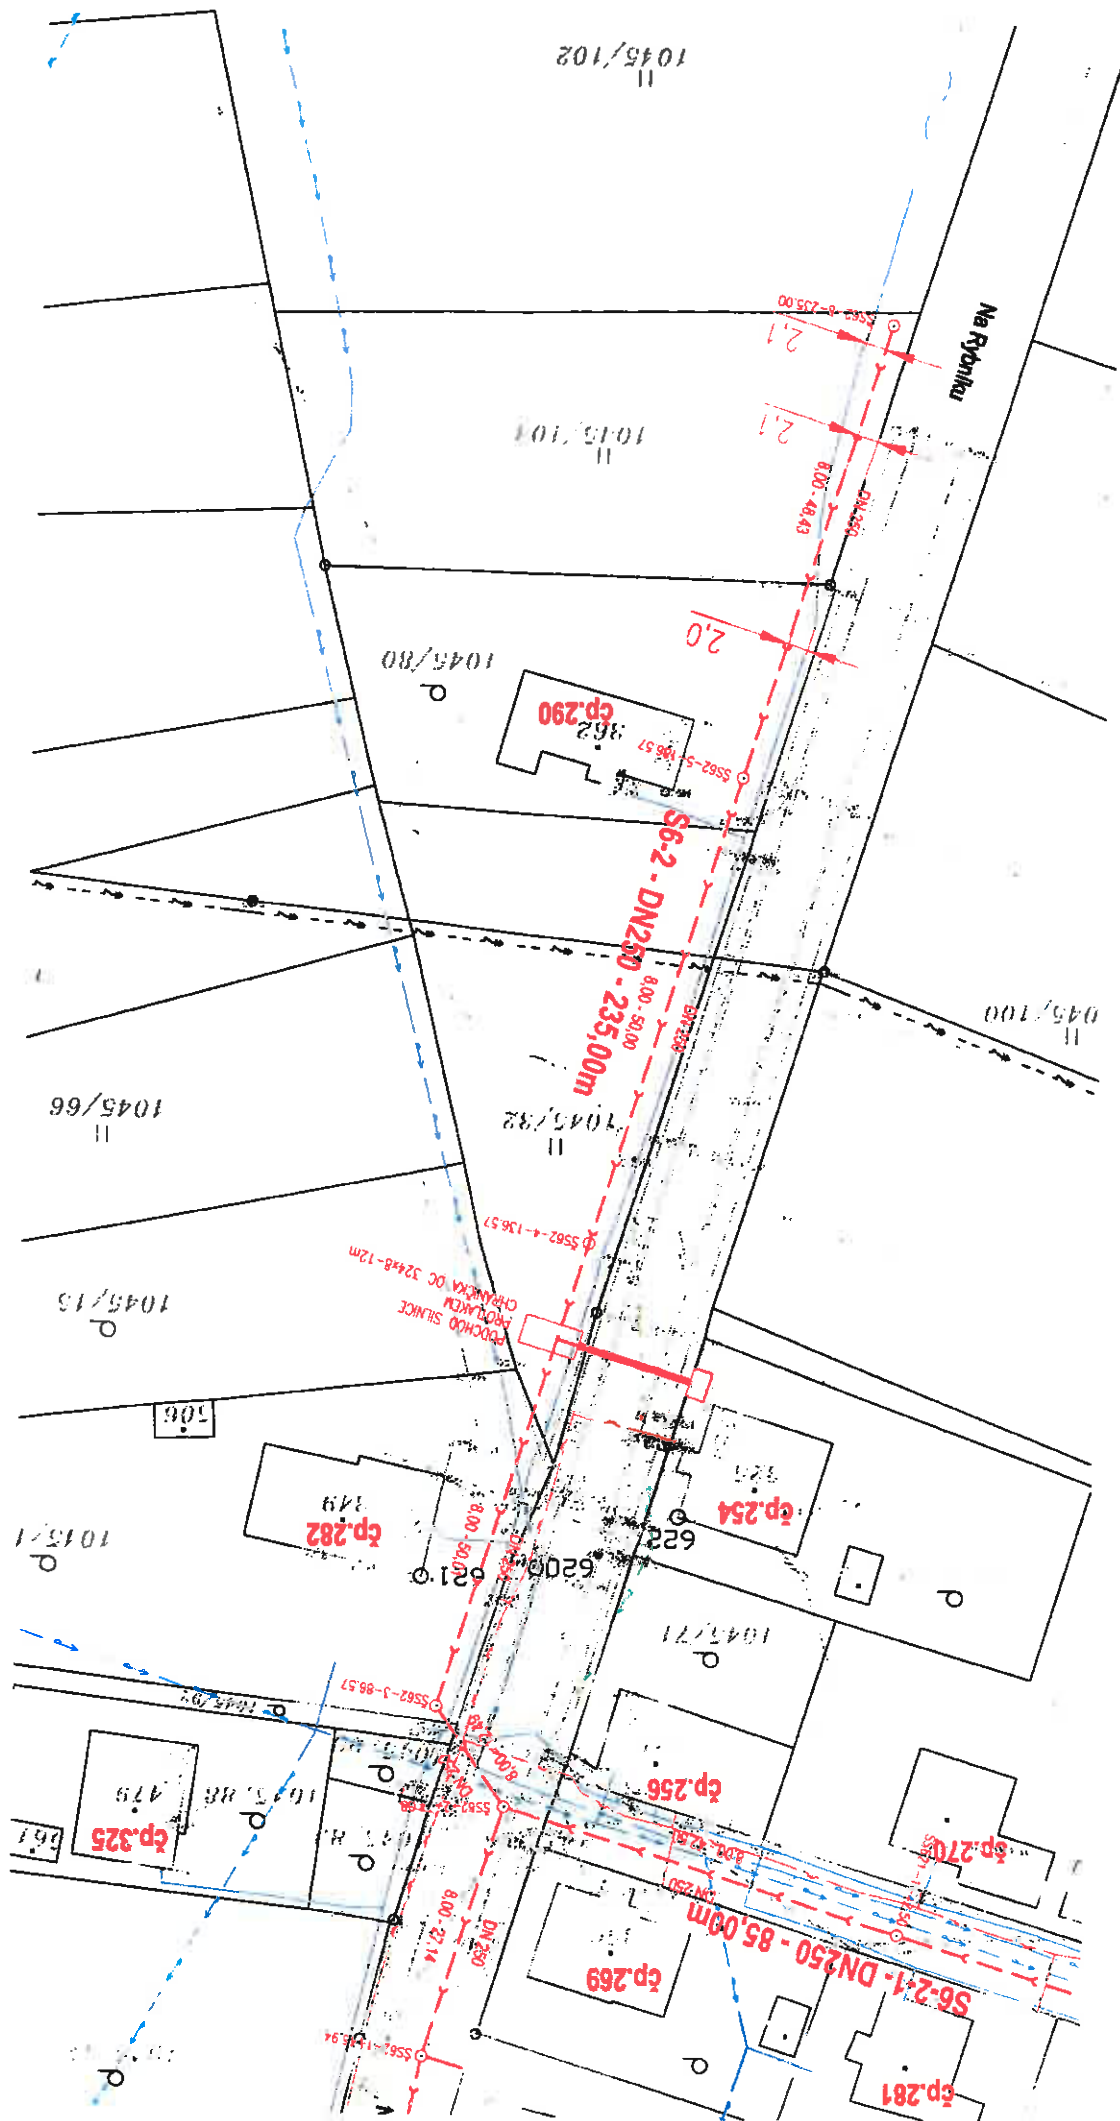





ČISTOPIS - 04.08.2012



Number of people	Eng. Control Method	Project	Phase
1	See 2000 Survey	1000	1000
2	See 2000 Survey	1000	1000
3	See 2000 Survey	1000	1000
4	See 2000 Survey	1000	1000
5	See 2000 Survey	1000	1000
6	See 2000 Survey	1000	1000
7	See 2000 Survey	1000	1000
8	See 2000 Survey	1000	1000
9	See 2000 Survey	1000	1000
10	See 2000 Survey	1000	1000
11	See 2000 Survey	1000	1000
12	See 2000 Survey	1000	1000
13	See 2000 Survey	1000	1000
14	See 2000 Survey	1000	1000
15	See 2000 Survey	1000	1000
16	See 2000 Survey	1000	1000
17	See 2000 Survey	1000	1000
18	See 2000 Survey	1000	1000
19	See 2000 Survey	1000	1000
20	See 2000 Survey	1000	1000
21	See 2000 Survey	1000	1000
22	See 2000 Survey	1000	1000
23	See 2000 Survey	1000	1000
24	See 2000 Survey	1000	1000
25	See 2000 Survey	1000	1000
26	See 2000 Survey	1000	1000
27	See 2000 Survey	1000	1000
28	See 2000 Survey	1000	1000
29	See 2000 Survey	1000	1000
30	See 2000 Survey	1000	1000
31	See 2000 Survey	1000	1000
32	See 2000 Survey	1000	1000
33	See 2000 Survey	1000	1000
34	See 2000 Survey	1000	1000
35	See 2000 Survey	1000	1000
36	See 2000 Survey	1000	1000
37	See 2000 Survey	1000	1000
38	See 2000 Survey	1000	1000
39	See 2000 Survey	1000	1000
40	See 2000 Survey	1000	1000
41	See 2000 Survey	1000	1000
42	See 2000 Survey	1000	1000
43	See 2000 Survey	1000	1000
44	See 2000 Survey	1000	1000
45	See 2000 Survey	1000	1000
46	See 2000 Survey	1000	1000
47	See 2000 Survey	1000	1000
48	See 2000 Survey	1000	1000
49	See 2000 Survey	1000	1000
50	See 2000 Survey	1000	1000
51	See 2000 Survey	1000	1000
52	See 2000 Survey	1000	1000
53	See 2000 Survey	1000	1000
54	See 2000 Survey	1000	1000
55	See 2000 Survey	1000	1000
56	See 2000 Survey	1000	1000
57	See 2000 Survey	1000	1000
58	See 2000 Survey	1000	1000
59	See 2000 Survey	1000	1000
60	See 2000 Survey	1000	1000
61	See 2000 Survey	1000	1000
62	See 2000 Survey	1000	1000
63	See 2000 Survey	1000	1000
64	See 2000 Survey	1000	1000
65	See 2000 Survey	1000	1000
66	See 2000 Survey	1000	1000
67	See 2000 Survey	1000	1000
68	See 2000 Survey	1000	1000
69	See 2000 Survey	1000	1000
70	See 2000 Survey	1000	1000
71	See 2000 Survey	1000	1000
72	See 2000 Survey	1000	1000
73	See 2000 Survey	1000	1000
74	See 2000 Survey	1000	1000
75	See 2000 Survey	1000	1000
76	See 2000 Survey	1000	1000
77	See 2000 Survey	1000	1000
78	See 2000 Survey	1000	1000
79	See 2000 Survey	1000	1000
80	See 2000 Survey	1000	1000
81	See 2000 Survey	1000	1000
82	See 2000 Survey	1000	1000
83	See 2000 Survey	1000	1000
84	See 2000 Survey	1000	1000
85	See 2000 Survey	1000	1000

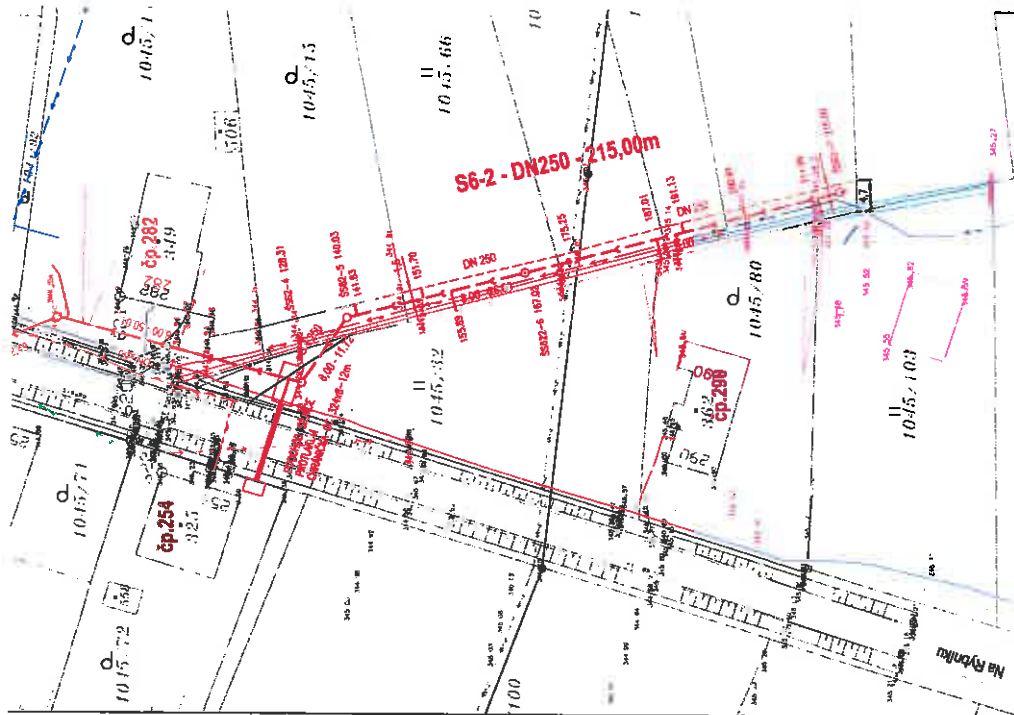

KLAD LISTŮ

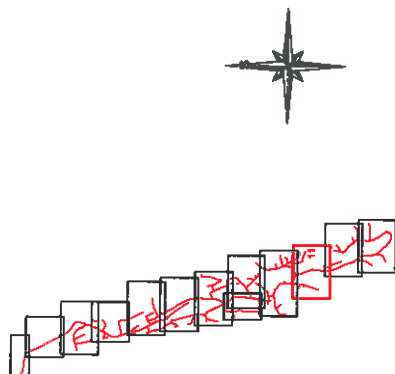

LEGENDA:

- PROJEKTOVANÉ
- SPRÁŠOVÁ KANALIZACE
- DN 250
- SKLON ‰ - DÉLKA m
- VÝTLAČE ŘEČY SPRÁŠOV
- PŘÍPOJKA NN PRO ČS
- PŘELOŽKA STAVAJÍCÍHO VODOVODU
- PŘELOŽKA STAVAJÍCÍ KANALIZACE
- STAVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDEN
- VODOVOD
- VTL PLYNOVOD
- STL PLYNOVOD
- KANALIZACE
- KABEL V.O.
- NADEZEMNÍ VEDEN NN
- NADEZEMNÍ VEDEN VN
- PODEZEMNÍ VEDEN NN
- KABEL TELEFON, KABELOVÁ TELEVIZE
- KABEL RADIOKOMUNIKACE

ČISTOPIS - 04.08.2012

Začíná	DT 07	Začíná	WISY STOK 08-2	Ing. Jindřich Šedivý
Konečí	DT 07	Konečí	WISY STOK 08-2	Ing. Jindřich Šedivý
AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská firma Opatovická 12, 170 00 Praha 7 IČ: 259 08 326, IČ: 259 713 940 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz				
Redaktor	Ing. Daniel Kocourek	Projekt	WISY STOK 08-2	Ing. Jindřich Šedivý
Stavovatel	Ing. Štěpán Běhoun	Stavovatel	WISY STOK 08-2	Ing. Jindřich Šedivý
Zodpovědný projektant	Ing. František Převrlec	Zodpovědný projektant	WISY STOK 08-2	Ing. Jindřich Šedivý
Upravitel	Ing. Josef Kopecký	Upravitel	WISY STOK 08-2	Ing. Jindřich Šedivý
Revizor	Ing. Radovan Leláček	Revizor	WISY STOK 08-2	Ing. Jindřich Šedivý
Stavovatel	Ing. Jindřich Šedivý	Stavovatel	WISY STOK 08-2	Ing. Jindřich Šedivý
Objednatel	Stavovatel	Objednatel	WISY STOK 08-2	Ing. Jindřich Šedivý
Projekt	WISY STOK 08-2	Projekt	WISY STOK 08-2	Ing. Jindřich Šedivý
ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV část 3 DLOUHÁ TRÉBOVÁ - KANALIZACE				
Číslo	3-DLOUHÁ TRÉBOVÁ - KANALIZACE	Číslo	3-DLOUHÁ TRÉBOVÁ - KANALIZACE	Ing. Jindřich Šedivý
Stav	SITUACE	Stav	SITUACE	Ing. Jindřich Šedivý
Průřez	PODROBNÁ SITUACE Č.11 - VÝŘEZ	Průřez	PODROBNÁ SITUACE Č.11 - VÝŘEZ	Ing. Jindřich Šedivý
Číslo přílohy	3-S-17	Číslo přílohy	3-S-17	Ing. Jindřich Šedivý
Stránka	0	Stránka	0	Ing. Jindřich Šedivý

[illegible]



ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV

2007 年 12 月 10 日

PODĚLNÉ PROFILY STOK 05-1, 06-1-1, 11-2

Pol.	Popis položky	m.j.	Rozdíl RE 07 - RDS		Celková cena Kč
Změnový list ZL č. 3-51					
SO 3.16 STOKY S6, S6-1, S6-1-1, S6-2, S6-2-1, S13, P13, VÝTLAKY T13					
	SO 3.16.1 Stoky				
	HSV				
	Zemní práce				
1	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	kpl	-0,013	78 552,50	-1 049,94
2	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m			0,00
3	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m			0,00
4	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3			0,00
	$(5+26,9+47,98)*1,2*(2,06+1,85)/2=$	m3	187,398	39,80	7 458,44
5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	-70,150	108,80	-7 632,32
	4085,06-(61,69+9,38)x0,95-2,77x0,95				0,00
6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	-3,692	1 227,40	-4 531,56
	187,817-(61,69+9,38)x0,05-2,77x0,05				0,00
7	Protlačení trub oc.chránička DN 400	m			0,00
8	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2			0,00
9	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2	-84,000	33,20	-2 788,80
	5474,6-(20x2,1x2)				0,00
10	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložené - hl. do 8m	m2			0,00
11	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2			0,00
12	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	-84,000	9,30	-781,20
	5474,6-(20x2,1x2)				0,00
13	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 8 m	m2			0,00
14	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-35,075	2,70	-94,70
	1882,607-(61,69+9,38+2,77)x0,95x0,5				0,00
15	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3			0,00
16	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-1,846	2,70	-4,98
	47,277-(61,69+9,38+2,77)x0,05x0,5				0,00
17	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3			0,00
18	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-2,400	33,20	-79,68
	29,964-(20x1,2x0,10)				0,00
19	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	-56,120	79,60	-4 467,15
	3289,739-(61,69+9,38+2,77)x0,95x0,80				0,00
20	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m vč poplatku za skládku	m3	-14,030	345,00	-4 840,35
	779,609-(61,69+9,38+2,77)x0,95x0,20				0,00
21	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m vč poplatku za skládku	m3	-3,692	345,00	-1 273,74
	196,567-(61,69+9,38+2,77)x0,05				0,00
22	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-14,030	0,00	0,00
	779,609-(61,69+9,38+2,77)x0,95x0,20				0,00
23	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-3,692	0,00	0,00
	196,567-(61,69+9,38+2,77)x0,05				0,00
24	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-59,642	108,80	-6 489,05
	3018,357-(61,69+9,38+2,77)*(20x0,71)				0,00
25	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2			0,00
26	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-13,200	106,20	-1 401,84
	795,486-(20x1,2x0,55)				0,00
27	Sejmutí omíčky s přemístěním do 50 m	m3	-2,400	59,70	-143,28
	29,964-(20x1,2x0,10)				0,00
28	Rozprostření omíčky, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	-24,000	23,90	-573,60
	289,84-(20x1,2)				0,00
29	Štěrkodrt, kamenivo 0-63	t			0,00
30	Štěrkopisek frakce 8-16	t	-24,486	205,70	-5 036,77
	1473,627-(20x1,2x0,55)-(3,14x(0,280x0,280)/4x20))x1,855				0,00
31	Trubka podélně svař. DN 406,4x5mm dle DIN2458	m			0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce				0,00
40	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 83 mm	m3	-3,113	477,70	-1 487,08
	260,108-(20x1,2x0,15)+(1,3x2,5x0,15x1)				0,00
41	Desky podkladní pod šachty C12/15 tl.10cm	m3	0,227	3 264,20	740,97

Pol.	Popis položky	m.j.	Rozdíly RE 07 - RDS		Celková cena Kč
	9,301+(3,14x(1,7) ² /4x0,10)x1				0,00
42	Žleb kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a m				0,00
43	Trativody z PVC drenážních trubek, lože a obsyp šterkopískem, trubky d 110 mm		-20,000	79,60	-1 592,00
	1195-20				0,00
44	Výústní objekt - VO 13	kpl			0,00
	Trubní vedení				0,00
45	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 400	m			0,00
46	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m			0,00
47	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	-20,000	47,80	-956,00
	1369-20				0,00
48	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m			0,00
49	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	-20,000	45,10	-902,00
	1369-20				0,00
50	Šachta z betonových dílců pro DN 200 výška vstupu 1,6 m	kus			0,00
51	Šachta z betonových dílců pro DN 200 výška vstupu 2,1 m	kus	1,000	20 042,80	20 042,80
	10+1				0,00
	Rozebrání šachet z dílců - šachta ŠS62-4	kus	1,000	3 769,00	3 769,00
	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty (pouze osazení bez materiálu) - šachta ŠS62-4	kus	1,000	9 180,00	9 180,00
	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty (pouze dno) - šachta ŠS62-4	kus	1,000	3 292,00	3 292,00
	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty (pouze materiál) - šachta ŠS62-5	kus	1,000	8 492,85	8 492,85
52	Šachta z betonových dílců pro DN 200 výška vstupu 3,0 m	kus			0,00
53	Šachta z betonových dílců pro DN 200 výška vstupu 4,0 m	kus			0,00
54	Šachta z betonových dílců pro DN 200 výška vstupu 5,0 m	kus			0,00
55	Spadiště kanalizační pro DN 250 výška vstupu 5,06 m, výška spadiště 3,1 m	kus			0,00
56	Kamernové zkoušky	m	-20,000	69,00	-1 380,00
	1374-20				0,00
57	Roura PP kanalizační ULTRA-RIB2 DN250x6000 mm SN10	m	-21,860	700,60	-15 315,12
	1496,317-(20x1,093)				0,00
58	Roura PVC kanalizační DN150x3000 mm, SN8	m			0,00
	Díl celkem :				0,00
					0,00
	SO 3.16.3 Odbočky pro domovní přípojky a uliční vpusti				0,00
	HSV				0,00
	Zemní práce				0,00
1	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	kpl	0,081	13 136,30	1 065,11
2	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m			0,00
3	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m			0,00
4	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3			0,00
5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	46,814	108,80	5 093,36
	212,94+(25-15x1,2x0,10)x0,95x1,1				0,00
6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	2,400	1 227,40	2 945,76
	11,207+(25-15x1,2x0,10)x0,05x1,1				0,00
7	Protlačení trub oc.chránička DN 300	m			0,00
8	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	82,500	26,50	2 186,25
	393,228+(15x2,75x2)				0,00
9	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2			0,00
10	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	82,500	6,60	544,50
	393,228+(15x2,75x2)				0,00
11	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2			0,00
12	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	12,122	2,70	32,73
	106,476+(25-15x1,2x0,10)x0,95x0,5x1,1				0,00
13	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,638	2,70	1,72
	5,068+(25-15x1,2x0,10)x0,05x0,5x1,1				0,00
14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,980	33,20	65,74
	9,438+(15x1,2x0,10)x1,1				0,00
15	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	19,395	79,60	1 543,84
	162,874+(25-15x1,2x0,10)x0,95x0,80x1,1				0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Rozdíly RE 07 - RDS		Celková cena Kč
16	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m vč poplatku za skládku	m3	4,849	345,00	1 672,91
	43,654+(25-15x1,2x0,10)x0,95x0,20x1,1				0,00
17	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 10000 m vč poplatku za skládku	m3	1,276	345,00	440,22
	9,431+(25-15x1,2x0,10)x0,05x1,1				0,00
18	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	4,846	0,00	0,00
	43,654+(25-15x1,2x0,10)x0,95x0,20x1,1				0,00
19	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	1,278	0,00	0,00
	9,431+(25-15x1,2x0,10)x0,05x1,1				0,00
20	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	27,500	108,80	2 892,00
	119,735+(25x1,1)				0,00
21	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,910	106,20	946,24
	73,244+(15x1,2x0,45x1,1)				0,00
22	Sejmutí omice s přemístěním do 50 m	m3	1,980	59,70	118,21
	10,824+(15x1,2x0,10x1,1)				0,00
23	Rozproštění omice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	19,800	23,80	473,22
	108,24+(15x1,2x1,1)				0,00
24	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	19,800	8,00	158,40
	113,52+(15x1,2x1,1)				0,00
25	Štěrkodrt, kamenivo 0-63	t			0,00
26	Štěrkopísek frakce 8-16	t	15,914	205,70	3 273,51
	149,453+(15x1,2x0,45)-(3,14x(0,160x0,160)/4x15))x1,855x1,1				0,00
27	Trubka podélně svař. DN 324x8mm dle DIN2458	m			0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce				0,00
36	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,970	477,70	1 418,77
	25,542+(15x1,2x0,15x1,1)				0,00
37	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a m				0,00
38	Trativody z PVC drenážních trubek, lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 110 mm	m	16,500	79,60	1 313,40
	168,3+(15x1,1)				0,00
	Trubní vedení				0,00
39	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 300	m			0,00
40	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	15,000	371,50	5 572,50
	170+15				0,00
41	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	13,200	146,00	1 927,20
	81,4+(12x1,1)				0,00
42	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300	kus	6,600	378,20	2 498,12
	41+(6x1,1)				0,00
43	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	15,000	39,80	597,00
	170+15				0,00
44	Roura PVC kanalizační DN150x3000 mm, SN8	m	18,035	339,70	6 126,49
	185,81+(15x1,093x1,1)				0,00
45	Koleno kanalizační PVC, DN150/30°	kus	6,700	67,70	453,59
	42+(6x1,015x1,1)				0,00
46	Koleno kanalizační PVC, DN150/45°	kus	6,700	71,70	480,39
	42+(6x1,015x1,1)				0,00
47	Odbočka kanalizační PP - UREA/KG DN250/150	kus	6,700	606,40	4 062,88
	42+(6x1,015x1,1)				0,00
	Díl celkem :				0,00
					0,00
R	Rezerva pro nepředvídatelné práce	kpl	0,250	38 156,94	9 539,24
	SO 3.16 CELKEM :				47 696,18

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list			č. ZL č.3-51
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY			
Komu: TEPVOS, spol. s r.o.		Datum:	
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 3.16 STOKY S6, S6-1, S6-1-1, S6-2, S6-2-1, S13, P13, VÝTLAKY T13	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:			
Důvod změny: Rozdíl mezi ZDS a RDS			
Popis změny:			
SO 3.16 STOKY S6, S6-1, S6-1-1, S6-2, S6-2-1, S13, P13, VÝTLAKY T13 – na základě zjištěné pozice NN kabelů, který byl v mezidobí položen do plánované trasy stoky S6-2 od RŠ S6-2-3 do S6-2-6 je nezbytná změna trasy. Změnu trasy v rámci stávajících pozemků majitel neodsouhlasil, proto je nezbytné provést změnu trasy na nové pozemky			
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny: Vícepráce 101 932,96 Kč Méněpráce -62 821,17Kč Celkem 39 111,75 Kč			
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
<i>Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.</i>			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí 14. 11. 2014 „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ Datum: Pobřežní 667/73 186 00 Praha 9		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí 14. 11. 2014 AQUA PROCON Datum:	
Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí 14. 11. 2014 SPRÁVCE STAVBY d plus - projektová a inženýrská s.s. Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc Datum:		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí 14. 11. 2014 Datum:	

Rekapitulace				
--------------	--	--	--	--

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 3.16 STOKY S6, S6-1, S6-1-1, S6-2, S6-2-1, S13, P13, VÝTLAKY T13	Revize RDS DT02	-62 821,17 Kč	101 932,96 Kč	39 111,79 Kč
CELKEM		-62 821,17 Kč	101 932,96 Kč	39 111,79 Kč

Poř.	Popis položky	m.j.	Rozdíl RE 07 - RDS	Jednotková cena	Celková cena Kč
Změnový list ZL č. 3-51					
SO 3.16 STOKY S6, S6-1, S6-1-1, S6-2, S6-2-1, S13, P13, VÝTLAKY T13					
	SO 3.16.1 Stoky				
	HSV				
	Zemní práce				
1	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	kpl	-0,013	78 552,50	-1 049,94
2	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m			0,00
3	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m			0,00
4	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3			0,00
	$(5+26,9+47,98)*1,2*(2,06+1,85)/2=$	m3	187,398	39,80	7 458,44
5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	-70,150	108,80	-7 632,32
	$4085,06-(61,69+9,38)*0,95-2,77*0,95$				0,00
6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	-3,692	1 227,40	-4 531,56
	$197,817-(61,69+9,38)*0,05-2,77*0,05$				0,00
7	Protlačení trub oc.chránička DN 400	m			0,00
8	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2			0,00
9	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	-84,000	33,20	-2 788,80
	$5474,6-(20*2,1*2)$				0,00
10	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 8m	m2			0,00
11	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2			0,00
12	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-84,000	9,30	-781,20
	$5474,6-(20*2,1*2)$				0,00
13	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 8 m	m2			0,00
14	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-35,075	2,70	-94,70
	$1882,607-(61,69+9,38+2,77)*0,95*0,5$				0,00
15	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3			0,00
16	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-1,846	2,70	-4,98
	$47,277-(61,69+9,38+2,77)*0,05*0,5$				0,00
17	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3			0,00
18	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-2,400	33,20	-79,68
	$29,964-(20*1,2*0,10)$				0,00
19	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	-56,120	79,60	-4 467,15
	$3289,739-(61,69+9,38+2,77)*0,95*0,80$				0,00
20	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m vč poplatku za skládku	m3	-14,030	345,00	-4 840,35
	$779,609-(61,69+9,38+2,77)*0,95*0,20$				0,00
21	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m vč poplatku za skládku	m3	-3,692	345,00	-1 273,74
	$196,567-(61,69+9,38+2,77)*0,05$				0,00
22	Poplatek za skládku hominy 1-4	m3	-14,030	0,00	0,00
	$779,609-(61,69+9,38+2,77)*0,95*0,20$				0,00
23	Poplatek za skládku hominy 5-7	m3	-3,692	0,00	0,00
	$196,567-(61,69+9,38+2,77)*0,05$				0,00
24	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-59,642	108,80	-6 489,05
	$3018,357-(61,69+9,38+2,77)*(20*0,71)$				0,00
25	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2			0,00
26	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-13,200	106,20	-1 401,84
	$795,486-(20*1,2*0,55)$				0,00
27	Sejmutí omice s přemístěním do 50 m	m3	-2,400	59,70	-143,28
	$29,964-(20*1,2*0,10)$				0,00
28	Rozprostření omice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	-24,000	23,90	-573,60
	$299,64-(20*1,2)$				0,00
29	Štěrkodrt, kamenivo 0-63	t			0,00
30	Štěrkopísek frakce 8-16	t	-24,486	205,70	-5 036,77
	$1473,627-(20*1,2*0,55)-(3,14*(0,280*0,280)/4*20)*1,855$				0,00
31	Trubka podélně svař. DN 406,4x5mm dle DIN2458	m			0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce				0,00
40	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 83 mm	m3	-3,113	477,70	-1 487,08
	$260,108-(20*1,2*0,15)*(1,3*2,5*0,15*1)$				0,00
41	Desky podkladní pod šachty C12/15 tl.10cm	m3	0,227	3 264,20	740,97

Pol.	Popis položky	m.j.	Rozdíly RE 07 - RDS	Jednotková cena	Celková cena Kč
	9,301*(3,14*(1,7) ² /4*0,10)*1				0,00
42	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a m	m			0,00
43	Trativody z PVC drenážních trubek, lože a obsyp štěrkokem, trubky d 11195-20	m	-20,000	79,60	-1 592,00
					0,00
44	Výústní objekty - VO 13	kpl			0,00
	Trubní vedení				0,00
45	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 400	m			0,00
46	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m			0,00
47	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	-20,000	47,80	-956,00
	1369-20				0,00
48	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m			0,00
49	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	-20,000	45,10	-902,00
	1369-20				0,00
50	Šachta z betonových dílců pro DN 200 výška vstupu 1,6 m	kus			0,00
51	Šachta z betonových dílců pro DN 200 výška vstupu 2,1 m	kus	1,000	20 042,80	20 042,80
	10+1				0,00
	Rozebrání šachet z dílců - šachta ŠS62-4	kus	1,000	3 769,00	3 769,00
	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty (pouze osazení bez materiálu) - šachta ŠS62-4	kus	1,000	9 180,00	9 180,00
	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty (pouze dno) - šachta ŠS62-4	kus	1,000	3 292,00	3 292,00
	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty (pouze materiál) - šachta ŠS62-5	kus	1,000	8 492,85	8 492,85
52	Šachta z betonových dílců pro DN 200 výška vstupu 3,0 m	kus			0,00
53	Šachta z betonových dílců pro DN 200 výška vstupu 4,0 m	kus			0,00
54	Šachta z betonových dílců pro DN 200 výška vstupu 5,0 m	kus			0,00
55	Spadiště kanalizační pro DN 250 výška vstupu 5,06 m, výška spadiště 3,1	kus			0,00
56	Kamerové zkoušky	m	-20,000	69,00	-1 380,00
	1374-20				0,00
57	Roura PP kanalizační ULTRA-RIB2 DN250x6000 mm SN10	m	-21,860	700,60	-15 315,12
	1496,317-(20x1,093)				0,00
58	Roura PVC kanalizační DN150x3000 mm, SN8	m			0,00
	Díl celkem :				0,00
					0,00
	SO 3.16.3 Odbočky pro domovní přípojky a uliční vpusti				0,00
	HSV				0,00
	Zemní práce				0,00
1	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	kpl	0,081	13 136,30	1 065,11
2	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m			0,00
3	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m			0,00
4	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3			0,00
5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	46,814	108,80	5 093,36
	212,94*(25-15x1,2x0,10)x0,95x1,1				0,00
6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	2,400	1 227,40	2 945,76
	11,207*(25-15x1,2x0,10)x0,05x1,1				0,00
7	Protlačení trub oc.chránička DN 300	m			0,00
8	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	82,500	26,50	2 186,25
	393,228*(15x2,75x2)				0,00
9	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2			0,00
10	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	82,500	6,60	544,50
	393,228*(15x2,75x2)				0,00
11	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2			0,00
12	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	12,122	2,70	32,73
	106,476*(25-15x1,2x0,10)x0,95x0,5x1,1				0,00
13	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,638	2,70	1,72
	5,068*(25-15x1,2x0,10)x0,05x0,5x1,1				0,00
14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,980	33,20	65,74
	9,438*(15x1,2x0,10)x1,1				0,00
15	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	19,395	79,80	1 543,84
	162,874*(25-15x1,2x0,10)x0,95x0,80x1,1				0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Rozdíly RE 07 - RDS	Jednotková cena	Celková cena Kč
16	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m vč poplatku za skládku	m3	4,849	345,00	1 672,91
	43,654+(25-15x1,2x0,10)x0,95x0,20x1,1				0,00
17	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m vč poplatku za skládku	m3	1,276	345,00	440,22
	9,431+(25-15x1,2x0,10)x0,05x1,1				0,00
18	Poplatek za skládku hominy 1 - 4	m3	4,846	0,00	0,00
	43,654+(25-15x1,2x0,10)x0,95x0,20x1,1				0,00
19	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	1,279	0,00	0,00
	9,431+(25-15x1,2x0,10)x0,05x1,1				0,00
20	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	27,500	108,80	2 992,00
	119,735+(25x1,1)				0,00
21	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,910	106,20	946,24
	73,244+(15x1,2x0,45x1,1)				0,00
22	Sejmutí omítky s přemístěním do 50 m	m3	1,980	59,70	118,21
	10,824+(15x1,2x0,10x1,1)				0,00
23	Rozprostření omítky, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	19,800	23,90	473,22
	108,24+(15x1,2x1,1)				0,00
24	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	19,800	8,00	158,40
	113,52+(15x1,2x1,1)				0,00
25	Štěrkodrt, kamenivo 0-63	t			0,00
26	Štěrkopisek frakce 8-16	t	15,914	205,70	3 273,51
	149,453+(15x1,2x0,45)-(3,14x(0,160x0,160)/4x15))x1,855x1,1				0,00
27	Trubka podélně svař. DN 324x8mm dle DIN2458	m			0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce				0,00
36	Lože pod potrubí ze štěrkopisků do 63 mm	m3	2,970	477,70	1 418,77
	25,542+(15x1,2x0,15x1,1)				0,00
37	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a	m			0,00
38	Traťovody z PVC drenážních trubek, lože a obsyp štěrkopiskem, trubky dle	m	16,500	79,60	1 313,40
	168,3+(15x1,1)				0,00
	Trubní vedení				0,00
39	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 300	m			0,00
40	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG (uhost třídy SN8 DN150	m	15,000	371,50	5 572,50
	170+15				0,00
41	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	13,200	146,00	1 927,20
	81,4+(12x1,1)				0,00
42	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300	kus	6,600	378,20	2 496,12
	41+(6x1,1)				0,00
43	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	15,000	39,80	597,00
	170+15				0,00
44	Roura PVC kanalizační DN150x3000 mm, SN8	m	18,035	339,70	6 126,49
	185,81+(15x1,093x1,1)				0,00
45	Koleno kanalizační PVC, DN150/30°	kus	6,700	67,70	453,59
	42+(6x1,015x1,1)				0,00
46	Koleno kanalizační PVC, DN150/45°	kus	6,700	71,70	480,39
	42+(6x1,015x1,1)				0,00
47	Odbočka kanalizační PP - UREA/KG DN250/150	kus	6,700	606,40	4 062,88
	42+(6x1,015x1,1)				0,00
	Díl celkem :				0,00
					0,00
	Všeobecné položky				0,00
3	Realizační dokumentace	p.s.	0,038	19 134,66	730,18
11	Dokumentace skutečného provedení	p.s.	0,038	5 887,59	224,67
	Všeobecné položky celkem				
R	Rezerva pro nepředvídatelné práce	kpl	0,000	38 156,94	0,00
	SO 3.16 CELKEM :				39 111,78
