

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		ZL č.1A-88	
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY			
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum: 18.11. 2013	
Odesláno/			
	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):	1.04 – STOKY BF		
Odkazy:	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny - RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		

ZMĚNA – popis změny:

Popis změny: Stoky BF – při zahájení prací na ČS 12 bylo zjištěno, že stávající stoka je funkční, odvádí odpadní vody ze sídliště. Vzhledem k době výstavby a množství odváděných splaškových vod není možné provádět přečerpávání. Z tohoto důvodu bude nutno provést provizorní obtok z potrubí PVC SN4 DN500 v délce 40m. Po skončení stav. prací bude potrubí zlikvidováno a odvezeno na skládku.

Součástí oznámení změny je: 1) Zápis v DVMP
2) Stanovisko projektanta
3) Zákres změn v RDS
4) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny =
plus 283 399,75 Kč bez DPH

Oznámení vydává: Sdružení „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“

Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.

Vyjádření dotčených:

Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – - Kanalizace a ČOV“ Datum: 18.11.2013 Pobřežní 667/78 186 00 Praha 8	Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí AQUA PROCON s.r.o. divize Praha Dukelských hrdinů 12 170 00 Praha 7, ČR DIČ: CZ46964371 Datum: 18.11.2013
Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY d plus - projektová a inženýrská s.s. Jeremenkova 28, 785 00 Olomouc Datum: 18.11.2013	Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí TEPVOS, spol. s r.o. Trávníčská 2a 582 01 Třebíč Datum: 18.11.2013

UČS 3 SO 3.17 STOKA S7-1 SŠ 71-14-SŠ 71-15 8.11.2013
SO 3.18 STOKA S8 SŠ 8-1 - SŠ 8-2

NA ŽÁDOST ŽAKOTOUVITELÉ

NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÉ SMĚTEČNÉ GEOLOGIE PODLOŽÍ
V MÍSTĚ PŘECHODU STÁTNÍ KOMUNIKACE I/14 JE
NUTNÉ ZMĚNIT TECHNOLOGII PROVÁDĚNÍ PŘECHODU
KOMUNIKACE S PROŘAZENÍM NA PODURT NEBO
PŘEKOP. OSTATNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY BUDOU
ZACHOVÁNY. JEDNÁ SE O ÚSEK STOKY

ŽAKOTOUVITEL PŘEDLOŽIL NÁVRH ŽL A REVIZI EPD.

ZA OBJEDNATELE

ZA SPŠ

ZA ŽAKOTOUVITELÉ

P. KNEŠP

P. ŠENOTL

P. RAULÍČEK

98. UČS 1A - ŘEŠENÍ NEPROVEDITELNOSTI STOKY N7 8.11.2013
NÁVAZNOST NA BOD č. 36 ZE DNE 22.11.2012.

TENTO BOD PROVÁDÍ SUMARIZACI DOPADU NEPROVEDITELNOSTI
STOKY N7. NÁHRAZITELNĚ ČÁSTI JSOU:

1) PROVEDENÍ NOVE ČS 12 VČ. PŘÍPOJKY ADO S Č.P. 1107
MR. WOLKEROVA A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE UČS.

2) PROVEDENÍ VÝTRZKY NV 12 PE 160x14,6 L=25,31

STOKY BF-2 DN 600 SEL L=31,20m

STOKY BF-3 DN 1000 SEL L=28,50m

NÁVAZNOSTI SPOJE KOTORY. SKP

3) PŘECOŽKA VODOVODU L=56m DN 150 TCT

4) ZPŮSOB VYBUDOVÁNÍ KANALIZACE STOKY N7

5) PROVIZORNÍ OBTOČ ČS 12 PO DOBU REALIZACE L=406m
DN 800

6) SANACE DEFORMOVANÉHO SVAHU VČ. OPRAVY AČTÁNEK.

→



**„Sdružení pro Ústí nad Orlicí-kanalizace a ČOV“
Pan Bronislav Hána
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8**

Datum: 15.11.2013
Vyřizuje: Ing. Sana Bahor, 737 206 974

**Věc : Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV
1A – Ústí nad Orlicí - kanalizace
Stanovisko projektanta k ZL1A-88
SO 1.04 – obtok ČS12**

Vážený pane,

na základě Vašeho požadavku Vám sdělujeme stanovisko projektanta k obtoku ČS12.


Při zahájení stavebních prací na čerpací stanici ČS12, která je umístěna v trase stávající stoky bylo zjištěno, že stávající stoka je funkční jednotná kanalizační stoka odvádějící odpadní vody ze sídliště. Vzhledem k dlouhé době výstavby ČS12 a množství odpadních vod natékajících stávající stokou není možné provést čerpání.

Z tohoto důvodu bude nutno provedení provizorního obtoku. Obtok bude proveden z potrubí PVC DN500, SN4 v délce 40m. Po skončení funkce obtoku bude provedeno odstranění obtokového potrubí s odvozem potrubí na skládku.

Zpracovatel ZDS ani RDS nemohl předpokládat množství odpadních vod natékajících stávající stokou odlišně od poskytnutých podkladů.

Z výše uvedených důvodů s výše uvedenou změnou souhlasíme.

S pozdravem



Ing. Daniel Kozický

Sídlo **Brno**

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 426 011
fax: +420 541 426 012
e-mail: info@aquaprocon.cz

Divize **Praha**


AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha
Tel.: +420 220 879 819
fax: +420 226 712 140
e-mail: info.praha@aquaprocon.cz

IČ: 46964371

DIČ: CZ46964371

Brno-venkov č. ú.: 24301 631/0100

Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

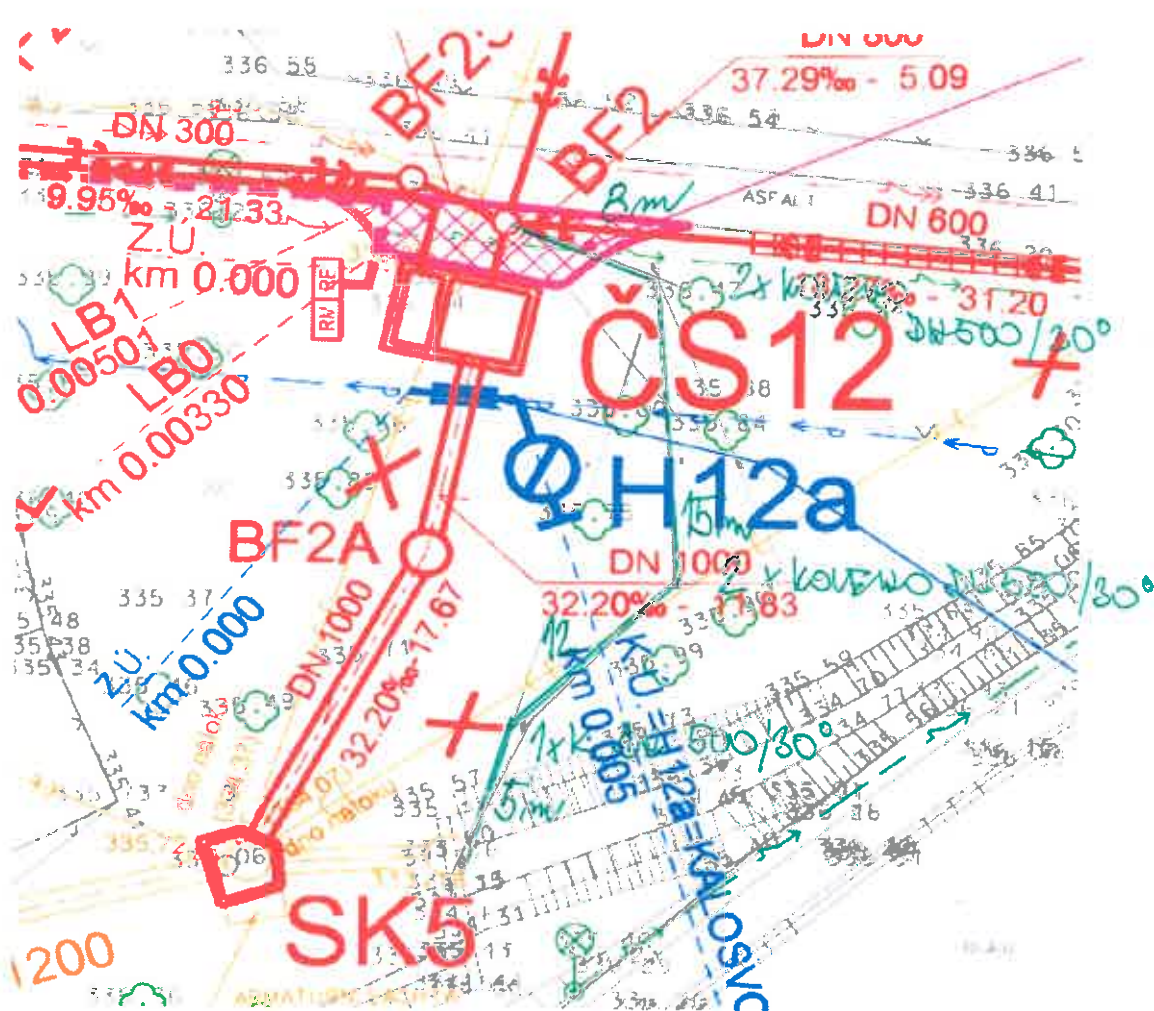

— TRASA OBTOUV ůS12 KGEH SN4. DN 500
CEVREH 40m

PODROBNÁ SITUACE ů.11a

ů.v. 1A-B-21a

VÝŘEZ ZE SITUACE

ZL ů.1A-88

ZL.Č. 1A-88 - SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV

SO 1.04 Stoky BF - provizorní obtok u ČS 12

Pol.	Popis položky				m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	
BF1 - Provedení a zrušení obtoku DN500									
Provedení obtoku									
Zemní práce									
1.04 - 10	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek					m3	114,40	102,20	11 691,68
1.01 - 10	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m					m2	176,00	26,50	4 664,00
1.01 - 12	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m					m2	176,00	6,60	1 161,60
1.04 - 14	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m					m3	62,92	2,70	169,88
1.04 - 20	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					m3	91,18	108,80	9 919,95
1.04 - 21	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny					m3	18,20	106,20	1 932,84
1.04 - 25	Štěrkopisek frakce 8-16					t	36,40	205,70	7 487,48
Trubní vedení									
1.02 - 61	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 500					m	40,00	185,80	7 432,00
N 1A-88-1	potrubí kanalizační PVC DN 500 SN 4					m	43,72	2 644,00	115 595,68
N 1A-88-3	potrubí kanalizační PVC KGEM DN 500					ks	5,05	8 029,47	40 548,82
Celkem za provedení obtoku						200 603,93			
Zrušení obtoku výkopem									
Zemní práce									
1.04 - 10	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek					m3	104,00	102,20	10 628,80
1.04 - 14	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m					m3	57,20	2,70	154,44
1.04 - 20	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					m3	57,20	108,80	6 223,36
Bourání konstrukcí									

ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV
VÝKAZ VÝMĚR

Pol	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
1.04 - 72	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč. šachet - 60% ceny	m	40,000	143,28	5 731,20
1.04 - 98	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na skládku vč. uložení	t	0,88	139,30	122,58
N 1A-88-2	skládkovné - plast	t	1,07	3 036,84	3 255,49
					26 115,87
R	Rezerva na nepředvídané práce	kpl	0,25	226 719,80	56 679,95
změna CELKEM :					283 399,75

ZL 1A-88, SO 1.04-STOBY ZF, PROVIZORNÍ OBTOK U ŠS 12

N 1A-88-1 - POTRUBÍ KGEH SJ4 500x122x5mm

CENÍK RICHTER AFRENZEL, SPRN 2 5%

TRUBKA PVC KGEH 500x122x5000 $\Rightarrow$ 12 559,- Kč/ks

CENA 1m 12 559 / 5 $\Rightarrow$ 2 511,80 Kč/m

VÝSLEDNÁ CENA 2 511,80 / 0,95 = 2 644 Kč/m

N 1A-88-2 SMOJKOVNE PVC POTRUBÍ BOURANÉHO OBTOKU

CENÍK EKOLA ČESKÉ LBSCHOLY, SPRN 2 5%

CENA VLOŽENÍ ODPADU 17 02 03 $\Rightarrow$ 2 885,- Kč/tunna

VÝSLEDNÁ CENA 2 885 Kč/t / 0,95 $\Rightarrow$ 3 036,84 Kč/t

HNOTNOST ODPADU $8 \times 0,134 =$ 1,072 t

N 1A-88-3 - KOLENO PVC DN 500 / 30°

CENÍK WAVIA, SPRN 2 5%

2x KOLENO 60° $\Rightarrow$ 2x2 = 4 ks KOLENO 30°

1x KOLENO 30° $\Rightarrow$ 1 ks +-

CEUKEM 5 KOLEN DN 500 / 30°

CENA KOLENO DN 500 / 30° $\Rightarrow$ 7 628,-

VÝSLEDNÁ CENA 7 628 / 0,95 $\Rightarrow$ 8 029,47 Kč/ks

RICHTER + FRENZEL

Ceník E-shop Výprodej Ke stažení Pobočky R+F

ceník  Hledat**trubka kanalizační KGEM SN4 ML 500X12,2X5000 [WO4]**

Upozornění: nově je možné vyhledávat podle skladového kódu R+F i podle označení dodavatele.

Upozornění: obchodní podmínky včetně výše poskytovaného rabatu z této ceny je třeba dojednat s obchodním útvarem v místě pobočky.

Aktuální ceny zahrnující vámi přidělený rabat u jednotlivých komodit se zobrazí po přihlášení do ceníku. Pro přístupové heslo kontaktujte svého obchodníka.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Tip: Využijte aplikaci Ceník Richter + Frenzel s možností jednoduché tvorby nabídek pro své zákazníky a následným převodem na objednávku, kterou můžete zaslat emailem na naší nejbližší pobočku. Více než 85 000 položek rozdělených do jednotlivých sekcí. Mějte vždy a všude přehled o svých cenách, reagujte na poptávku okamžitě. Bližší informace zde: Ceník Richter + Frenzel

Popis výrobku:	trubka kanalizační KGEM SN4 ML 500X12,2X5000 [WO4]
Cena:	12 559,00
Rabatová skupina:	OM09
DPH:	21%
Množstevní jednotka:	KS
Skladový kód R+F:	179256
Označení dodavatele:	21080

© 2000-2014 Richter + Frenzel s.r.o.

Komerční park Tulipán, Palackého 1153/76, 702 00 Ostrava - Přívoz
 Helenín 54/4760, 586 03 Jihlava 3
 Do Čertouz, hala B3 (exit 3 silnice R10) 193 00 Horní Počernice
 Komorovice 1, 396 01 Humpolec

tel.: 596 136 300 fax.: 596 136 301
 tel.: 567 312 901 fax.: 567 312 904
 tel.: 326 983 745 fax.: 326 983 744
 tel.: 565 777 111

IČ: 29101883

DIČ: CZ29101883

Platnost od: 1. leden 2014

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH

Kanalizační tvarovky KG z PVC

Materiál: PVC

Tuhost: SN4, SN8

kód	sortiment	ceník Kč/ks	cena po rabatu
21900	KGB KOLENO 400/15°	3 467	3 467
21910	KGB KOLENO 400/30°	3 746	3 746
21920	KGB KOLENO 400/45°	3 746	3 746
21950	KGB KOLENO 400/87,5°	6 659	6 659
21905	KGB KOLENO 500/15°	6 808	6 808
21915	KGB KOLENO 500/30°	7 628	7 628
21925	KGB KOLENO 500/45°	7 628	7 628
21955	KGB KOLENO 500/87,5°	13 869	13 869
22330	KGEA ODBOČKA 45° 110/110	126	126
22340	KGEA ODBOČKA 45° 125/110	147	147
22440	KGEA ODBOČKA 45° 125/125	182	182
22350	KGEA ODBOČKA 45° 160/110	215	215
22450	KGEA ODBOČKA 45° 160/125	264	264
22550	KGEA ODBOČKA 45° 160/160	292	292
22360	KGEA ODBOČKA 45° 200/110	418	418
22460	KGEA ODBOČKA 45° 200/125	473	473
22560	KGEA ODBOČKA 45° 200/160	486	486
22660	KGEA ODBOČKA 45° 200/200	569	569
22370	KGEA ODBOČKA 45° 250/110	957	957
22470	KGEA ODBOČKA 45° 250/125	1 055	1 055
22570	KGEA ODBOČKA 45° 250/160	1 124	1 124
22670	KGEA ODBOČKA 45° 250/200	1 320	1 320
22770	KGEA ODBOČKA 45° 250/250	1 694	1 694
22380	KGEA ODBOČKA 45° 315/110	1 527	1 527
22480	KGEA ODBOČKA 45° 315/125	1 667	1 667
22580	KGEA ODBOČKA 45° 315/160	1 527	1 527
22680	KGEA ODBOČKA 45° 315/200	2 636	2 636
22780	KGEA ODBOČKA 45° 315/250	4 300	4 300
22880	KGEA ODBOČKA 45° 315/315	4 440	4 440
22390	KGEA ODBOČKA 45° 400/110	4 300	4 300
22490	KGEA ODBOČKA 45° 400/125	4 855	4 855
22590	KGEA ODBOČKA 45° 400/160	4 578	4 578
22690	KGEA ODBOČKA 45° 400/200	4 925	4 925
22790	KGEA ODBOČKA 45° 400/250	8 046	8 046
22890	KGEA ODBOČKA 45° 400/315	9 293	9 293
22990	KGEA ODBOČKA 45° 400/400	13 178	13 178
22395	KGEA ODBOČKA 45° 500/110	8 600	8 600
22595	KGEA ODBOČKA 45° 500/160	9 432	9 432
22695	KGEA ODBOČKA 45° 500/200	11 148	11 148
22795	KGEA ODBOČKA 45° 500/250	12 067	12 067
22895	KGEA ODBOČKA 45° 500/315	14 670	14 670
22995	KGEA ODBOČKA 45° 500/400	18 030	18 030
23095	KGEA ODBOČKA 45° 500/500	23 581	23 581
24330	KGEA ODBOČKA 87° 110/110	126	126
24340	KGEA ODBOČKA 87° 125/110	175	175
24440	KGEA ODBOČKA 87° 125/125	184	184
24350	KGEA ODBOČKA 87° 160/110	236	236
24450	KGEA ODBOČKA 87° 160/125	251	251
24550	KGEA ODBOČKA 87° 160/160	292	292
24360	KGEA ODBOČKA 87° 200/110	418	418
24460	KGEA ODBOČKA 87° 200/125	473	473
24560	KGEA ODBOČKA 87° 200/160	500	500
24660	KGEA ODBOČKA 87° 200/200	569	569
24370	KGEA ODBOČKA 87° 250/110	973	973
24470	KGEA ODBOČKA 87° 250/125	1 164	1 164
24570	KGEA ODBOČKA 87° 250/160	1 320	1 320

Rabat %: 0

H 1A-88-3

Prokop Jiří Ing.

Od: Foglova Renata [Renata.Foglova@mariuspedersen.cz]
Odesláno: 23. dubna 2014 8:34
Komu: jiri.prokop@vces.cz
Předmět: RE: Ceník skládkovného

Dobrý den,

Cena za uložení plastů na skládku je:

Kód odpadu 17 02 03 – 2 885,- bez DPH / tuna

V účtě

EKOLA České Libchavy s.r.o.

Renata Foglová
obchodní zástupce

EKOLA České Libchavy s.r.o. | České Libchavy 172 | České Libchavy 561 14

☎ 465 461 500 | fax : 465 461 509 | mobil: +420 724 369 015

✉ renata.foglova@mariuspedersen.cz

From: Prokop Jiří Ing. [mailto:jiri.prokop@vces.cz]

Sent: Wednesday, April 23, 2014 7:42 AM

To: Jiskrova Stepanka

Subject: Ceník skládkovného

Dobrý den,

Dle včerejší telefonické dohody prosím o zaslání ceny skládkového na tvrdé PVC z likvidovaného kanalizačního potrubí na stavbě Kanalizace a ČOV Ústí nad Orlicí. Jedná se o cca 800kg materiálu.

S pozdravem

Ing. Jiří Prokop

vedoucí specialista - příprava výroby



VCES a.s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
tel.: +420 495 091 170, mobil: +420 602 475 328
e-mail: jiri.prokop@vces.cz, www.vces.cz

Zvažte, prosím, zda je nutné tuto zprávu vytisknout. Šetřeme naše životní prostředí!
Please consider the environment before printing this e-mail!

Více informací o společnosti VCES a.s. naleznete na www.vces.cz
For more information about company VCES visit www.vces.cz



KGEM – trubka s hrdlem SN 4

EAN CODE	KÓD	DN	L (mm)	m (kg)	Balení (ks)	Paleta (ks)
4052836200006	20320	110	500	0,605	1	96
4052836200105	20340	110	1000	1,123	1	86
4052836200204	20360	110	2000	2,157	1	86
4052836200303	20370	110	3000	4,030	1	86
4052836200501	20380	110	5000	5,258	1	86
4052836210005	20420	125	500	0,746	1	70
4052836210104	20440	125	1000	1,361	1	60
4052836210203	20460	125	2000	2,583	1	60
4052836210302	20470	125	3000	4,650	1	60
4052836210500	20480	125	5000	6,252	1	60
4052836220004	20520	160	500	1,174	1	45
4052836220103	20540	160	1000	2,124	1	40
4052836220202	20560	160	2000	4,023	1	40
4052836220301	20570	160	3000	7,220	1	40
4052836220509	20580	160	5000	9,721	1	40
4052836230003	20620	200	500	1,828	1	25
4052836230102	20640	200	1000	3,253	1	25
4052836230201	20660	200	2000	6,102	1	25
4052836230300	20670	200	3000	11,400	1	25
4052836230508	20680	200	5000	14,651	1	25
4052836240101	20740	250	1000	6,840	1	16
4052836240200	20760	250	2000	12,814	1	16
4052836240507	20780	250	5000	30,720	1	16
4052836250100	20840	315	1000	11,011	1	9
4052836250209	20860	315	2000	20,427	1	9
4052836250506	20880	315	5000	48,413	1	9
4052836260109	20940	400	1000	17,948	1	6
4052836260208	20960	400	2000	32,928	1	6
4052836260505	20980	400	5000	77,975	1	6
4052836270108	21040	500	1000	31,721	1	4
4052836270207	21060	500	2000	57,511	1	4
4052836270504	21080	500	5000	134,881	1	4

KGEM – trubka s hrdlem SN 8

EAN CODE	KÓD	DN	L (mm)	m (kg)	Balení (ks)	Paleta (ks)
4052836221704	20445	160	1000	2,890	1	40
4052836221803	20475	160	3000	8,560	1	40
4052836221902	20485	160	5000	13,570	1	40
4052836231703	20545	200	1000	4,710	1	25
4052836231802	20575	200	3000	13,350	1	25
4052836231901	20585	200	5000	21,750	1	25
4052836241702	20645	250	1000	8,860	1	16
4052836241207	20665	250	2000	16,720	1	16
4052836241900	20685	250	5000	40,300	1	16
4052836251701	20745	315	1000	15,290	1	9
4052836251206	20765	315	2000	28,470	1	9
4052836251909	20785	315	5000	67,980	1	9
4052836261700	20845	400	1000	29,590	1	6
4052836261205	20865	400	2000	54,270	1	6
4052836261908	20885	400	5000	128,710	1	6
4052836271709	20945	500	1000	49,920	1	4
4052836271808	20975	500	3000	89,870	1	4
4052836271907	20985	500	5000	213,720	1	4

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “									
Změnový list		ZL č. 1A-88							
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY									
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum:							
Odesláno/									
	předáno:								
Stavební objekt (provozní soubor):		1.04 – STOKY BF							
Odkazy:	na specifikaci:	RDS							
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS							
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny							
	na jinou část smlouvy:								
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:									
Důvod změny: Změna RDS									
Popis změny: Stoky BF – při zahájení prací na ČS 12 bylo zjištěno, že stávající stoka je funkční, odvádí odpadní vody ze sídliště. Vzhledem k době výstavby a množství odváděných splaškových vod nebylo možné provádět přečerpávání. Z tohoto důvodu bylo nutno provést provizorní obtok z potrubí PVC SN4 DN500 v délce 40m. Po skončení stav. prací bylo potrubí zlikvidováno a odvezeno na skládku.									
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny: <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Vícepráce</td> <td>232 392,35 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td>232 392,35 Kč</td> </tr> </table>				Vícepráce	232 392,35 Kč	Méněpráce	0,00 Kč	Celkem	232 392,35 Kč
Vícepráce	232 392,35 Kč								
Méněpráce	0,00 Kč								
Celkem	232 392,35 Kč								
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “ <i>Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.</i>									
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.									
Vyjádření dotčených:									
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí 23. 10. 2014 Datum: „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ Pobřeží 667/78 186 00 Praha 8		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí 23. 10. 2014 Datum: AQUA PROCON s.r.o. Příspěvková organizace Přeloučská 12 502 01 Praha 3, Žižkov IČO: 174696470							
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí 23. 10. 2014 Datum: ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY d plus - projektová a inženýrská s.s. Jeremenková 28, 772 00 Olomouc		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí 23. 10. 2014 Datum: TEPVOS, spol. s r.o. Tř. Svobody 237 782 01 Olomouc							

ÚSTÍ NAD ORLÍČÍ - KANALIZACE A ČOV
VÝKAZ VÝMĚR

ZL č. 1A-88 - SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV

SO 1.04 Stoky BF - provizorní obtok u ČS 12

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Vícepráce Kč	Méněpráce Kč
BF1 - Provedení a zrušení obtoku DN500							
Provedení obtoku							
Zemní práce							
1.04 - 10	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 započatých i nezapočatých s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu, s přeložením výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	114,40	102,20	11 691,68	11 691,68	
1.01 - 10	Pažení a uzavření stěn rýh hl. do 2 m	m2	176,00	26,50	4 664,00	4 664,00	
1.01 - 12	Odstřínání pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	176,00	5,60	1 161,60	1 161,60	
1.04 - 14	Svlékl přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	62,92	2,70	169,88	169,88	
1.04 - 20	Zásyp jam, rýh, šachet a zhrutněním	m3	81,18	108,80	9 919,95	9 919,95	
1.04 - 21	Obvaz potrubí bez prohození sypaliny	m3	18,20	108,20	1 932,64	1 932,64	
1.04 - 25	Štěkoplasek frakce B-16	t	36,40	205,70	7 487,48	7 487,48	
Trubní vedení							
1.02 - 61	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 500	m	40,00	185,90	7 432,00	7 432,00	
N 1A-88-1	potrubí kanalizační PVC DN 500 SN 4	m	43,72	2 644,00	115 595,68	115 595,68	
N 1A-88-3	potrubí kanalizační PVC KGEM DN 500	ks	5,05	8 029,47	40 548,62	40 548,62	
Celkem za provedení obtoku					200 803,63	200 803,63	
Zrušení obtoku výkopem							
Zemní práce							
1.04 - 10	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 započatých i nezapočatých s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu, s přeložením výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	104,00	102,20	10 628,80	10 628,80	
1.04 - 14	Svlékl přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	57,20	2,70	154,44	154,44	
1.04 - 20	Zásyp jam, rýh, šachet a zhrutněním	m3	57,20	108,80	6 223,36	6 223,36	
Bourání konstrukcí							
1.04 - 72	Vydělení potrubí stávající odstavené kanalizace v šachet - 60% ceny	m	40,000	143,28	5 731,20	5 731,20	
1.04 - 98	Vodorovná doprava vyhouvaných hmot po suchu na vzdálenost do 100 m	t	0,88	139,30	122,58	122,58	
N 1A-88-2	akáciové - píseň	l	1,07	3 036,64	3 255,49	3 255,49	
Celkem zrušení obtoku					28 115,87	28 115,87	
Všeobecné položky							
3	Realizace dokumentace	p.s.	0,23	19 134,66	4 337,83	4 337,83	
11	Dokumentace skutečného provedení	p.s.	0,23	5 687,59	1 334,72	1 334,72	
Celkem všeobecné položky					5 672,55	5 672,55	
zněná CELKEM :					232 382,95	232 382,95	
