

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “					
Změnový list				ZL č.3-32	
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY					
Komu: TEPVOS, spol. s r.o.			Datum: 9.10.2013		
Odesláno/					
	předáno:				
Stavební objekt (provozní soubor):			SO 3.21 – Čerpací stanice jih		
Odkazy:			na specifikaci:		
			na výkresy: Projektová dokumentace změny - RDS		
			na rozp. podklady: Výkaz výměr změny		
			na jinou část smlouvy:		

ZMĚNA – popis změny:

Popis změny: SO 3.21 – Čerpací stanice jih – pro vyrovnání výškových rozdílů kolem pilíře elektro u ČS 1 bude proveden výkop rýhy a osazeny betonové palisády včetně zpětného zásypu.

Součástí oznámení změny je: 1) Zápis v DVMP
2) Stanovisko projektanta
3) Zákres změn do PD
4) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny =
plus 22 199,41 Kč bez DPH

Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “

Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.

Vyjádření dotčených:

Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : „Sdružení „ Ústí nad Orlicí – - Kanalizace a ČOV “ Datum: 9.10.2013 Pobřeží 667/73 186 00 Praha 8	Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí AQUA PROJEKT s.r.o. divize Praha Datum: 9.10.2013
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí : ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV Datum: 9.10.2013 SPRÁVCE STAVBY d plus - projektová a inženýrská s.s. Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc	Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí TEPVOS Datum: 9.10.

UČS 3 - SO 3.253.21 ÚS 1

23.5.2013

PODNET ŽHOTOVITELE

NA ZÁKLADĚ NEROVNOSTI ÚROVNĚ TERÉNU
STAVAJÍCÍ KOMUNIKACE A ÚROVNĚ ŮST
JE NEZBYTNÉ PROVÉST ZABEZPEČENÍ HRANÝ
SVAKU KOMUNIKACE OPĚRNOU STĚNU
(PACISA'DA).

ŽHOTOVITEL PŘEDLOŽIL ŽE

ZA OBJEDNATELE

ZA Sp S₆

ZA ŽHOTOVITELE

P. GNEŠP

P. SEVOTK

P. PAUCIO!

UČS 1A - SO 1.06 STOKA N2

23.5.2013

PODNET ŽHOTOVITELE

NA ZÁKLADĚ EPIDEMIČNÍ LOKALIZACE VYJŠENÍ TARDOL
HORNÍM A LHM I HORNÍM NEBEZPEČÍ PRŮMĚ
VIBRACÍ MA PŘI KID BĚ NA PŘÍLEHLÉ MEMORITOSTI
KLUBU JIŽ VYHARUJÍ STALICHTĚ POUČELY BUDE
PŮJKA STOKY N2 OD R55- R59 PŘÍKROVATE
OLÁTE OD STAVAJÍCÍCH MEMORITOSTI, TJ. DO
KOMUNIKACE SÚS, KOLE JE NUTNO ODOBŘÍD
PŘÍKROVATE SPRÁVCE KOMUNIKACE UNĚMIL
STOKU DO STĚNY JIŽ STANOU PRŮMĚ.

ZA OBJEDNATELE

ZA Sp S₆

ZA ŽHOTOVITELE

P. GNEŠP

P. SEVOTK

P. PAUCIO!



„Sdružení pro Ústí nad Orlicí-kanalizace a ČOV“

Pan Bronislav Hána

Pobřežní 667/78

186 00 Praha 8

Datum: 5-10-2013
Vyřizuje: Ing. Kozická, 739 002 556

**Věc : Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV
3 – Dlouhá Třebová - kanalizace
Stanovisko projektanta ke změnovému listu č. 3-32
SO 3.21 – Čerpací stanice sever – ČS 1
– opěrná zeď**

Vážený pane,

na základě Vašeho požadavku Vám sdělujeme stanovisko projektanta ke změnovému listu č.3-32.

Při dokončovacích prací po výstavbě podzemního objektu čerpací stanice splašků ČS1 v Dlouhé Třebové vyplynulo, že terén v daném díky obnažené mostní konstrukci s komunikací přes řeku Třebovku nelze srovnat do roviny a je nutné zabezpečit opěrou těleso komunikace u hrany elektropilíře.

Z tohoto důvodu byla realizována opěrná stěna z betonových palisád zapuštěná v betonovém základu s nadzemní částí výšky u,5 m a délkou cca 2,5 m

Skryté podzemní konstrukce mostu nebylo možné prozkoumat při přípravných projekčních pracích v rámci ZDS.

Z výše uvedených důvodů se změnovým listem č. 3-32 souhlasíme.

S pozdravem

Ing. Daniel Kozický

Sídlo **Brno**

AQUA PROCON s.r.o.
Palačského tř. 12, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 426 011
fax: +420 541 426 012
e-mail: info@aquaprocon.cz

Divize **Praha**

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha
Tel.: +420 220 879 819
fax: +420 226 712 140
e-mail: info.praha@aquaprocon.cz

IČ: 46964371


DIČ: CZ46964371

Brno venkov č. 6: 24301-641/0100

Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

Z DŮVODŮ PŘEVEDENÍ VĚVY A ASFALTU S FILICÍ NA PROČS1, JE KÚVNO PŘEVÉST PŘELOŽKAT
 VÝŠKOVÉ ROZDÍLY PŮVODNÍCH VĚVÍ (ASFALT PŘED MOSTEM A NEPŘEVÍKOVÁ PLOCHA U ŘEČI).
 NAVRHNEME PROVÉST PÁLISADY, CELKOVÁ DÉLKA Cca. 8 m. VÝŠKA PÁLISAD NA VĚVĚH = 40 cm. DN 120 mm.

PŘÍLOHA: FOTO

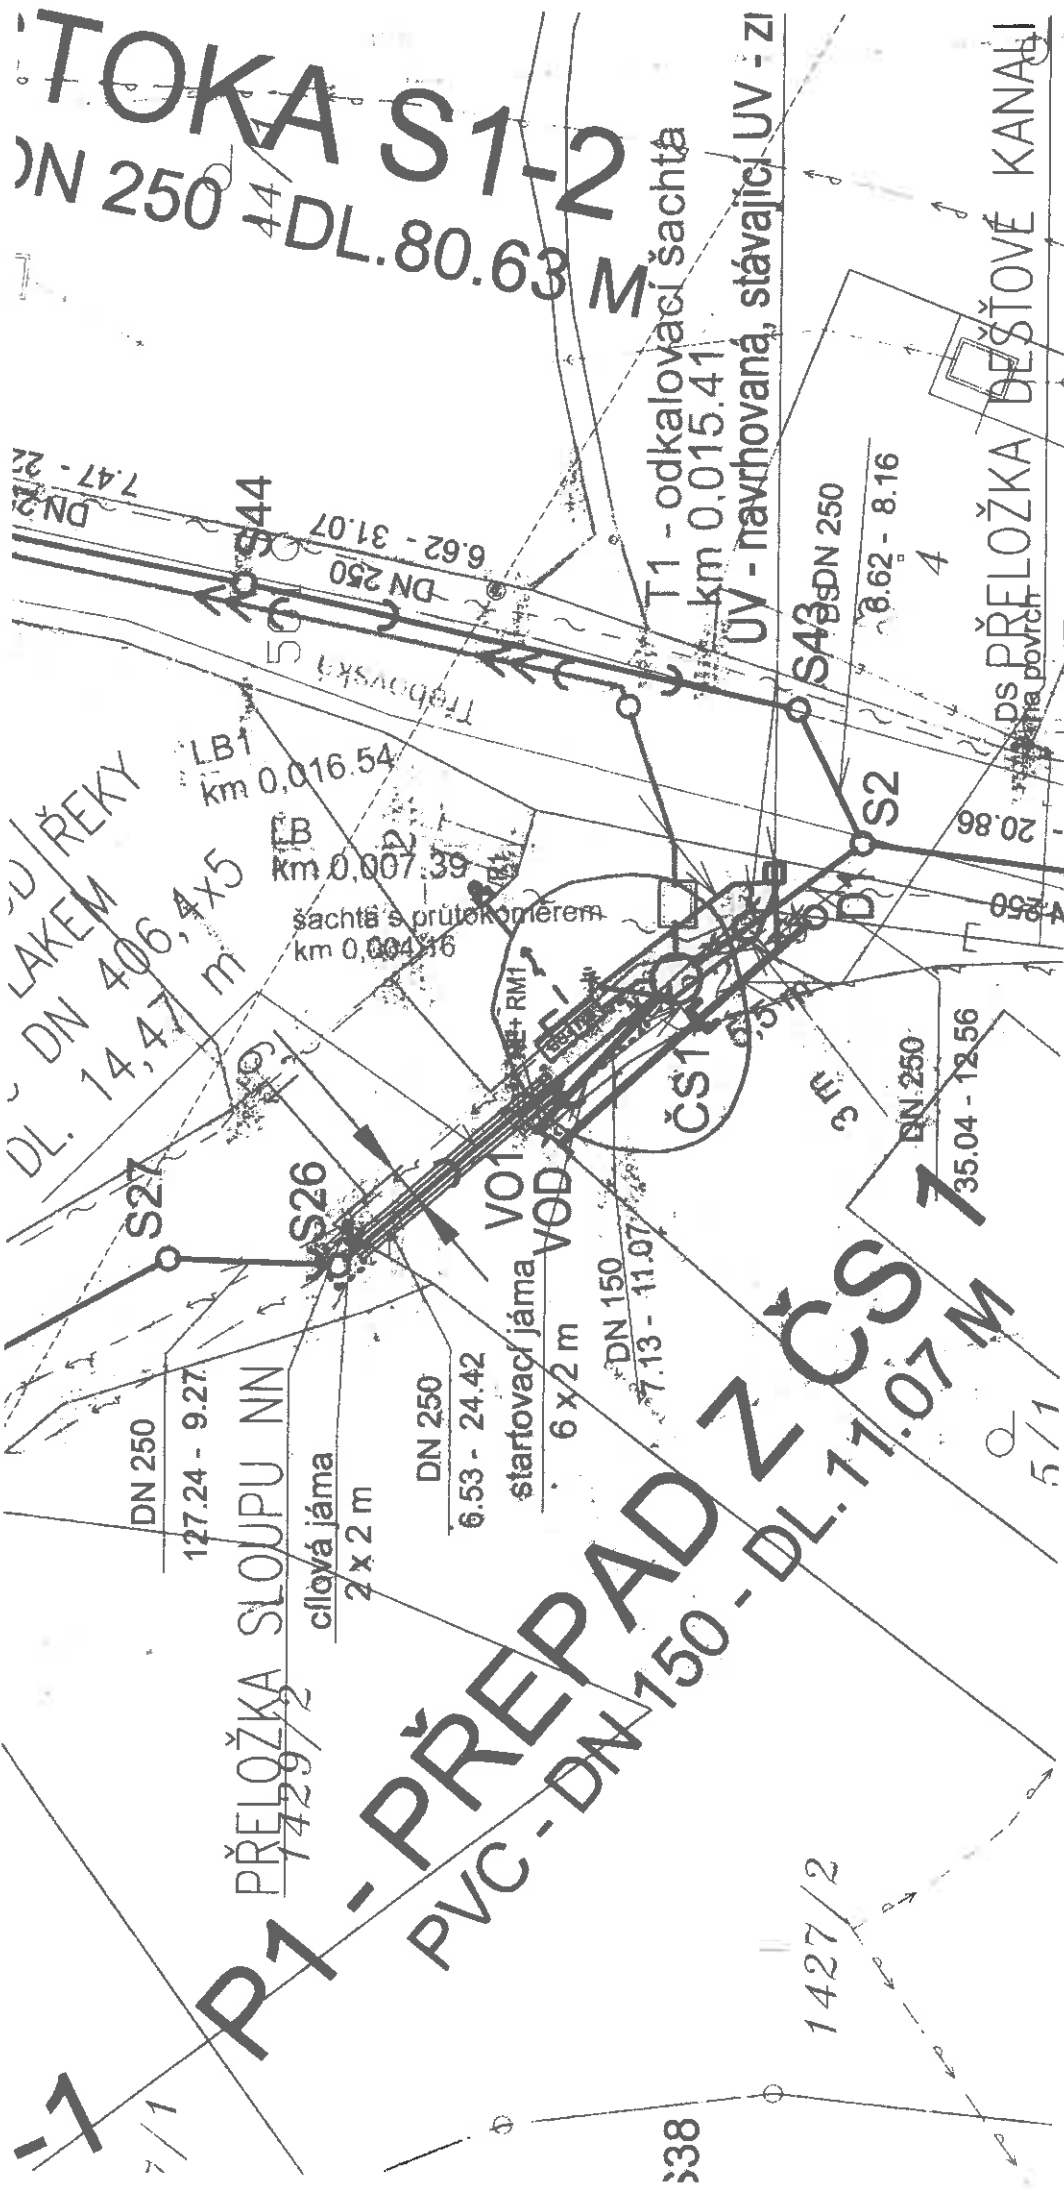

TERMIN REALIZACE 30. října 2013. ŘADA NE OSOBNÍ VĚSTVĚNÍ A NAVRHOVÁNÍ, CHODNÍKOVÉ

5.9.2013

ZL Č. 3-32, SO 3.21

Stavba: Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV

Kód položky	Číslo ZL	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
		SO 3.21 ČERPAČÍ STANICE SEVER (ČS1, ČS2, ČS3, ČS4, ČS9, ČS 10)				
		ČS1 - provedení palisád u ČS 1				22 199,41
		Zemní práce				1 491,01
132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,600	486,00	777,60
3.12 - 10		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0m	m3	1,600	2,70	4,32
3.12 - 12		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	1,600	33,20	53,12
3.12 - 13		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. naložení	m3	0,800	79,60	63,68
3.12 - 14		Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	0,800	345,00	276,00
3.12 - 16		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,800	108,80	87,04
3.12 - 21		Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146, vhodné vyřídění zeminy z výkopů a recyklátů dle TP146	T	1,440	159,20	229,25
		Základy a zvláštní zakládání				16 269,52
332311112		Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku přes 0,5 do 1 m	ks	71,000	137,00	9 727,00
N 3-32-2		Palisáda betonová oblá, délka 600mm	ks	15,150	71,33	1 080,65
N3-32-1		Palisáda betonová oblá, délka 800mm	ks	56,560	96,55	5 460,87
R		Rezerva pro nepředvídatelné práce	kpl	0,250	17 759,53	4 439,88

ZIENLOT LIST ZL 3-32, SO 3.21 - ČE SEVER
KAMNICE POLICEK

POLICAJ - JLE JLE TO 22.01.2009 PRO SVEDODAVATELE ACTIVE-300
SPRN 2 52

N 3-32-1 - PAUSADA PASO PA 2/80, PAIR.

NAKUPNI CENA

91,73 Kč/kg

VYSUEDNA 91,73 / 0,95 =

96,55 Kč/kg

N. 3-32-2 - PAUSADA PASO PA 2/60, PAIR.

NAKUPNI CENA

87,77 Kč/kg

VYSUEDNA CENA 87,77 / 0,95 =

91,33 Kč/kg

Faktura - daňový doklad č. 2201302099

1509DF 8123

Strana 1

Prodávající :

PRO-DOMA, spol. s r.o.
Budčická 1479
190 16 Praha 9 - Újezd nad lesy
Tel: +420 323 666 810
Fax: +420 323 666 816

16-09-2013

ALPINE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 613/13
757 43 Valašské Meziříčí

Kupující :

ALPINE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 613/13
757 43 Valašské Meziříčí
Česká republika

Příjemce :

ALPINE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 613/13
757 43 Valašské Meziříčí
Česká republika



IČO : 45192286

DIČ : CZ45192286

Variabilní symbol : 2201302099

Místo dodání :

Vaše objednávka :
Č.plné moci :

Datum splatnosti : 24.10.13
Datum zdanitelného plnění : 09.09.13
Datum vystavení : 10.09.13
Způsob platby : Bankou

Číslo zboží

Název zboží

Množství MJ

Cena MJ bez DPH

Slevy % Zákl. Za vrác.

Cena MJ po slevě

Celkem bez DPH DPH %

Dodávka č. 220132205732

kanalizace

101045 Beton ootěrový EBF jemný 30kg

5 ks

90,909

10

81,82

409,09

21

253893 Násada na lopatu 1-kol. Export

5 ks

75,207

10

67,69

338,44

21

143407 Sada náhradních čepelí (B-018) 18mm/10ks

2 ks

16,529

10

14,88

29,75

21

199155 Páska izolační Emos 15x10 barva MODRÁ

10 ks

5,785

10

5,21

52,06

21

199155 Páska izolační Emos 15x10 barva ŽLUTÁ

10 ks

5,785

10

5,21

52,06

21

158892 Pytel na odpad 0,04mm 120l 25ks

2 ks

145,455

10

130,91

261,82

21

142753 Tužka lesařská červený ak

5 ks

3,306

10

2,98

14,88

21

213960 Hadr viskóza 60x70cm

2 ks

23,967

10

21,57

43,14

21

Dodávka č. 220132205742

kanalizace dlouhá třebová

215299 Deska EPS soki 3000 100x50x2cm

2 ks

37,19

10

33,47

66,94

21

Dodávka č. 220132205842

100115 Cement II/B-M (S-LL) 32,5R PL 25kg exp.

10 ks

55,372

10

49,84

498,35

21

Mokrý EXW

Dodávka č. 22013220594

kanalizace DI. třebová

100026 Násada Páso PA 200 barva PÁNOON

55 ks

91,736

10

12,55

4 839,60

21

100026 Násada Páso PA 200 barva PÁNOON

10 ks

67,669

10

60,99

614,99

21

Zaokrouhlení faktury

1

0,05

0,05

0,05

0,05

0

Rekapitulace DPH

DPH %	Základ DPH	DPH částka	Částka s DPH
0 %	0,05	0,00	0,05
21 %	7 304,92	1 534,03	8 838,95
Celkem	7 304,97	1 534,03	8 839,00

Celkem k úhradě

8 839,00 CZK

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list			č. ZL č.3-32
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY			
Komu: TEPVOS, spol. s r.o.		Datum:	
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 3.25 – Čerpací stanice jih	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:			
Důvod změny: Rozdíl mezi ZDS a RDS			
Popis změny:			
SO 3.21 – Čerpací stanice jih – pro vyrovnání výškových rozdílů kolem pilíře elektro u ČS 1 bude proveden výkop rýhy a osazeny betonové palisády včetně zpětného záсыpu.			
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny: Vícepráce 18 202,42 Kč Méněpráce 0,00 Kč Celkem 18 202,42 Kč 2) Fotodokumentace			
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
<i>Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.</i>			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí <i>„Sdružení pro Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“</i> Pobřežní 667/78 185 00 Praha 8, ČOV - 8. 10. 2014 Datum:		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí SOUTA PROJEKT s.r.o. Divizní Praha Dukelských hrdinů 12 170 00 Praha 7, ČR IČ: CZ46961371 - 8. 10. 2014 Datum:	
Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY d plus - projektová a inženýrská s.s. Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc - 8. 10. 2014 Datum:		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí TEPVOS, spol. s r.o. Tepovská 287 582 00 Ústí nad Orlicí - 8. 10. 2014 Datum:	

Rekapitulace				
--------------	--	--	--	--

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 3.25 – Čerpací stanice jih	Palisády	0,00 Kč	18 202,42 Kč	18 202,42 Kč
CELKEM		0,00 Kč	18 202,42 Kč	18 202,42 Kč

ZL č. 3-32, SO 3.21

Stavba: Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV

Kód položky	Číslo ZL	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
		SO 3.21 ČERPAČÍ STANICE SEVER (ČS1, ČS2, ČS3, ČS4, ČS9, ČS 10)				
		ČS1 - provedení palisád u ČS 1				16 202,42
		Zemní práce				1 491,01
132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,600	486,00	777,60
3.12 - 10		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0m	m3	1,600	2,70	4,32
3.12 - 12		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,600	33,20	53,12
3.12 - 13		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.naložení	m3	0,800	79,60	63,68
3.12 - 14		Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	0,800	345,00	276,00
3.12 - 16		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,800	108,80	87,04
3.12 - 21		Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146, vhodné vytříděné zeminy z výkopů a recyklátů dle TP146	T	1,440	159,20	229,25
		Základy a zvláštní zakládání				16 288,52
332311112		Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	ks	71,000	137,00	9 727,00
N 3-32-2		Palisáda betonová oblá, délka 600mm	ks	15,150	71,33	1 080,65
N3-32-1		Palisáda betonová oblá, délka 800mm	ks	56,560	96,55	5 460,87
R		Rezerva pro nepředvídatelné práce	kp!	0,000	17 759,53	0,00

Fotodokumentace

