

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “					
Změnový list č.				č.	
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY				ZL č.1B-79	
Komu: TEPVOS, spol. s r.o.			Datum: 08. 05. 2014		
Odesláno/		předáno:			
Stavební objekt (provozní soubor):			SO 1.60 - Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu		
Odkazy:		na specifikaci:		RDS	
		na výkresy:		Projektová dokumentace změny RDS	
		na rozp. podklady:		Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
		na jinou část smlouvy:			
ZMĚNA – popis změny:					
Popis změny:					
Uvedený změnový list řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.					
Součástí oznámení změny je:					
1) Rekapitulace kalkulace 2) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny – celková bilance 3) Zápis v deníku více / méně prací a stavebním deníku					
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “					
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.					
Vyjádření dotčených:					
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí - Kanalizace a ČOV Pobřeží 867/78 Datum: 08. 05. 2014 86 00 Praha 8			Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí STB AQUA VEŠPRŮJON ① ACQUA PROJEKCI S.R.O. divize Praha Dukovská 12 170 00 Praha 7 DIČ: CZ46964771 Datum: 08. 05. 2014		
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí Datum: 8. 5. 2014			Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí TEPVOS TEPVOS, spol. s r. o. Třebovská 207 552 03 Ústí nad Orlicí Datum: 8. 5. 2014		

Rekapitulace

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.60 - Čerpací stanice vratného a přebytkového kalu	Celková bilance	-5 133,68 Kč	13 012,42 Kč	7 878,74 Kč
CELKEM		-5 133,68 Kč	13 012,42 Kč	7 878,74 Kč

Kód položky		Objekt	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
1.	2.	3.	5.	6.	11.	12.	13.
	-	SO 1.60	SO 1.60 ČERPACÍ STANICE VRATNÉHO A PŘEBYTEČNÉHO KALU				1 122 584,57
		SO 1.60	Zemní práce				20 994,41
1.60 - 11103		SO 1.60	Uložení zeminy do násypů zhutněných chodníků	m3	16,654	199,00	3 314,21
1.60 - 11104		SO 1.60	Zásyp zeminou se zhutněním	m3	86,617	265,40	17 680,20
		SO 1.60	Betonové konstrukce				17 274,72
1.60 - 35108		SO 1.60	Prostý beton C 30/37 XA2 XF3 s bedněním	m3	0,292	14 620,70	4 262,30
1.60 - 35108	vp	SO 1.60	Prostý beton C 30/37 XA2 XF3 s bedněním	m3	0,890	14 620,70	13 012,42
		SO 1.60	Sanace				48 527,40
1.60 - 35111		SO 1.60	Sanace pro SO 1.60	sada	1,000	48 527,40	48 527,40
		SO 1.60	Úpravy povrchu vnější				99 534,45
1.60 - 62103		SO 1.60	Nový sokl, včetně odstranění stávajícího soklu	m	32,000	812,10	25 987,20
1.60 - 62103	mp	SO 1.60	Nový sokl, včetně odstranění stávajícího soklu	m	-0,800	812,10	-649,68
1.60 - 62104		SO 1.60	Nátěr vně stávající omítky-celá budova+drobné opravy omítky+lešení	m2	168,900	451,10	76 190,79
1.60 - 62104	mp	SO 1.60	Nátěr vně stávající omítky-celá budova+drobné opravy omítky+lešení	m2	-4,420	451,10	-1 993,86
		SO 1.60	Potrubí				487 633,10
1.60 - 81122		SO 1.60	Prostupy a otvory pro SO 1.60	sada	1,000	120 814,20	120 814,20
1.60 - 81123		SO 1.60	Litínové potrubí DN 300 pro SO 1.60 - skladba P1,P2	sada	1,000	366 818,90	366 818,90
		SO 1.60	Různé dokončovací konstrukce				20 531,10
1.60 - 95108		SO 1.60	Zednická výpomoc UT,VZT,ELEKTRO pro SO 1.60	sada	1,000	11 411,30	11 411,30
1.60 - 95109		SO 1.60	Vyčištění objektů, úklid pro SO 1.60	sada	1,000	2 750,70	2 750,70
1.60 - 95114		SO 1.60	Drobné stavební práce pro instalace TLG zařízení pro SO 1.60	sada	1,000	6 369,10	6 369,10
		SO 1.60	Bourání a demolice konstrukcí				110 041,80
1.60 - 96101		SO 1.60	Vybourání železobetonových konstrukcí	m3	13,373	4 410,60	58 982,95
1.60 - 96104		SO 1.60	Bourání betonových konstrukcí	m3	2,999	3 863,80	11 588,00
1.60 - 96104	mp	SO 1.60	Bourání betonových konstrukcí	m3	-0,609	3 863,80	-2 353,06
1.60 - 96110		SO 1.60	Demolice stávajícího potrubí v armaturní komoře	sada	1,000	15 285,90	15 285,90
1.60 - 96111		SO 1.60	Vyvrtní otvorů prům. 150mm do stáv. dna a stěn nádrže	kus	5,000	5 307,60	26 538,00
		SO 1.60	Konstrukce sklobetonové				10 482,50
1.60 - 76111		SO 1.60	Nové okno z sklen. tvárnic 1000/750 + zmenšení otvoru + vybourání okna	kus	1,000	10 482,50	10 482,50
		SO 1.60	Kovové stavební konstrukce				9 553,70
1.60 - 76742		SO 1.60	Demontáž ocelových prvků pro SO 1.60	sada	1,000	9 553,70	9 553,70
		SO 1.60	Malby				3 564,29
1.60 - 78401		SO 1.60	Malby vnitřní, včetně přípravy podkladu	m2	73,440	50,40	3 701,38
1.60 - 78401	mp	SO 1.60	Malby vnitřní, včetně přípravy podkladu	m2	-2,720	50,40	-137,08
		SO 1.60	Zařízení vzduchotechniky				199 035,00
1.60 - 92411		SO 1.60	Zařízení č. 60-1. Větrání strojovny ČSVK	kpl	1,000	172 497,00	172 497,00
1.60 - 92412		SO 1.60	Zařízení č. 60-2 Větrání elektrorozvodny ČSVK	kpl	1,000	26 538,00	26 538,00
		SO 1.60	Stavební elektroinstalace :				95 412,10
		SO 1.60	Montážní materiál a práce				63 672,50
1.60 - M1		SO 1.60	montáž ve stávajícím rozváděči elektrostavební instalace - náhrada a doplnění stávající výzbroje novou s jističi, přepětovou ochranou, proudovými	kus	1,000	18 554,00	18 554,00
1.60 - M2		SO 1.60	osvětlení ve strojovně o celkové osvětlované ploše cca 65m2 zářivkovými svítidly intenzita osvětlení 150 lx, v instalaci jsou zahrnuty i vypínače, vodiče	sada	1,000	9 764,80	9 764,80
1.60 - M3		SO 1.60	osvětlení v rozvodně o celkové osvětlované ploše cca 20m2 zářivkovými svítidly intenzita osvětlení 200 lx, v instalaci jsou zahrnuty i vypínače, vodiče	sada	1,000	4 404,60	4 404,60
1.60 - M4		SO 1.60	osvětlení nad vstupy a vjezdy svítidly, v instalaci jsou zahrnuty i vypínače, vodiče a instalační materiál (kabely, vypínače, krabice atd.)	sada	2,000	1 388,60	2 777,20
1.60 - M5		SO 1.60	nouzové orientační osvětlení zářivkovými svítidly s vlastním akumulátorem, v instalaci jsou zahrnuty i vodiče a instalační materiál	sada	1,000	7 583,40	7 583,40
1.60 - M6		SO 1.60	nápojení VZT jednotky přívodu 400V, 8,12kW ve strojovně - vzájemná vazba s ventilátorem, vlastní řídicí skříňka, včetně napájení, jističní a	sada	1,000	3 382,70	3 382,70
1.60 - M7		SO 1.60	nápojení ventilátoru odvodu 230V, 0,08kW ve strojovně, ovládání od VZT - vzájemná vazba, včetně napájení, jističní a elektroinstalace	sada	1,000	1 485,90	1 485,90
1.60 - M8		SO 1.60	nápojení ventilátoru 230V, 0,1kW v rozvodně, ovládání ručně+termostaty, včetně napájení, jističní a elektroinstalace a termostatů	sada	1,000	4 470,50	4 470,50
1.60 - M9		SO 1.60	nezbytné práce vyvolané nepředvídatelnými komplikacemi při stavbě	sada	1,000	796,10	796,10
1.60 - M10		SO 1.60	provizorní zapojení	sada	1,000	796,10	796,10
1.60 - M11		SO 1.60	uzemnění všech vodivých konstrukcí	sada	1,000	782,90	782,90
1.60 - M12		SO 1.60	utěsnění kabelových průchodů multidiametrální technologií proti průniku vody (podle okolností i v nevýbušném provedení)	sada	1,000	782,90	782,90
1.60 - M13		SO 1.60	protipožární utěsnění kabelových průchodů mezi požárními úseky	sada	1,000	782,90	782,90
1.60 - M14		SO 1.60	kompletní označení všech kabelů, elektrických zařízení a prostorů štítky	sada	1,000	939,40	939,40
1.60 - M15		SO 1.60	vyzkoušení a revize	sada	1,000	2 388,40	2 388,40
1.60 - M16		SO 1.60	zákres skutečného stavu včetně geodet. zaměření podzemních sítí	sada	1,000	3 980,70	3 980,70
		SO 1.60	Demontáže				14 569,50
1.60 - D1		SO 1.60	demontáže a ekologická likvidace veškeré nepotřebné elektrovýzbroje, svítidel, kabelů, pomocných konstrukcí apod.	sada	1,000	1 592,30	1 592,30
1.60 - D2		SO 1.60	demontáž nepotřebného elektrického zařízení osvětlení a zásuvek	sada	1,000	796,10	796,10
1.60 - D4		SO 1.60	odpojení a demontáž rušených ovládacích skříní	sada	1,000	398,10	398,10
1.60 - D5		SO 1.60	odpojení a demontáž rušených svorkových skříní	sada	1,000	398,10	398,10

Kód položky		Objekt	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
1.60 - D6		SO 1.60	odpojení a demontáž rušených kabelů	sada	1,000	398,10	398,10
1.60 - D7		SO 1.60	demontáž rušených kabelových tras	sada	1,000	1 592,30	1 592,30
1.60 - D8		SO 1.60	demontáž rušených pomocných konstrukcí	sada	1,000	1 592,30	1 592,30
1.60 - D9		SO 1.60	provizorní přepojování v nutném rozsahu	sada	1,000	796,10	796,10
1.60 - D10		SO 1.60	provizorní odpojení po přechodnou dobu montáže	sada	1,000	318,50	318,50
1.60 - D11		SO 1.60	opětovné napojení po přechodnou dobu montáže	sada	1,000	318,50	318,50
1.60 - D12		SO 1.60	provizorní rozváděče a skříně pro provizorní zapojení	sada	1,000	3 980,70	3 980,70
1.60 - D13		SO 1.60	kabely pro provizorní přepojování (vhodných parametrů)	sada	1,000	2 388,40	2 388,40
		SO 1.60	Zemní a stavební práce				17 170,10
1.60 - S1		SO 1.60	veškeré související prostupy a stavební práce, které neohroží statiku objektů (průrazy a vrtání stěn, stropů a podlah apod.)	sada	1,000	6 899,90	6 899,90
1.60 - S2		SO 1.60	výkopy pro kabely a zemnicí pásy vč. zamerení, betonování, kabelového pískového lože, zákrytu kabelů deskami, výstražné folie, chrániček, záhozu, zhotovení odvozu a ukládky odpadních materiálů	sada	1,000	5 042,20	5 042,20
1.60 - S3		SO 1.60	řezání asfaltových a betonových vozovek a zpevněných ploch pro výkopy	sada	1,000	1 937,30	1 937,30
1.60 - S4		SO 1.60	provizorní úprava povrchu po výkopech	sada	1,000	835,90	835,90
1.60 - S5		SO 1.60	začištění upravovaných povrchů v dotčených objektech, příslušné nátěry konstrukcí a stěn a úklid	sada	1,000	2 454,80	2 454,80

Objekt	80 1.60
Položka č.	35108

$$(1,05 \times 0,65 \times 0,29 \times 3) + (0,4 \times 0,4 \times 0,25) + (1,0 \times 1,37 \times 0,4) = 1,182$$

LFWA 0,242 m³

CHMIS 0,189 m³

Objekt	1.60 - ČS KALU
Položka č.	1.60 - 35108 PROSTÝ BETON C20/37

$$(1,37 \times 1 \times 0,26) + (0,65 \times 1,05 \times 3 \times 0,135) + (0,9 \times 0,9 \times 0,1) =$$


$$= \underline{0,648 \text{ m}^3}$$

ZA 04/2013 FAKTUROVÁNO 0,292 m³

Objekt	SO 1.60- ĆS KAW
Položka č.	1.60- 62103- Sokl
$9,7 + 5,9 + 9,7 + 5,9 = \underline{\underline{31,2m}}$	

Objekt	80 100
Položka č.	00.14
$2.000 \cdot 0,001 = 2$ $100 \cdot 0,001 = 0,1$ $- 100 \cdot 0,001 = -0,1$ $+ 2$ $= 1,9$ $- 0,1 = 1,8$ $+ 0,1 = 1,9$ $= 1,9$	

Objekt	SO 160 - ČS KALW
Položka č.	160 - 78401 - MALBY VNITŘNÍ
$2,625 \times (2 \times 4,2 + 2 \times 5,15) + (4,2 \times 5,15) = 49,0675 + 21,63 = \underline{70,72m^2}$	

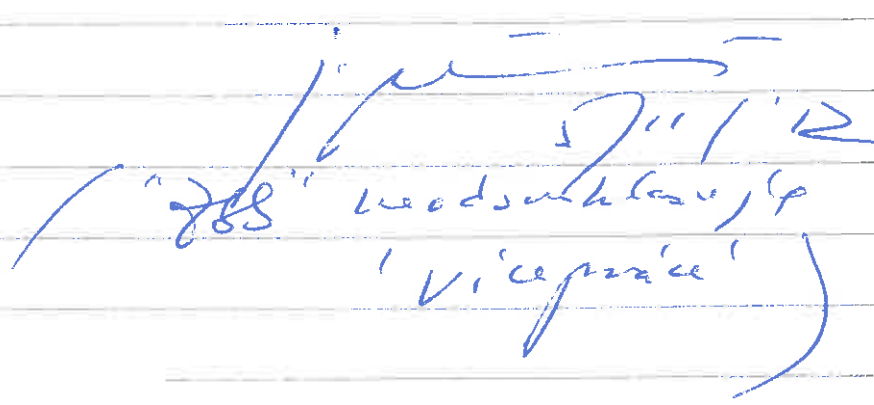Objekt	SO 1.60 ČERPAČÍ STANICE UR. A PŘ. #ALU
Položka č.	1.60 - 96 104
$3,14 \times 0,4 \times 0,4 \times 0,3 \times 6 = 0,9 \text{ m}^3$	
$0,8 \times 2 \times 0,3 \times 2 = 0,96 \text{ m}^3$	
$(0,65 \times 1,05 \times 0,15) \times 3 + (0,4 \times 0,4 \times 0,15) + (1,37 \times 1 \times 0,15) = 0,58 \text{ m}^3$	
CELKOVÉ MNOŽSTVÍ PROVEDENÍ ZA 10/2012 <u>2,89 m³</u>	
	

Deník víceprací a méněprací

Stavba : Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV
Ucelená část 1B Čistírna odpadních vod

1) Objednatel:

jméno: TEPVOS, spol s r.o.
 adresa: Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí
 IČ: 25945793
 DIČ: CZ 25945793
 kontakt: Ing. Václav Knejp - 774 673 364
 e-mail: knejp@tepvos.cz
 zastoupená: Ing. Václavem Knejpem – jednatelem společnosti

2) Projektant:

jméno: Aqua Procon s.r.o.
 adresa: Palackého tř. 12, 612 00 Brno
 IČ:
 DIČ:
 kontakt: Ing. Daniel Kozický; Ing. Michal Ašer
 e-mail:

3) Zhotovitel:

jméno: Sdružení pro stavbu Ústí nad Orlicí
 adresa: SMP CZ a.s., VCES a.s., Hochtief CZ a.s., A.B.V. s.r.o.
 IČ: Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6
 DIČ: 271 951 47
 kontakt: CZ 271 951 47
 e-mail: p. Hána – Tel. 725 594 392
 zastoupená: hana@smp.cz
 Ing. Martin Doksanský, p. Bronislav Hána

4) Správce stavby:

jméno: d Plus projektová a inženýrská a.s.
 adresa: Sokolovská 16/45, 186 00 Praha
 kontakt: Ing. Ševčík – 723 780 763
 e-mail:
 zastoupená: Ing. Bohumil Ševčík

Zápis č. 1 – SO 1.69 – provozní budova

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Na základě skutečné skladby střešní konstrukce provozní budovy ČOV Ústí nad Orlicí, která nekoresponduje s původními podklady objednatele a tudíž i s projektovou dokumentací, je nezbytné provést nový návrh řešení střešní konstrukce.

Zhotovitel předloží revizi RPD a změnový list.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 2 – SO 1.69 – provozní budova

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Při bourání stávající dlažby bylo zjištěno, že lokální degradace podkladních vrstev je natolik rozsáhlá, že není možné jejich využití. Na některých místech naopak bylo spojení celé konstrukce takové, že nebylo možné jejich oddělení bez porušení stávající hydroizolace. Proto je nutné provést novou skladbu podlahy vč. hydroizolační vrstvy.

Současně s provedením podlahy bylo nezbytné provedení úpravy prahové části vrat vč. nájezdu.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 3 – SO 1.52 – česlovna

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Při bourání stávající dlažby bylo zjištěno, že lokální degradace podkladních vrstev je natolik rozsáhlá, že není možné jejich využití. Na některých místech naopak bylo spojení celé konstrukce takové, že nebylo možné jejich oddělení bez porušení stávající hydroizolace. Proto je nutné provést novou skladbu podlahy vč. hydroizolační vrstvy.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 4 – SO 1.50, 1.52, 1.57, 1.60, 1.63, 1.69 – stavební elektro I. část

Datum : 18/09/2012

Na žádost : zhotovitele

Na základě zjištění pokročilé degradace stávajícího elektro vybavení různých SO, které mělo být dle PD ponecháno a pouze doplněno, bylo rozhodnuto, že musí být realizováno vystrojení zcela nové. Jeho zachování nebylo možné.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 5 – Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu

Na žádost : zhotovitele

Datum : 18/09/2012

Po obnovení stávajícího potrubí bylo zjištěno, není možné provést napojení tak jak předpokládal projekt a bylo nutné využít jiného typu litinového potrubí.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 6 – SO 1.52 – Česlovna

Na žádost : Objednatel

Datum : 18/09/2012

Na základě rozhodnutí objednatele byla provedena úprava ostění u vrat do česlovny. Zhotovitel předložil ZL kategorie 3 (Neuznatelný náklad)

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 7 – SO 1-50 – vstupní čerpací stanice

Na žádost : zhotovitele

Datum : 07/03/2013

Provedení nové omítky na ČS město nebylo možné ponechání původní omítky a pouze její doplnění, protože to její stav neumožňoval – budova by byla strukturně nesjednotitelná.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 8 – SO 1.64, 1.67, 1.55 – stavební elektro II. část

Na žádost : zhotovitele

Datum : 07/03/2013

Na základě zjištění pokročilé degradace stávajícího elektro vybavení různých SO, které mělo být dle PD ponecháno a pouze doplněno, bylo rozhodnuto, že musí být realizováno vystrojení zcela nové. Jeho zachování nebylo možné.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 8 – SO 1-57 – Dmýchárna

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Při bourání stávající dlažby bylo zjištěno, že lokální degradace podkladních vrstev je natolik rozsáhlá, že není možné jejich využití. Na některých místech naopak bylo spojení celé konstrukce takové, že nebylo možné jejich oddělení bez porušení stávající hydroizolace. Provedení hydroizolace a podkladního betonu.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 9 – SO 1.64 – Budova kalového hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Přesun dveří rozvodny odvodnění kalu na vnější stěnu. Viz zápis s Tepvosem 17.4.2013.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 10 – SO 1-50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Provedení nových poklopů nad mokrou jímku ČS město. Stávající poklopy vykazovaly značnou degradaci.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 11 – SO 1.65 – Vyhňivací a uskladňovací nádrže

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Vzhledem k pokročilému stádiu degradace stávajícího koridoru k VN bylo nutno provést jeho opravu. Hrozilo zatékání do strojovny.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 12 – SO 1.65 – Vyhňivací a uskladňovací nádrže

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Po odkrytí stávajícího opláštění bylo zjištěno, že není možné užít stávajícího uchycení pro opláštění, proto bylo nutné provést novou nosnou konstrukci pro opláštění.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 13 – SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Doplnění stavebního elektra na ČS Město, které bylo v havarijním stavu a s jehož výměnou nebylo v rámci projektu počítáno (mělo být zachováno).

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 14 – SO 1.64 – Budova kalového hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele a objednatele

Na základě vyšší degradace obkladů stěn bylo nezbytné provést v místnostech 1.15 a části 1.12 obklad nad rámec předpokladu projektu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 15 – SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Provedení žebříku, který chyběl ve výkazu výměr (ale byl uveden na výkresech).

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 16 SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele a objednatele

S ohledem na pokročilou degradaci stávajícího stavu rampy na ČS město, která nebyla projektem řešena bylo rozhodnuto objednatelem o její rekonstrukci.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 17 – SO 1.66 – objekt BRO

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Změny ve stavební části vyplývající ze změny využití objektu BRO na garáže.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 18 – SO 1.65 – vyhnívací a uskladňovací nádrže

Datum : 07/03/2013

Na žádost : zhotovitele

Na základě změny platné legislativy řešící konstrukční navržení hromosvodů, bylo nutné přepracovat koncepci ochrany VN a UN.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 19 – SO 1.69 - provozní budova

Datum : 07/03/2013

Na žádost : Objednatele

Na přání objednatele provedení čistící rohože před provozní budovou. Zhotovitel předloží ZI kategorie 3 (neuznatelný náklad)

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 20 – SO 1.81 – Dmýchárna

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu, bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav, neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 21 – SO 1.50 – vstupní čerpací stanice

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatele.

Realizace zabezpečovacího zařízení na ČS Město. Dle specifikace objednatele. Zhotovitel předloží ZI kategorie 3 (Neuznatelné náklady).

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 22 – SO 1.76 – Oplocení

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatele

Doplnění vstupní branky pro pěší, která nebyla projektem řešena. Dle specifikace objednatele. Zhotovitel předloží ZI kategorie 3 (Neuznatelné náklady).

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 23 – SO 1.57 – Dmychárna

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávajícího stavu dvou ramp a částí dveří u dmychárny, které nebyla projektem dotčeny bylo rozhodnuto objednatelem o jejich rekonstrukci.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 24 – SO 1.60 – Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu, bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav, neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 25 – SO 1.64 – Budova kalového hospodářství

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav, neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 26 – SO 1.63 – zahuštění kalů

Datum : 07/03/2013

Na přání : zhotovitele

S ohledem na pokročilou degradaci stávající střechy na objektu bylo rozhodnuto o provedení nové střechy, jelikož havarijní stav neumožňoval provedení prací uvnitř bez toho, aby hrozilo jejich budoucí znehodnocení.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 27 – SO 1.72 – Propojovací potrubí a žlaby

Datum : 07/03/2013

Na přání : Objednatel

Jedná se o výměnu zkorodovaného a nevyhovujícího zakrytí jímky na nátoky na ČOV vyplývající z požadavku pracovníce OIP a objednatele.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Datum : 07/03/2013

Zápis č. 28 – PS 04 – kalové hospodářství

Na přání : Objednatele

Na žádost objednatele došlo k nacenění doplnění šoupat před 4ks čerpadel recirkulace VN.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlíč

Datum : 07/03/2013

Zápis č. 29 – PS 04 – kalové hospodářství

Na přání : Objednatele

Na základě rozhodnutí objednatele nebude realizováno technologické vybavení plánované pro linku BRO.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 30 – SO 1.70 – Demolice

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Při realizaci demoličních prací v rámci objektu So 1.70 bylo zjištěno, že zakryté podkladní konstrukce nádrží a jímek byly dle skutečnosti ve větších mocnostech, než bylo zakresleno v dokumentaci skutečného provedení původní stavby. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 31 – PS 04 – doplnění zpětné klapky

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Z důvodu zvýšení ochrany výměníku tepla voda – kal bylo navrženo doplnění zpětné klapky DN 150 na potrubní větev 4.64 (výtlačné potrubí ohřevu a přečerpávání kalu), která zajistí oddělení výtlačku čerpadel 4.05 osazených v zahuštění kalu od výměníku. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 32 – SO 1.72 – propojení gravitačního zahuštění a odvodnění

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatele o zachování stávající nádrže zahuštění kalu je nutně provést napojení odtahu kalu z této nádrže do nově budovaného potrubí K9 (odtah kalu na odvodnění). Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 33 – SO 1.63 – nový žlab stávajícího zahuštění kalu

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Po otryskání konstrukce stávajícího žlabu bylo zjištěno, že míra degradace neumožňuje jeho opětovné využití. Objednatel rozhodl o výměně stávajícího žlabu za nový. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 34 – SO 1.64 – změna vytápění

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Při tvorbě zadávací dokumentace stavby nebylo možno specifikovat konkrétní typy jednotlivých strojních zařízení, ale pouze parametry, které jimi musí být splněny. Po konkretizaci jednotlivých zařízení v rámci realizačního stupně projektové dokumentace bylo nutno přistoupit k dílčím úpravám řešení části vytápění. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 35 – SO 1.57 – nový hromosvod dmychárny

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Z důvodu kompletně nově zrealizované střechy na objektu (viz zápis č. 20), bylo nutno přistoupit též k realizaci nového hromosvodu. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 36 – SO 1.64 – nový hromosvod kalového hospodářství

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Z důvodu kompletně nově zrealizované střechy na objektu (viz zápis č. 25), bylo nutno přistoupit též k realizaci nového hromosvodu. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 37 – PS 05 – Nerealizace linky BRO

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatele nerealizovat linku BRO, došlo ke změně užívání stávajícího objektu. Zhotovitel předloží revizi PD a návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 38 – PS 05 – Oprava plynojemu

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

V době realizace zadávací dokumentace stavby byl plynojem v plném provozu, a proto nemohlo dojít k prohlídce všech jeho součástí. Po odstavení stávajícího plynojemu bylo zjištěno, že dochází k zasekávání plovoucího stropu v krajních polohách, způsobené špatnou funkcí teleskopu. Pro bezvadnou funkci plynojemu je nutné provést opravu teleskopu. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 39 – SO 1.55 – Stavební změny na objektu regenerace

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Po vyčištění stávající nádrže bylo zjištěno, že má tato nádrže rozdílné řešení systému zábrany proti vyplavání nádrže. Místo pouhého využití studen kolem nádrže, je nádrž vybavena vztlakovými ventily

umožňujícími pronikání vody spodní vody do nádrže v době jejího odstavení z provozu. Tyto skutečnosti nebyly dostatečně zachyceny v dokumentaci skutečného provedení původní stavby a z důvodu plného provozu v době tvorby zadávací dokumentace nebylo možno zjistit skutečný stav ani při prohlídkách stavby. Na základě těchto zjištěných informací je nutno navrhnout i pozměněné řešení stavební části objektu – utěsnění prostupů, jímací studny, řešení dilatací, celoplošná hydroizolace, zatěsnění a čerpaní vody. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 40 – SO 1.64 – Úprava vnitřních prostor objektu

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Na základě ohledání aktuálního stavu před započítím realizace dílčích prací bylo zjištěno že:

- Degradace částí stávajících obkladů, které měly být v rámci projektu zachovány, dostoupila takové míry, kdy není efektivní jejich zachování a doplňování. Proto bylo rozhodnuto o jejich odstranění a nahrazení novými obklady a výmalbami.
- Při tvorbě zadávací dokumentace stavby nebylo možno specifikovat konkrétní typy jednotlivých strojních zařízení, ale pouze parametry, které jimi musí být splněny. Po konkretizaci jednotlivých zařízení v rámci realizačního stupně projektové dokumentace bylo nutno přistoupit k dílčím úpravám rozměrových parametrů betonových fundamentů, na kterých jsou zařízení uložena a tras potrubí

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 41 – SO 1.72 – Změna trasy potrubí O6

Datum: 03/03/2014

Z požadavku: Objednatel

Při výkopových pracích bylo zjištěno, že sklolaminátové potrubí odtoku vyčištěné vody z dosazovací nádrže O6 není možno položit v zamýšlené trase z důvodu výškové kolize se stávajícím potrubím z ČS kalu a shlukem kabelových vedení jdoucím kolem tohoto potrubí. Poloha těchto stávajících konstrukcí nekorespondovala s údaji uvedenými v dokumentaci skutečného provedení původní stavby. Bylo rozhodnuto o změně části trasy potrubí O6, které bylo prodlouženo a doplněno o dvě kolena 90°. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 42 – SO 1.72 – Úprava měrného žlabu

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatel došlo k úpravě měrného žlabu. Bylo rozhodnuto, že nedojde k vybourání stávajícího venturiho žlabu, vnitřní prostor bude sanován dle DPS a objednatel si zajistí zakrytí. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 43 – SO 1.65 – Úpravy soklu uskladňovací nádrže

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Na základě rozhodnutí objednatel došlo k doplnění soklu kolem uskladňovací nádrže, tak aby byla jeho úprava identická s vyhnívacími nádržemi. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 44 – SO 1.50 – Úpravy kolem trafostanice

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: ČEZ

Na základě zjištění aktuálního technického stavu elektroinstalace a požadavku ČEZ, bylo rozhodnuto o provedení následujících úprav v rozvodně VN a na ČS město:

- Doplnění oplocení, branky a el. zámku (z požadavku ČEZ bylo nutné zajistit přístup k měření na ČS město).
- Přemístění měření (požadavkem ČEZ, který definuje podmínky připojení, na základě těchto požadavků bylo nutné zajistit).
- Odpojovač trafa (v revizní zprávě provozovatele bylo zjištěno, že stavující odpojovače trafa se při porušení VN pojistky neodpojí a tím může dojít k poškození transformátoru a třífázových točivých strojů, bylo rozhodnuto o výměně).

Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 45 – SO 1.57 – Doplnění elektro dmychárny a trafostanice

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Na základě zjištění pokročilé degradace stávajícího elektro vybavení, které neumožňovalo splnění původní idey ZDS počítající s jejím ponecháním a doplněním, bylo rozhodnuto, že musí být realizováno vystrojení zcela nové. Jeho zachování nebylo možné. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 47 – SO 1.54 – úprava dna

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Po odstavení z provozu, vypuštění, vyčištění a místním ohledání stávajících nádrží dešťových zdrží bylo zjištěno, že spádové betony den jsou značně zdegradované. Na základě těchto informací bylo rozhodnuto o odbourání spádového betonu a technickém řešení nového provedení. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 48 – SO 1.59 – úprava dna

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Po odstavení z provozu, vypuštění, vyčištění a místním ohledání stávajících dosazovacích nádrží II° bylo zjištěno, že spádové betony den jsou značně zdegradované. Na základě těchto informací bylo rozhodnuto o odbourání spádového betonu a technickém řešení nového provedení. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 49 – SO 1.60 – Nový hromosvod ČS Kaju

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Z důvodu rozhodnutí o nutnosti realizace kompletně nové střechy na objektu, bylo nutno přistoupit též k realizaci nového hromosvodu, protože původní musel být před prováděním prací zcela zdemontován. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlič

Zápis č. 50 – PS 07 – SŘTP PS 05

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Na základě rozhodnutí objednatele nerealizovat linku BRO, došlo k úpravě rozsahu na stávajícím objektu. Zhotovitel předloží revizi PD a návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 51 – SO 1.73 – Komunikace

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

V rámci nutných zásahů do konstrukce stávající komunikace na ČOV bylo zjištěno, že je betonová vrstva v některých místech značně degradovaná a vykazuje též odchylky od požadované mocnosti. Proto bylo rozhodnuto kompletní renovaci některých nejvíce postižených úseků.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 52 – SO 1.50 – Úprava konceptu řešení OK

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Během výkopových prací pro novou OK a provizorní žlab bylo zjištěno, že se v tomto prostoru vyskytují zbytky larsenové stěny, znemožňující provedení některých konstrukcí dle původních předpokladů projektu. Na základě toho zjištění je nutno aby došlo ke kompletní úpravě konceptu řešení výstavby na odlehčovací komoře. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 53 – SO 1.57 – Výměna ocelových vrat

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Na základě pokročilého stupně degradace a oslabení konstrukce vrat na objektu dmychárny bylo rozhodnuto o jejich kompletní výměně. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :
p. Knejp

Za správce stavby :
p. Ševčík

Za zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 54 – SO 1.57 – Výměna odpojovačů

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

V průběhu odstávky vysokého napětí na ČOV došlo k zjištění aktuálního technického stavu elektroinstalace v trafostanici VN bylo rozhodnuto o nutnosti provedení výměny odpojovačů traf, aby nemohlo nastat porušení transformátoru a třífázových točivých strojů. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 55 – SO 1.50 – Napájecí kabel

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: ČEZ/Objednatel

Trafo (400 VA) má dva vývodní kabely, které byly dimenzovány na S77A. Po proměření stavu kabelů revizním technikem bylo zjištěno, že jeden kabel od každého trafua má sníženou izolační schopnost. Bylo rozhodnuto objednatel o výměně napájecích kabelu. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 56 – SO 1.55 – Prodloužení studny

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Po vyčištění stávající nádrže bylo zjištěno, že má tato nádrž rozdílné řešení systému zábrany proti vyplavání nádrže. Místo pouhého využití studen kolem nádrže, je nádrž vybavena vztlakovými ventily umožňujícími pronikání vody spodní vody do nádrže v době jejího odstavení z provozu. Tyto skutečnosti nebyly dostatečně zachyceny v dokumentaci skutečného provedení původní stavby a z důvodu plného provozu v době tvorby zadávací dokumentace nebylo možno zjistit skutečný stav ani při prohlídkách stavby. Na základě těchto zjištěných informací je nutno navrhnout i pozměněné řešení stavební části objektu – utěsnění prostupů, jímací studny, řešení dilatací, celoplošná hydroizolace, zatěsnění a čerpaní vody. Zhotovitel předloží návrh řešení a změnového listu.

Za objednatele :
p. KnejpZa správce stavby :
p. ŠevčíkZa zhotovitele :
p. Pavlíč

Zápis č. 57 – SO 1.51 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

**Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.**

**Za objednatele :
p. Knejp**

**Za správce stavby :
p. Ševčík**

**Za zhotovitele :
p. Pavlič**

Zápis č. 58 – SO 1.52 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

**Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.**

**Za objednatele :
p. Knejp**

**Za správce stavby :
p. Ševčík**

**Za zhotovitele :
p. Pavlič**

Zápis č. 59 – SO 1.53 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

**Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.**

**Za objednatele :
p. Knejp**

**Za správce stavby :
p. Ševčík**

**Za zhotovitele :
p. Pavlič**

Zápis č. 60 – SO 1.54 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

**Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.**

**Za objednatele :
p. Knejp**

**Za správce stavby :
p. Ševčík**

**Za zhotovitele :
p. Pavlič**

Zápis č. 61 – SO 1.55 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlíč



Zápis č. 62 – SO 1.56 – Celková bilance


Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlíč



Zápis č. 63 – SO 1.57 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlíč



Zápis č. 64 – SO 1.58 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlíč



Zápis č. 65 – SO 1.59 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 66 – SO 1.60 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 67 – SO 1.61 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 68 – SO 1.62 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 69 – SO 1.63 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 70 – SO 1.64 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 71 – SO 1.65 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 72 – SO 1.66 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 73 – SO 1.67 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 74 – SO 1.68 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 75 – SO 1.69 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 76 – SO 1.70 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 77 – SO 1.71 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 78 – SO 1.72 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 79 – SO 1.73 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 80 – SO 1.74 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 81 – SO 1.76 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 82 – SO 1.77 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 83 – PS 01 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 84 – PS 02 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatel

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlíč

Zápis č. 85 – PS 03 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 86 – PS 04 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 87 – PS 05 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 88 – PS 06 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp

Za správce stavby :

p. Ševčík

Za zhotovitele :

p. Pavlič

Zápis č. 89 – PS 07 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 90 – PS 08 – Celková bilance

Datum: 24/04/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.
Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlič



Zápis č. 91 – 1.55 – Lávky

Datum: 27/05/2014

Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší doplnění zámečnických konstrukcí na regeneraci kalu. Na základě požadavků bezpečnostního technika z fyzické prohlídky stavby bylo rozhodnuto o nutnosti doplnění lávek v místech míchadel na regenerační nádrži. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlíč

V. J. KUBELA



Zápis č. 92 – SO 1.50 – Celková bilance

Datum: 30/05/2014


Z požadavku: Objednatele

Uvedena změna řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.

Zhotovitel předloží návrh změnového listu.


Za objednatele :

p. Knejp



Za správce stavby :

p. Ševčík



Za zhotovitele :

p. Pavlíč



Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		č.	
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY		ZL č.1B-79	
Komu: TEPVOS, spol. s r.o.		Datum:	
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.60 - Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:			
Důvod změny: Rozdíl mezi ZDS a RDS			
Popis změny:			
Uvedený změnový list řeší dorovnání jednotlivých položek výkazu výměr dle skutečně provedených prací.			
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny:			
Vícepráce 13 012,42 Kč			
Méněpráce -5 133,68 Kč			
Celkem 7 878,74 Kč			
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
<i>Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.</i>			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí <i>„Sdružení Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“</i> 28 07 2014 Datum:		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí <i>PROJEKT AQUA</i> 28 07 2014 Datum:	
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí 28 07 2014 Datum:		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí 28 07 2014 Datum:	

878,74 Kč

Rekapitulace				
--------------	--	--	--	--

Název SO	Popis kalkulace	Měněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.60 - Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu	Celková bilance	-5 133,68 Kč	13 012,42 Kč	7 878,74 Kč
CELKEM		-5 133,68 Kč	13 012,42 Kč	7 878,74 Kč

Kód položky	Objekt	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
1.60 - D6	SO 1.60	odpojení a demontáž rušených kabelů	sada	1,000	398,10	398,10
1.60 - D7	SO 1.60	demontáž rušených kabelových tras	sada	1,000	1 592,30	1 592,30
1.60 - D8	SO 1.60	demontáž rušených pomocných konstrukcí	sada	1,000	1 592,30	1 592,30
1.60 - D9	SO 1.60	provizorní přepojování v nutném rozsahu	sada	1,000	796,10	796,10
1.60 - D10	SO 1.60	provizorní odpojení po přechodnou dobu montáže	sada	1,000	318,50	318,50
1.60 - D11	SO 1.60	opětovné napojení po přechodnou dobu montáže	sada	1,000	318,50	318,50
1.60 - D12	SO 1.60	provizorní rozváděče a skříně pro provizorní zapojení	sada	1,000	3 980,70	3 980,70
1.60 - D13	SO 1.60	kabely pro provizorní přepojování (vhodných parametrů)	sada	1,000	2 388,40	2 388,40
	SO 1.60	Zemní a stavební práce				17 170,10
1.60 - S1	SO 1.60	veškeré související prostupy a stavební práce, které neohroží statiku objektů (průrazy a vrtání stěn, stropů a podlah apod.)	sada	1,000	6 899,90	6 899,90
1.60 - S2	SO 1.60	výkopy pro kabely a zemnicí pásy vc. zamíření, betonování, kabeľoveno-pískového lože, zákrytu kabelů deskami, výstražné folie, chrániček, záhozu, zbytečné odvozby a ukládání zbytečné zeminu	sada	1,000	5 042,20	5 042,20
1.60 - S3	SO 1.60	řezání asfaltových a betonových vozovek a zpevněných ploch pro výkopy	sada	1,000	1 937,30	1 937,30
1.60 - S4	SO 1.60	provizorní úprava povrchu po výkopech	sada	1,000	835,90	835,90
1.60 - S5	SO 1.60	zачištění upravovaných povrchů v dotčených objektech, příslušné nátěry konstrukcí a stěn a úklid	sada	1,000	2 454,80	2 454,80
